

Hochwasserschutz Buholzbach

Auflageprojekt

Bauphasenplan

Situation 1:1'000 / 1:3'000

Auftraggeber:

Bauherrschaft:

Landwirtschafts- und
Umweltdirektion Kanton Nidwalden
Amt für Wald und Naturgefahren
Stansstadterstrasse 59
Postfach 1251
6371 Stans

Projektleiter Bauherr:



KISSLING + ZBINDEN AG
INGENIEURE PLANER USC

Tempelstr. 8A Fon 033 334 20 50
3608 Thun
www.kzag.ch martin.andres@kzag.ch

Stv. Projektleiter Bauherr:

INDERGAND AG

Bauherrenunterstützung
Raumplanung - Planungs-/Baurecht

Chälengasse 26 Fon 079 257 03 39
6053 Alpnachstad
u.indergand@indergand-ag.ch

Projektbearbeitung:

Bauingenieur:



Müliweg 2 Fon 041 632 66 22
6052 Hergiswil Fax 041 632 66 29
www.schubiger-nw.ch info@schubiger-nw.ch

Hydraulik / Geschiebe:

beffa tognacca gmbh


A San Rocch Fon 091 863 44 41
6702 Claro
www.fluvial.ch ctognacca@fluvial.ch

Umwelt:



Heubachstr. 61 Fon 076 334 39 45
8810 Horgen
www.tensor.ch

Datum:	erst.	Gepr.	Anlage Nummer	Format:
01.09.2023	ank	dr	1.17	210 / 297
a 12.12.2023	rbg	dr		2287 - 407 b
b 12.04.2024	rbg	dr		

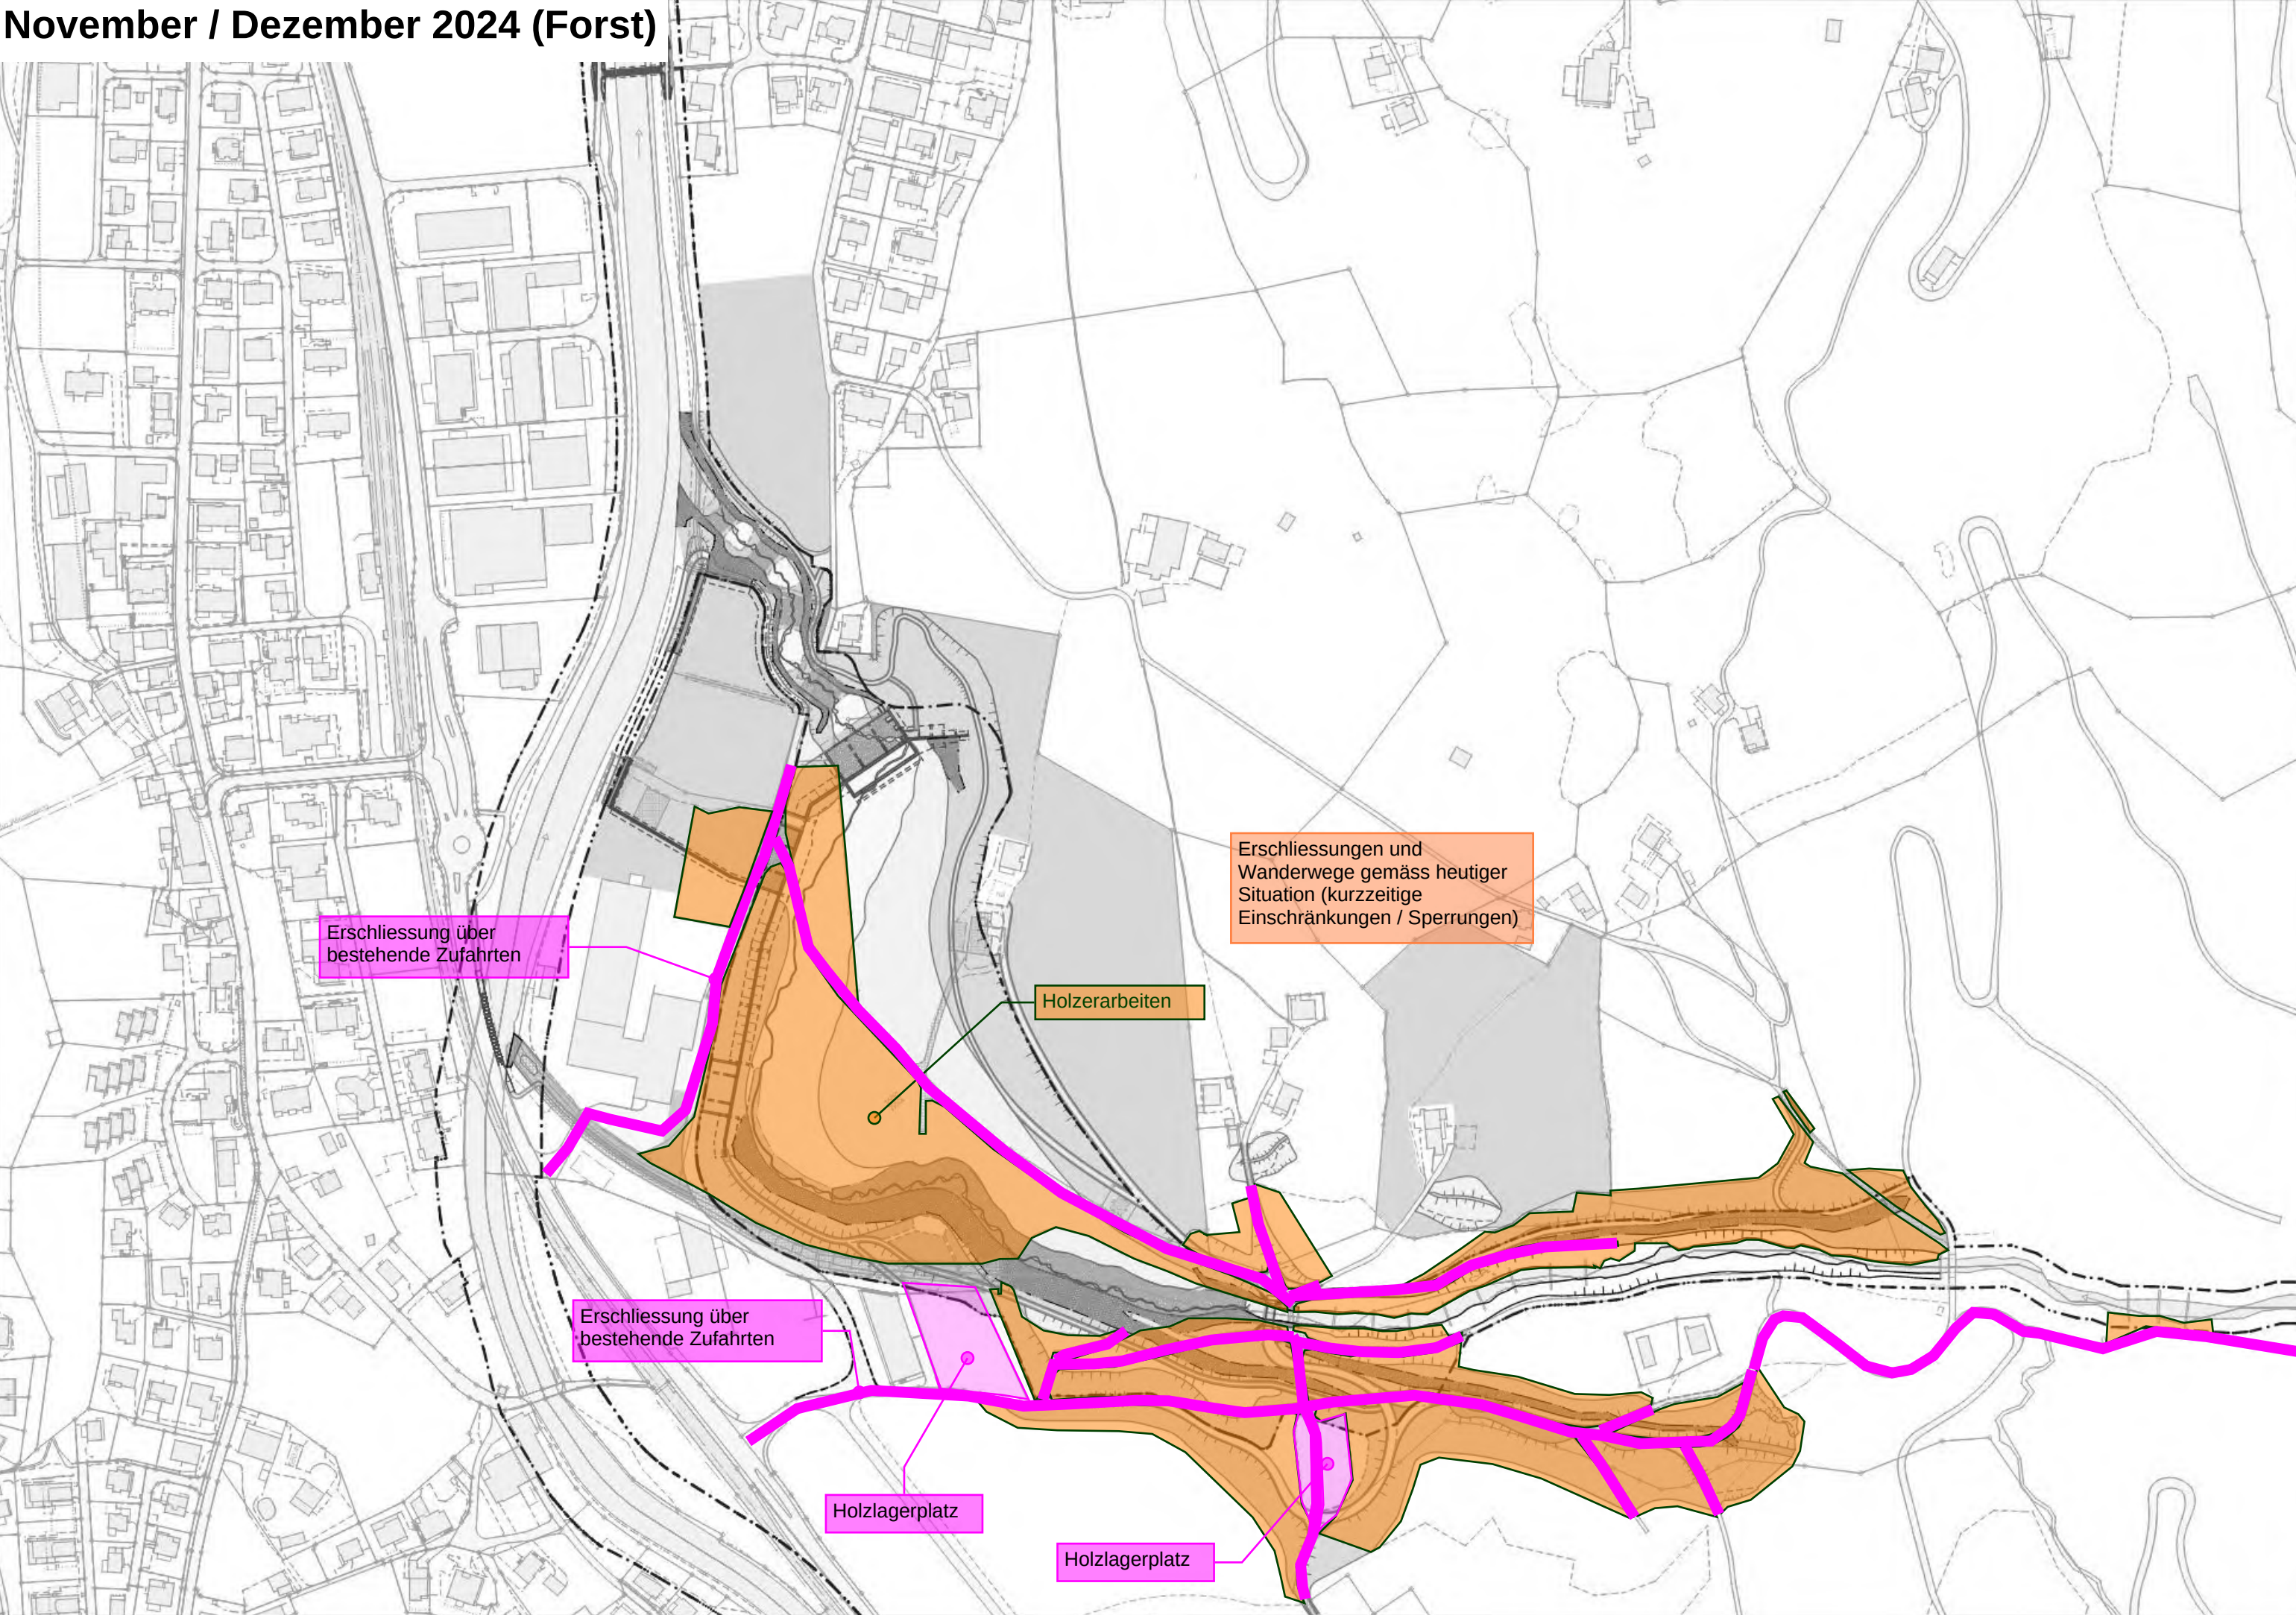

Januar 2025 (Baumeister & Unternehmer Bürersteg)

Installationsplatz erstellen


Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

Temporäre Sperrung vom
Wander- und Fussweg


Erschliessungen und Wanderwege
gemäss heutiger Situation

Waldboden abtragen;
provisorische Baupiste für
Holzabtransport erstellen

Installationsplatz erstellen

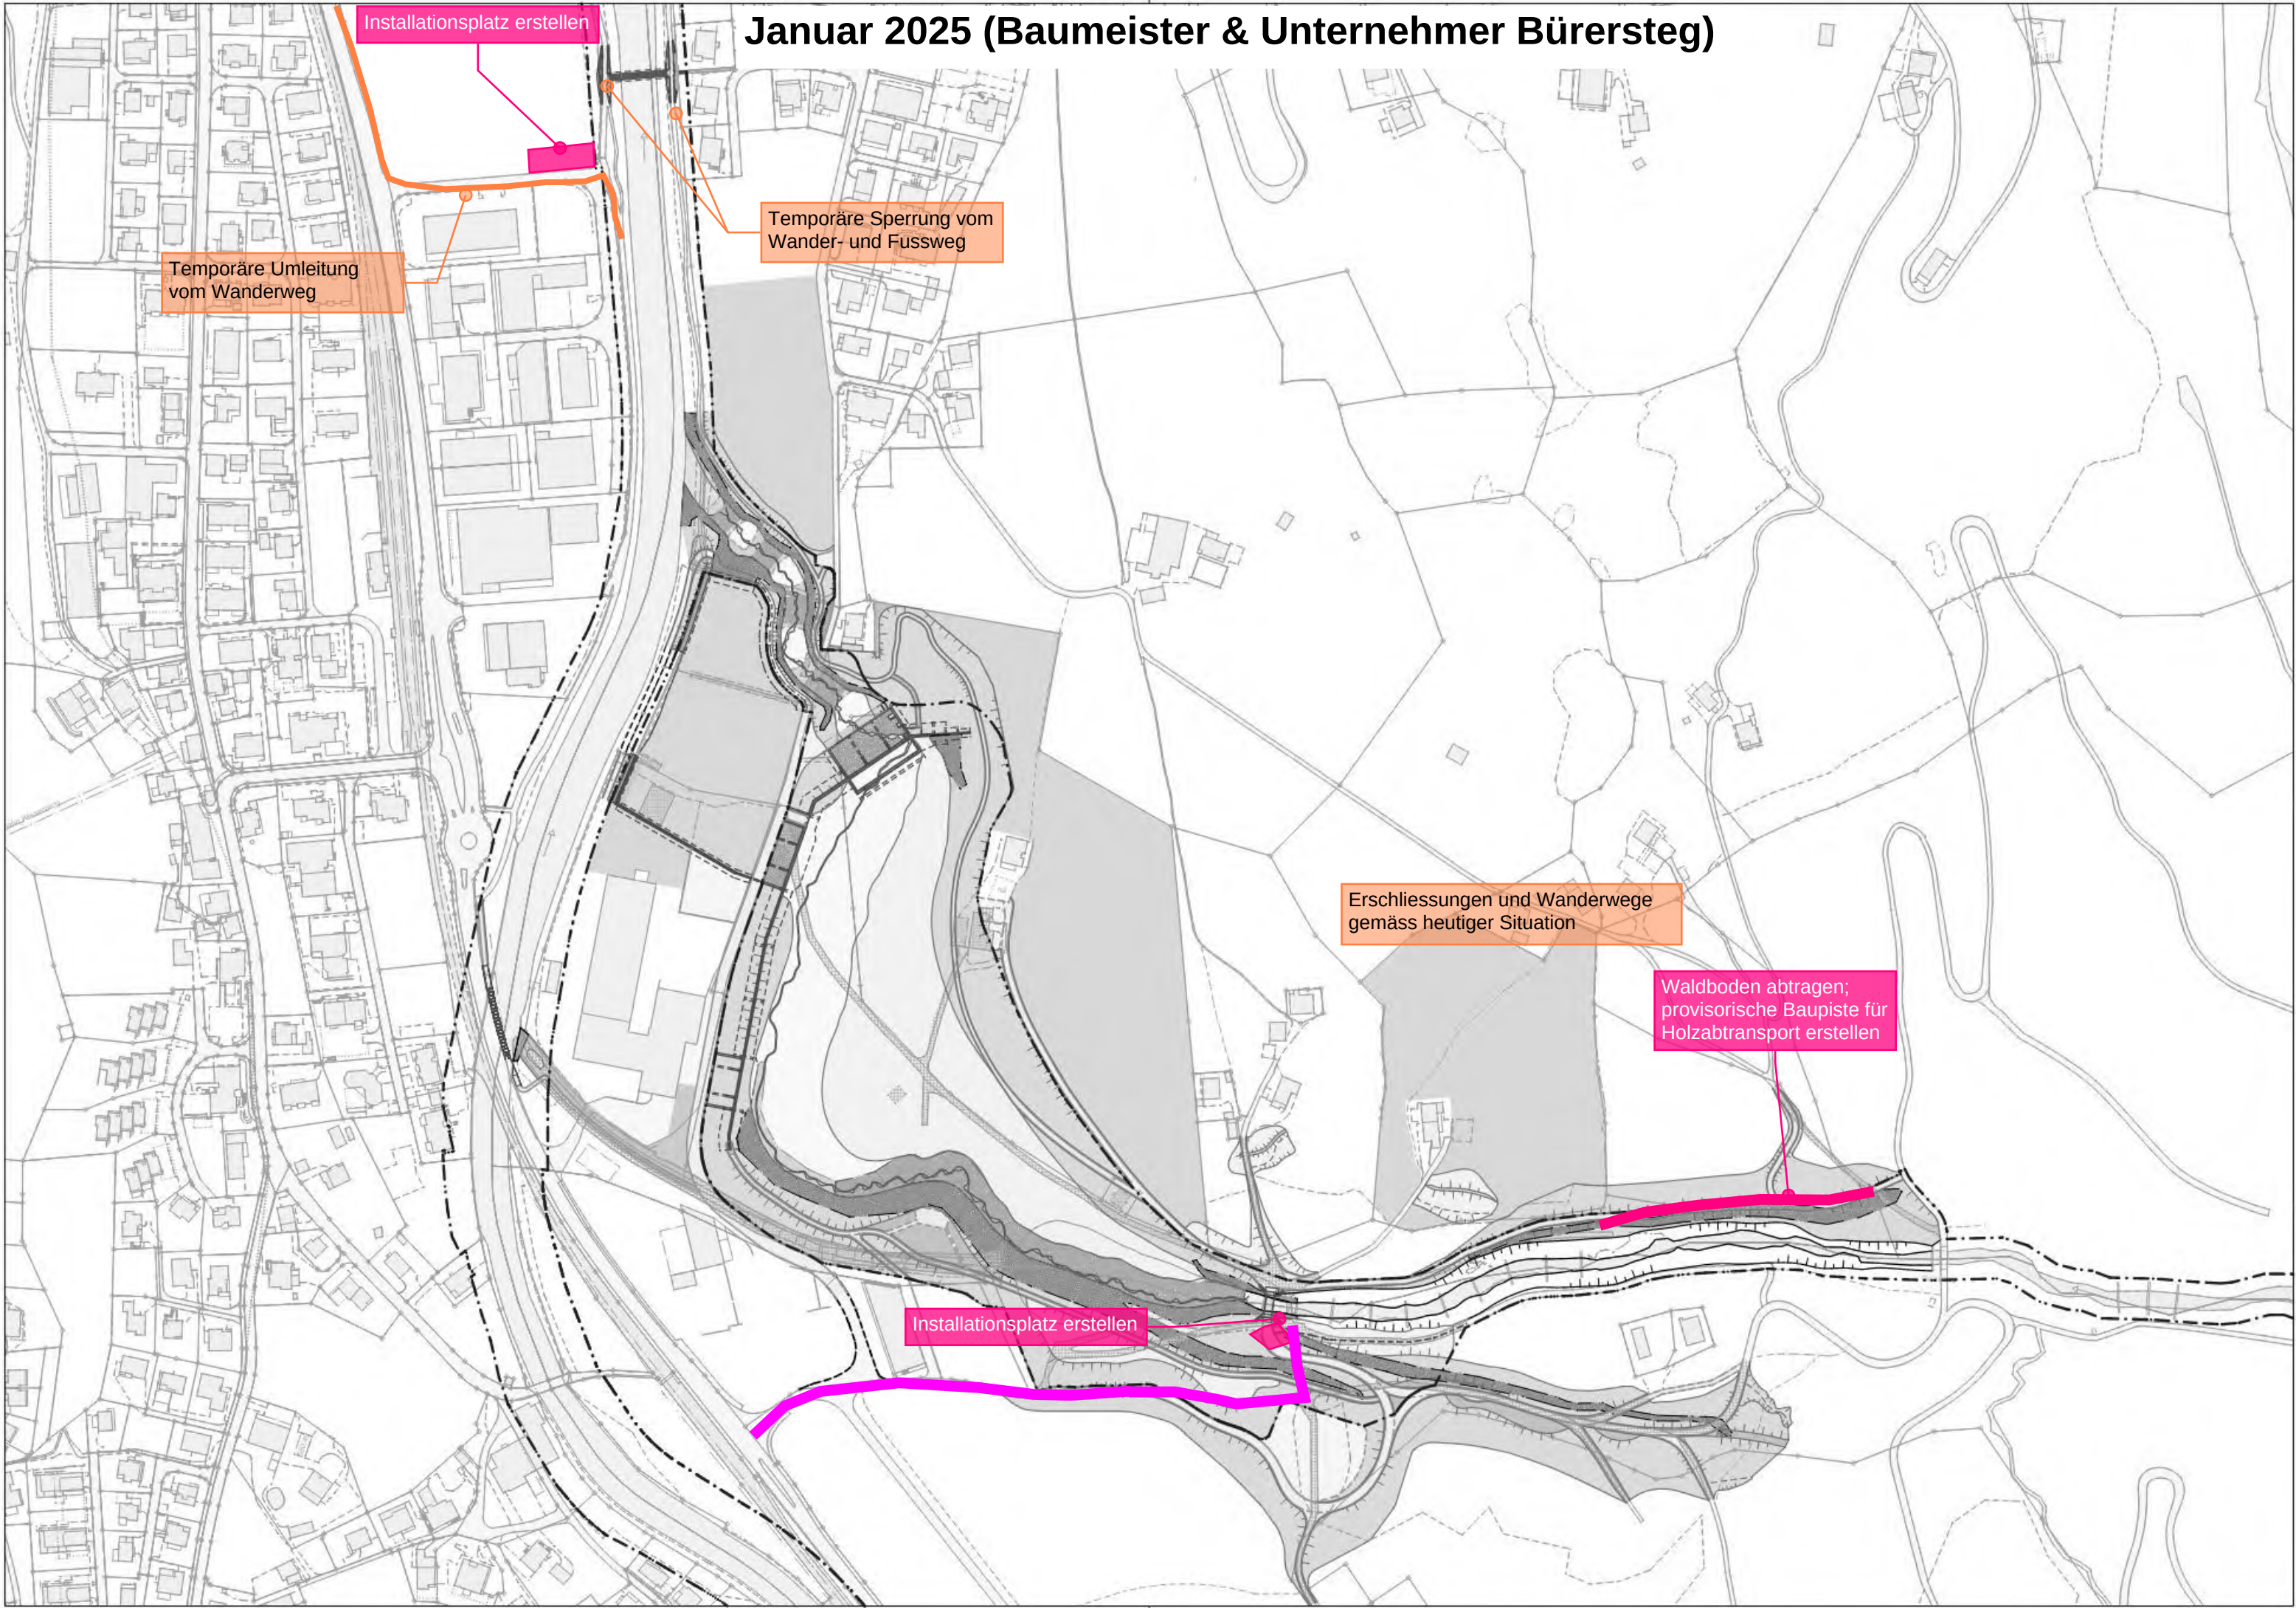

Januar / Februar 2025 (Forst)

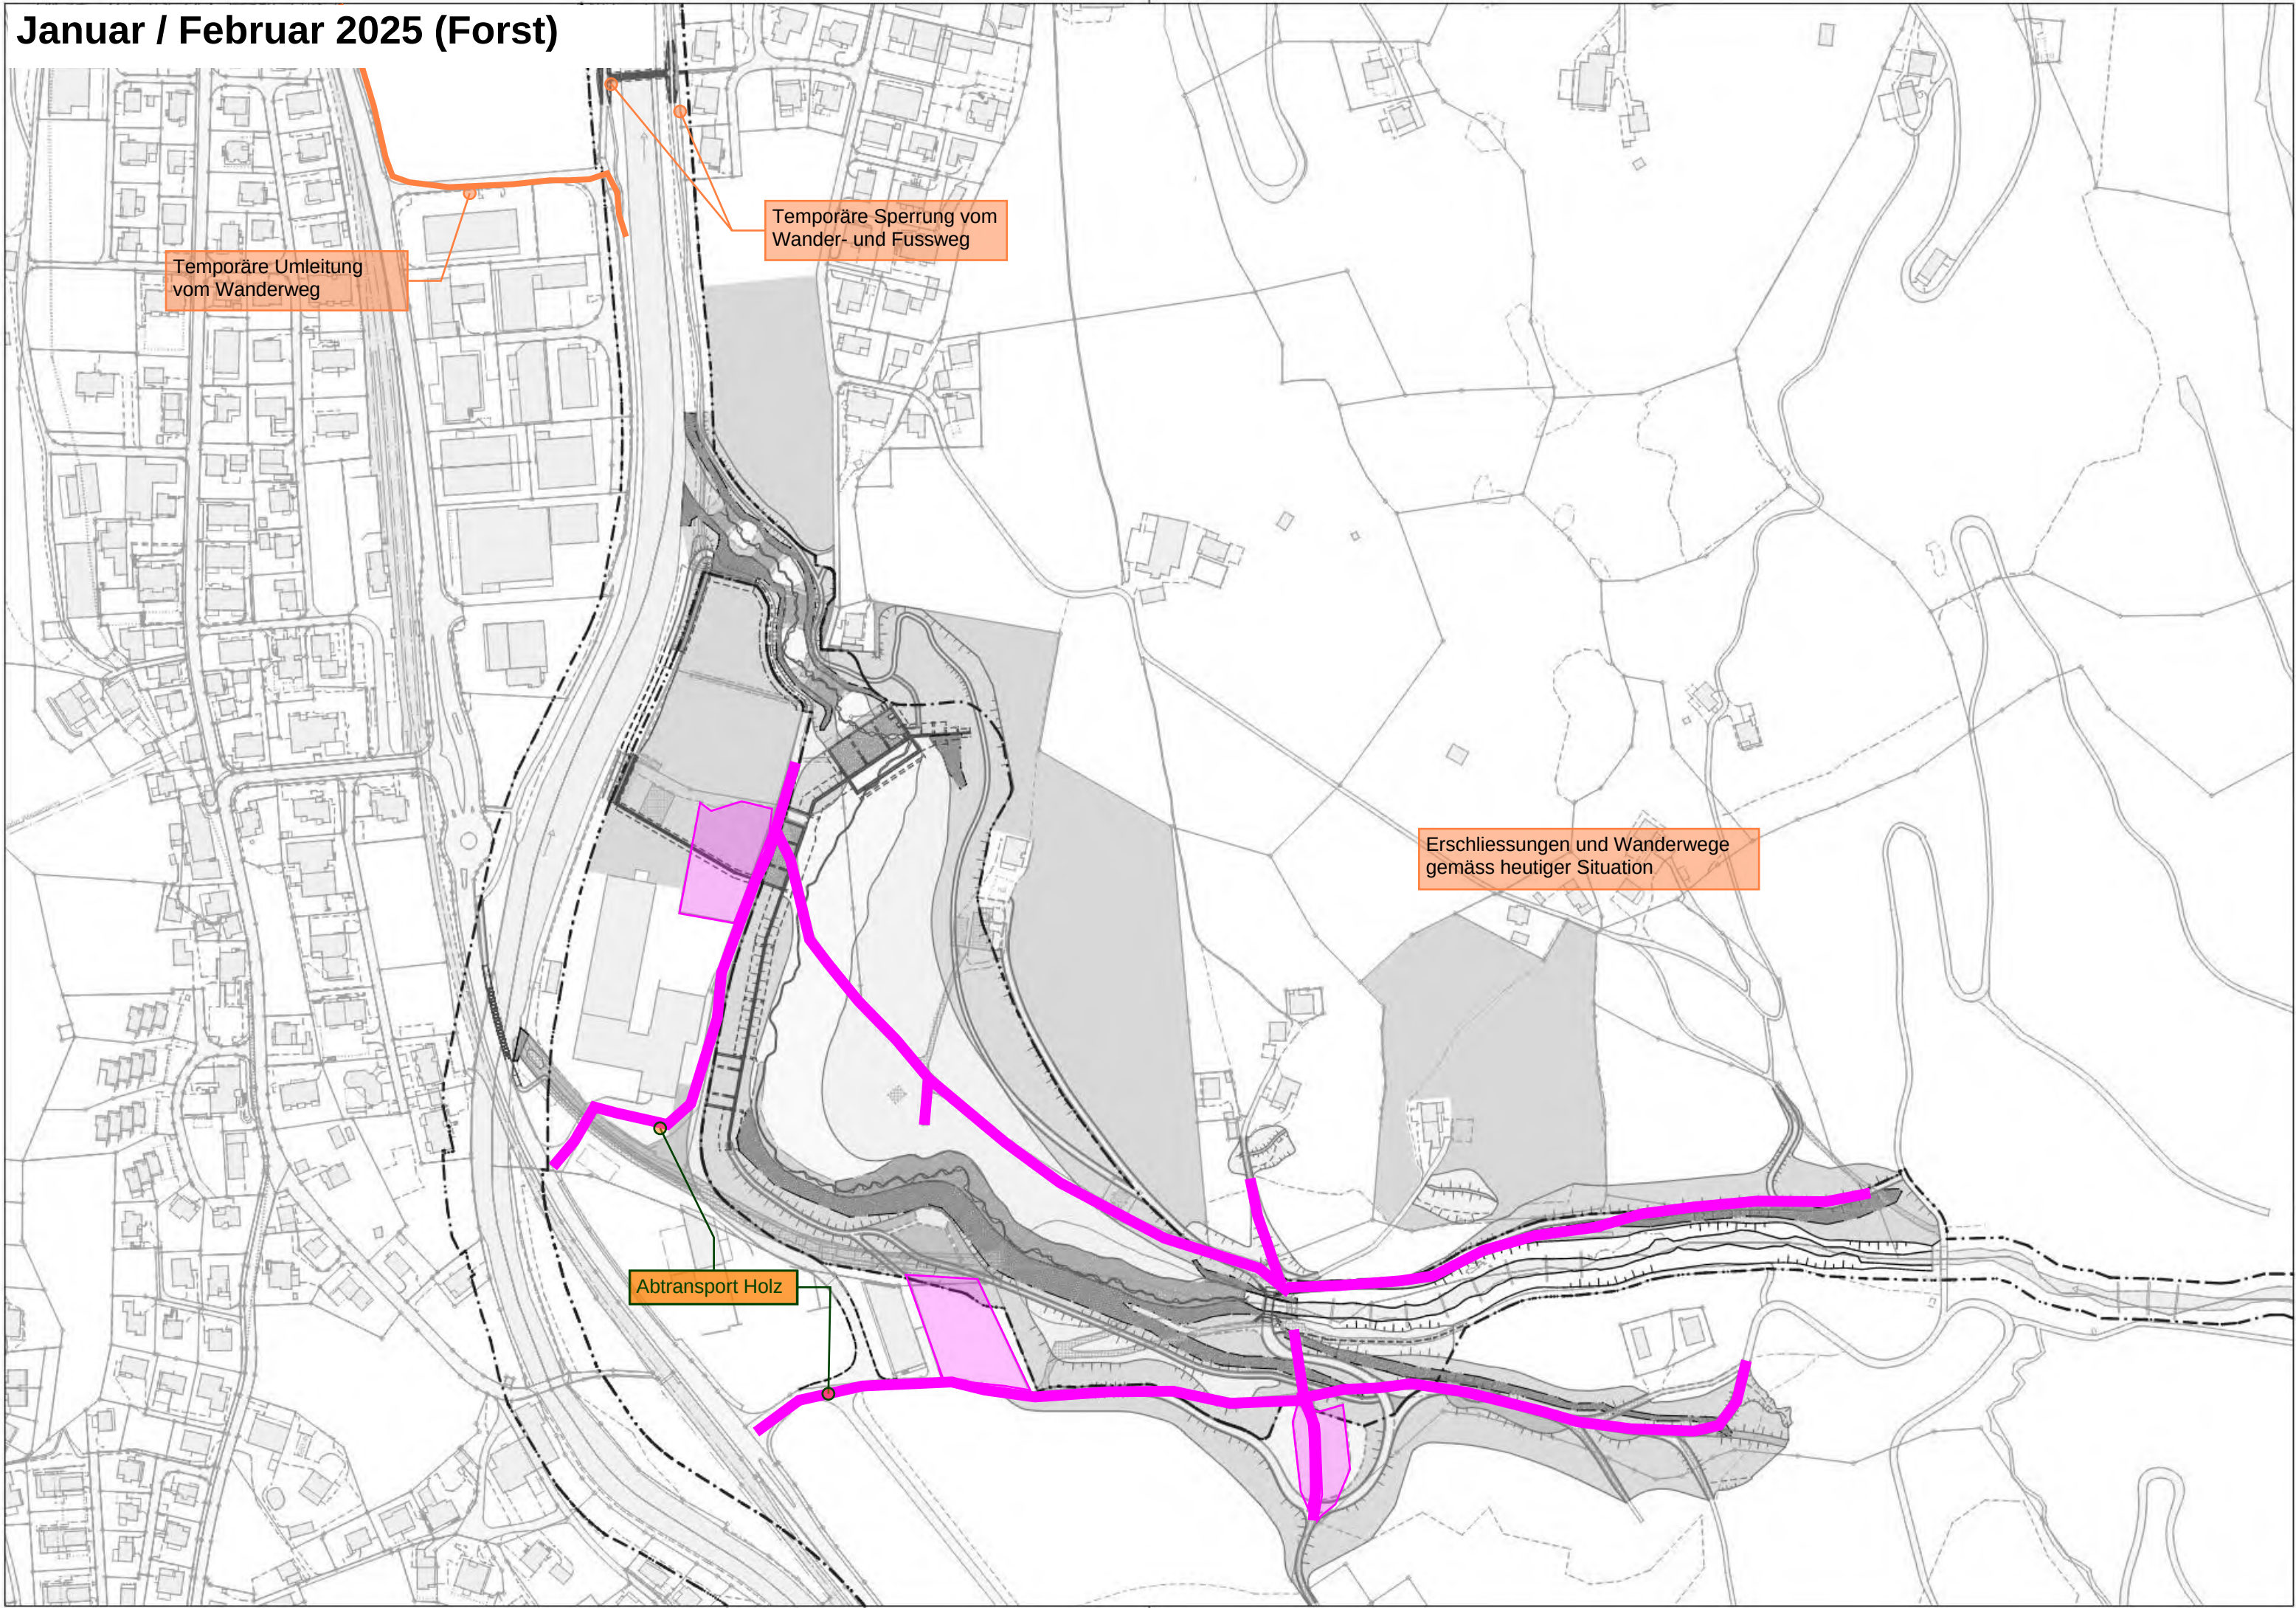

Februar 2025 (Baumeister & Unternehmer Bürersteg)


Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

Temporäre Sperrung vom
Wander- und Fussweg

Fundation und
Widerlager erstellen

Erschliessungen und Wanderwege
gemäss heutiger Situation

Bohrpfahlwände und
Widerlager erstellen

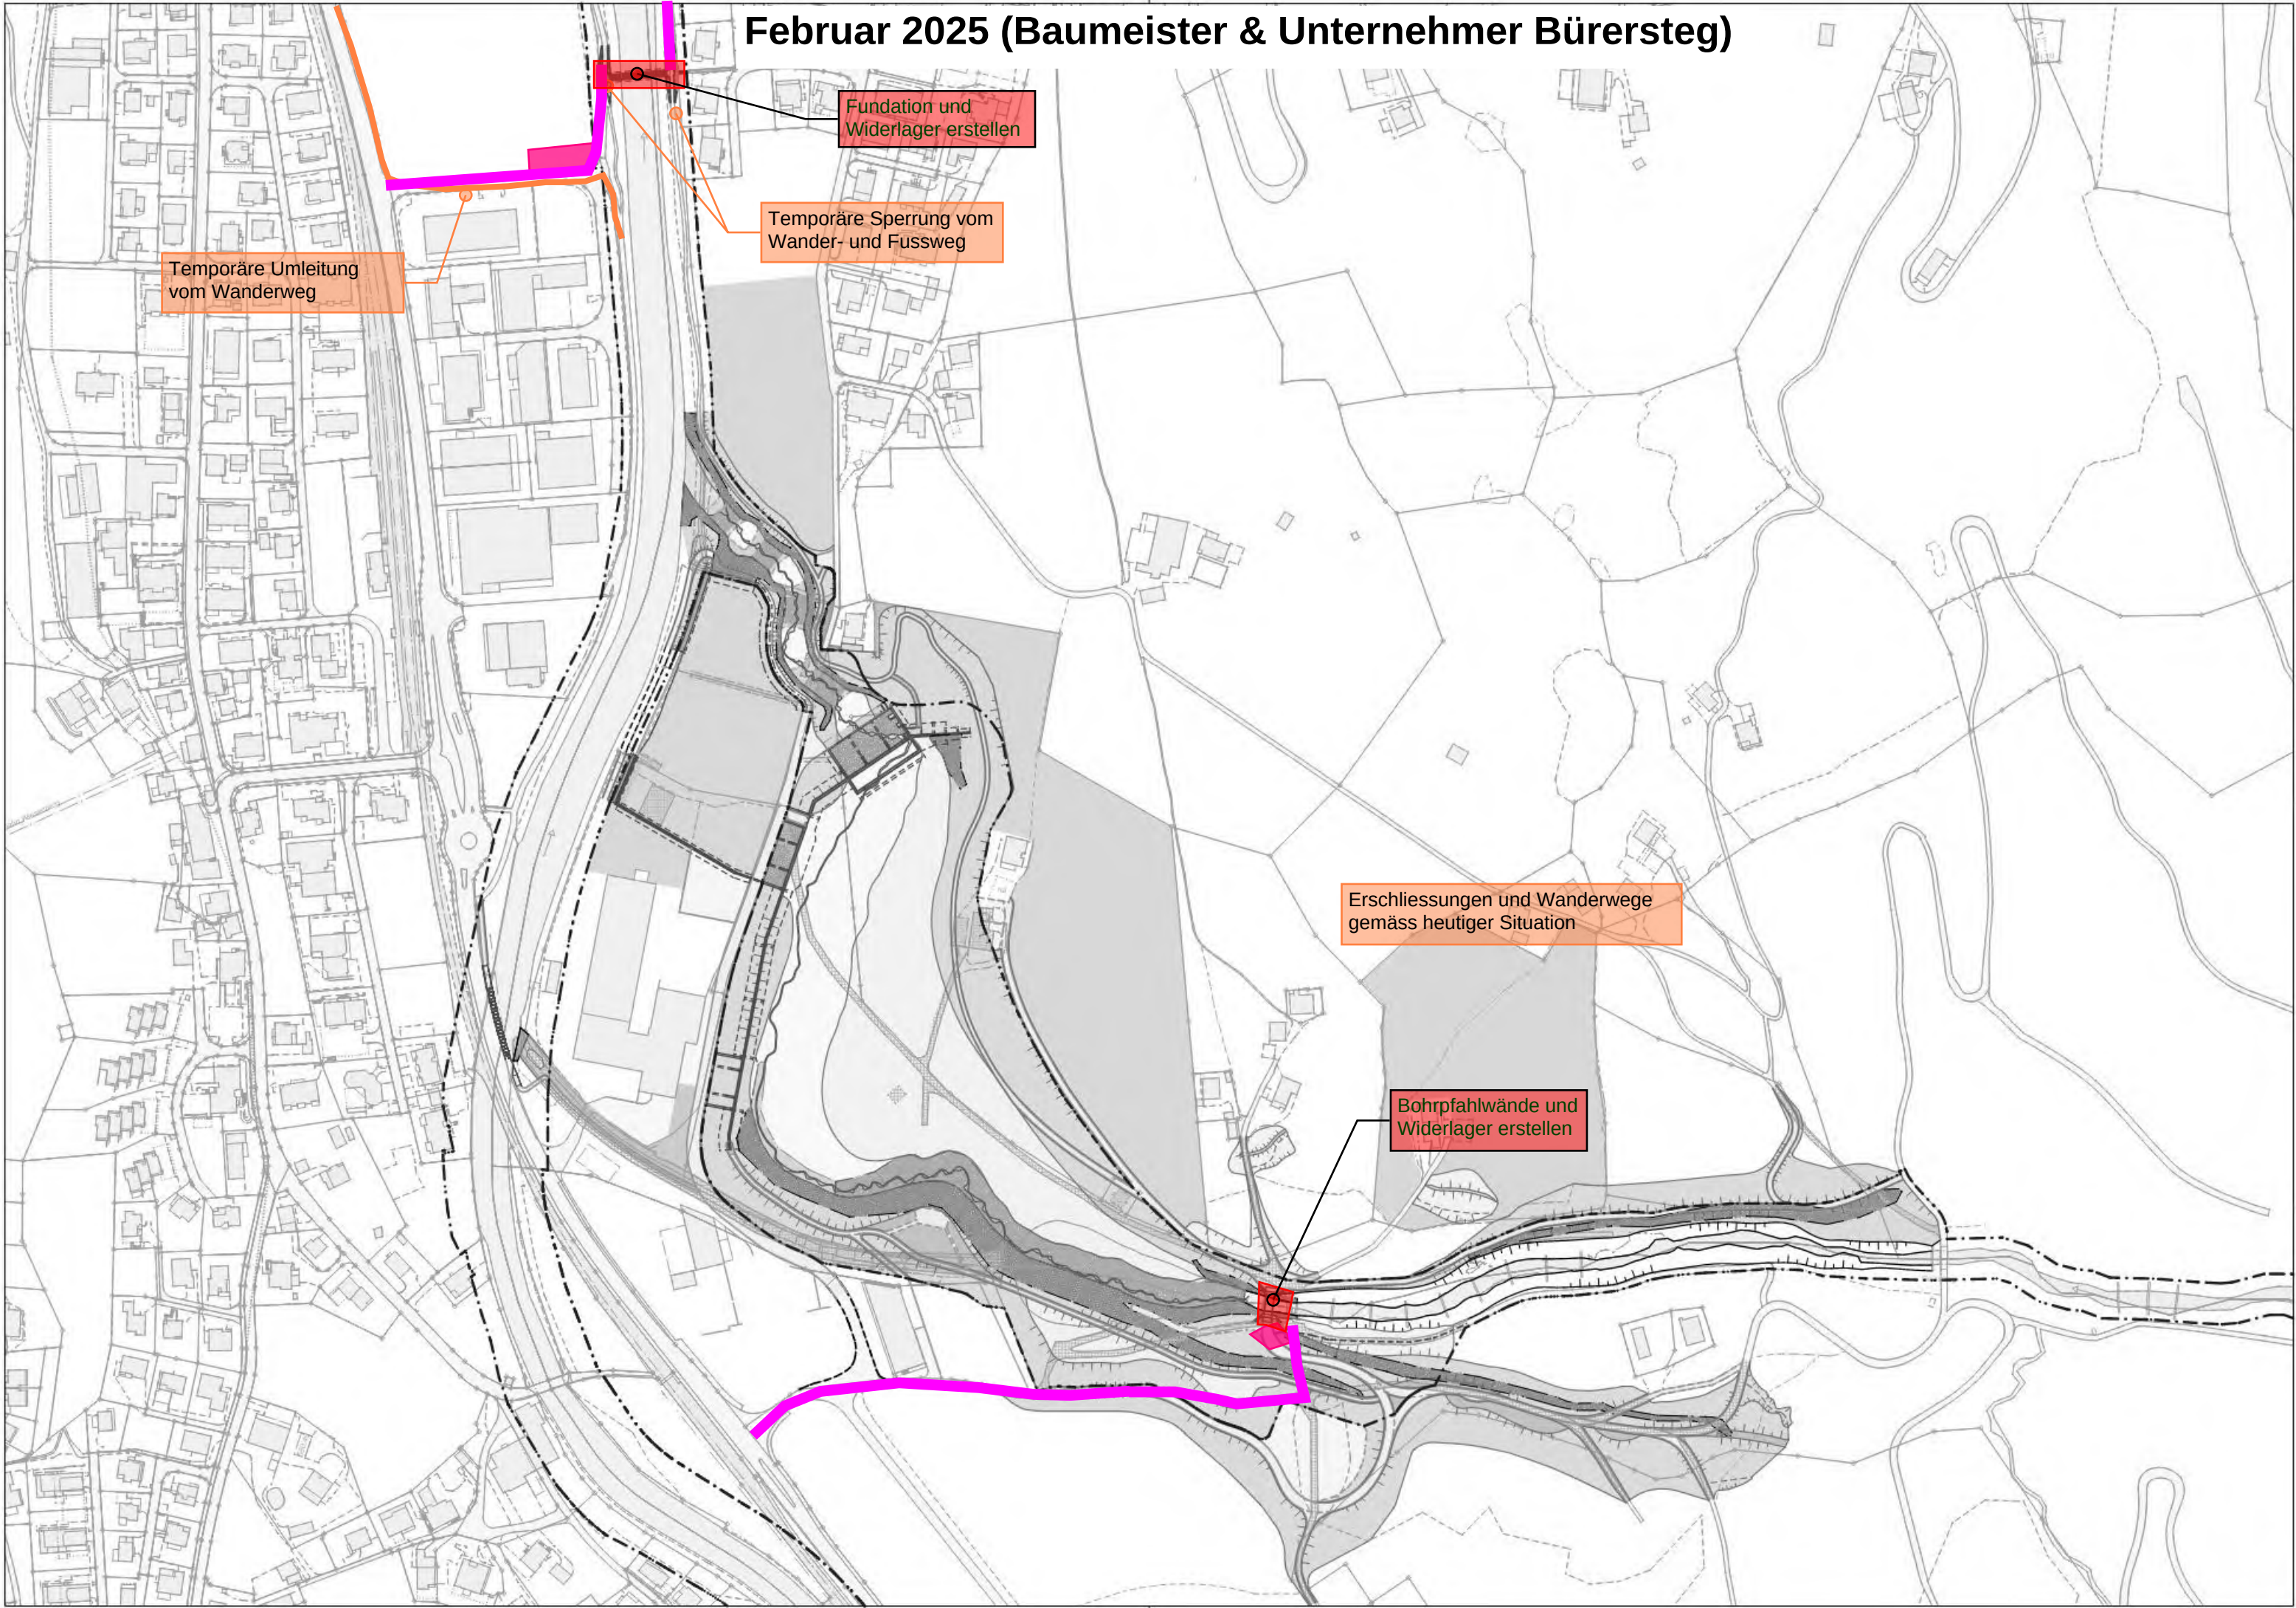

März / April 2025 (Baumeister & Unternehmer Bürersteg)

Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

Bürersteg erstellen

Temporäre Sperrung vom
Wander- und Fussweg

Rückbau Lagerhalle
und Blocksteinmauer

Waldboden abtragen;
Installationsplatz erstellen

Erschliessungen und Wanderwege
gemäss heutiger Situation


Rückbau Bunker

Rückbau diverse
Bauten


etappierte Schüttung
(verschiedene Strassenführungen
während der Schüttung)

Rückbau Bunker


Brücke Buoholz
erstellen

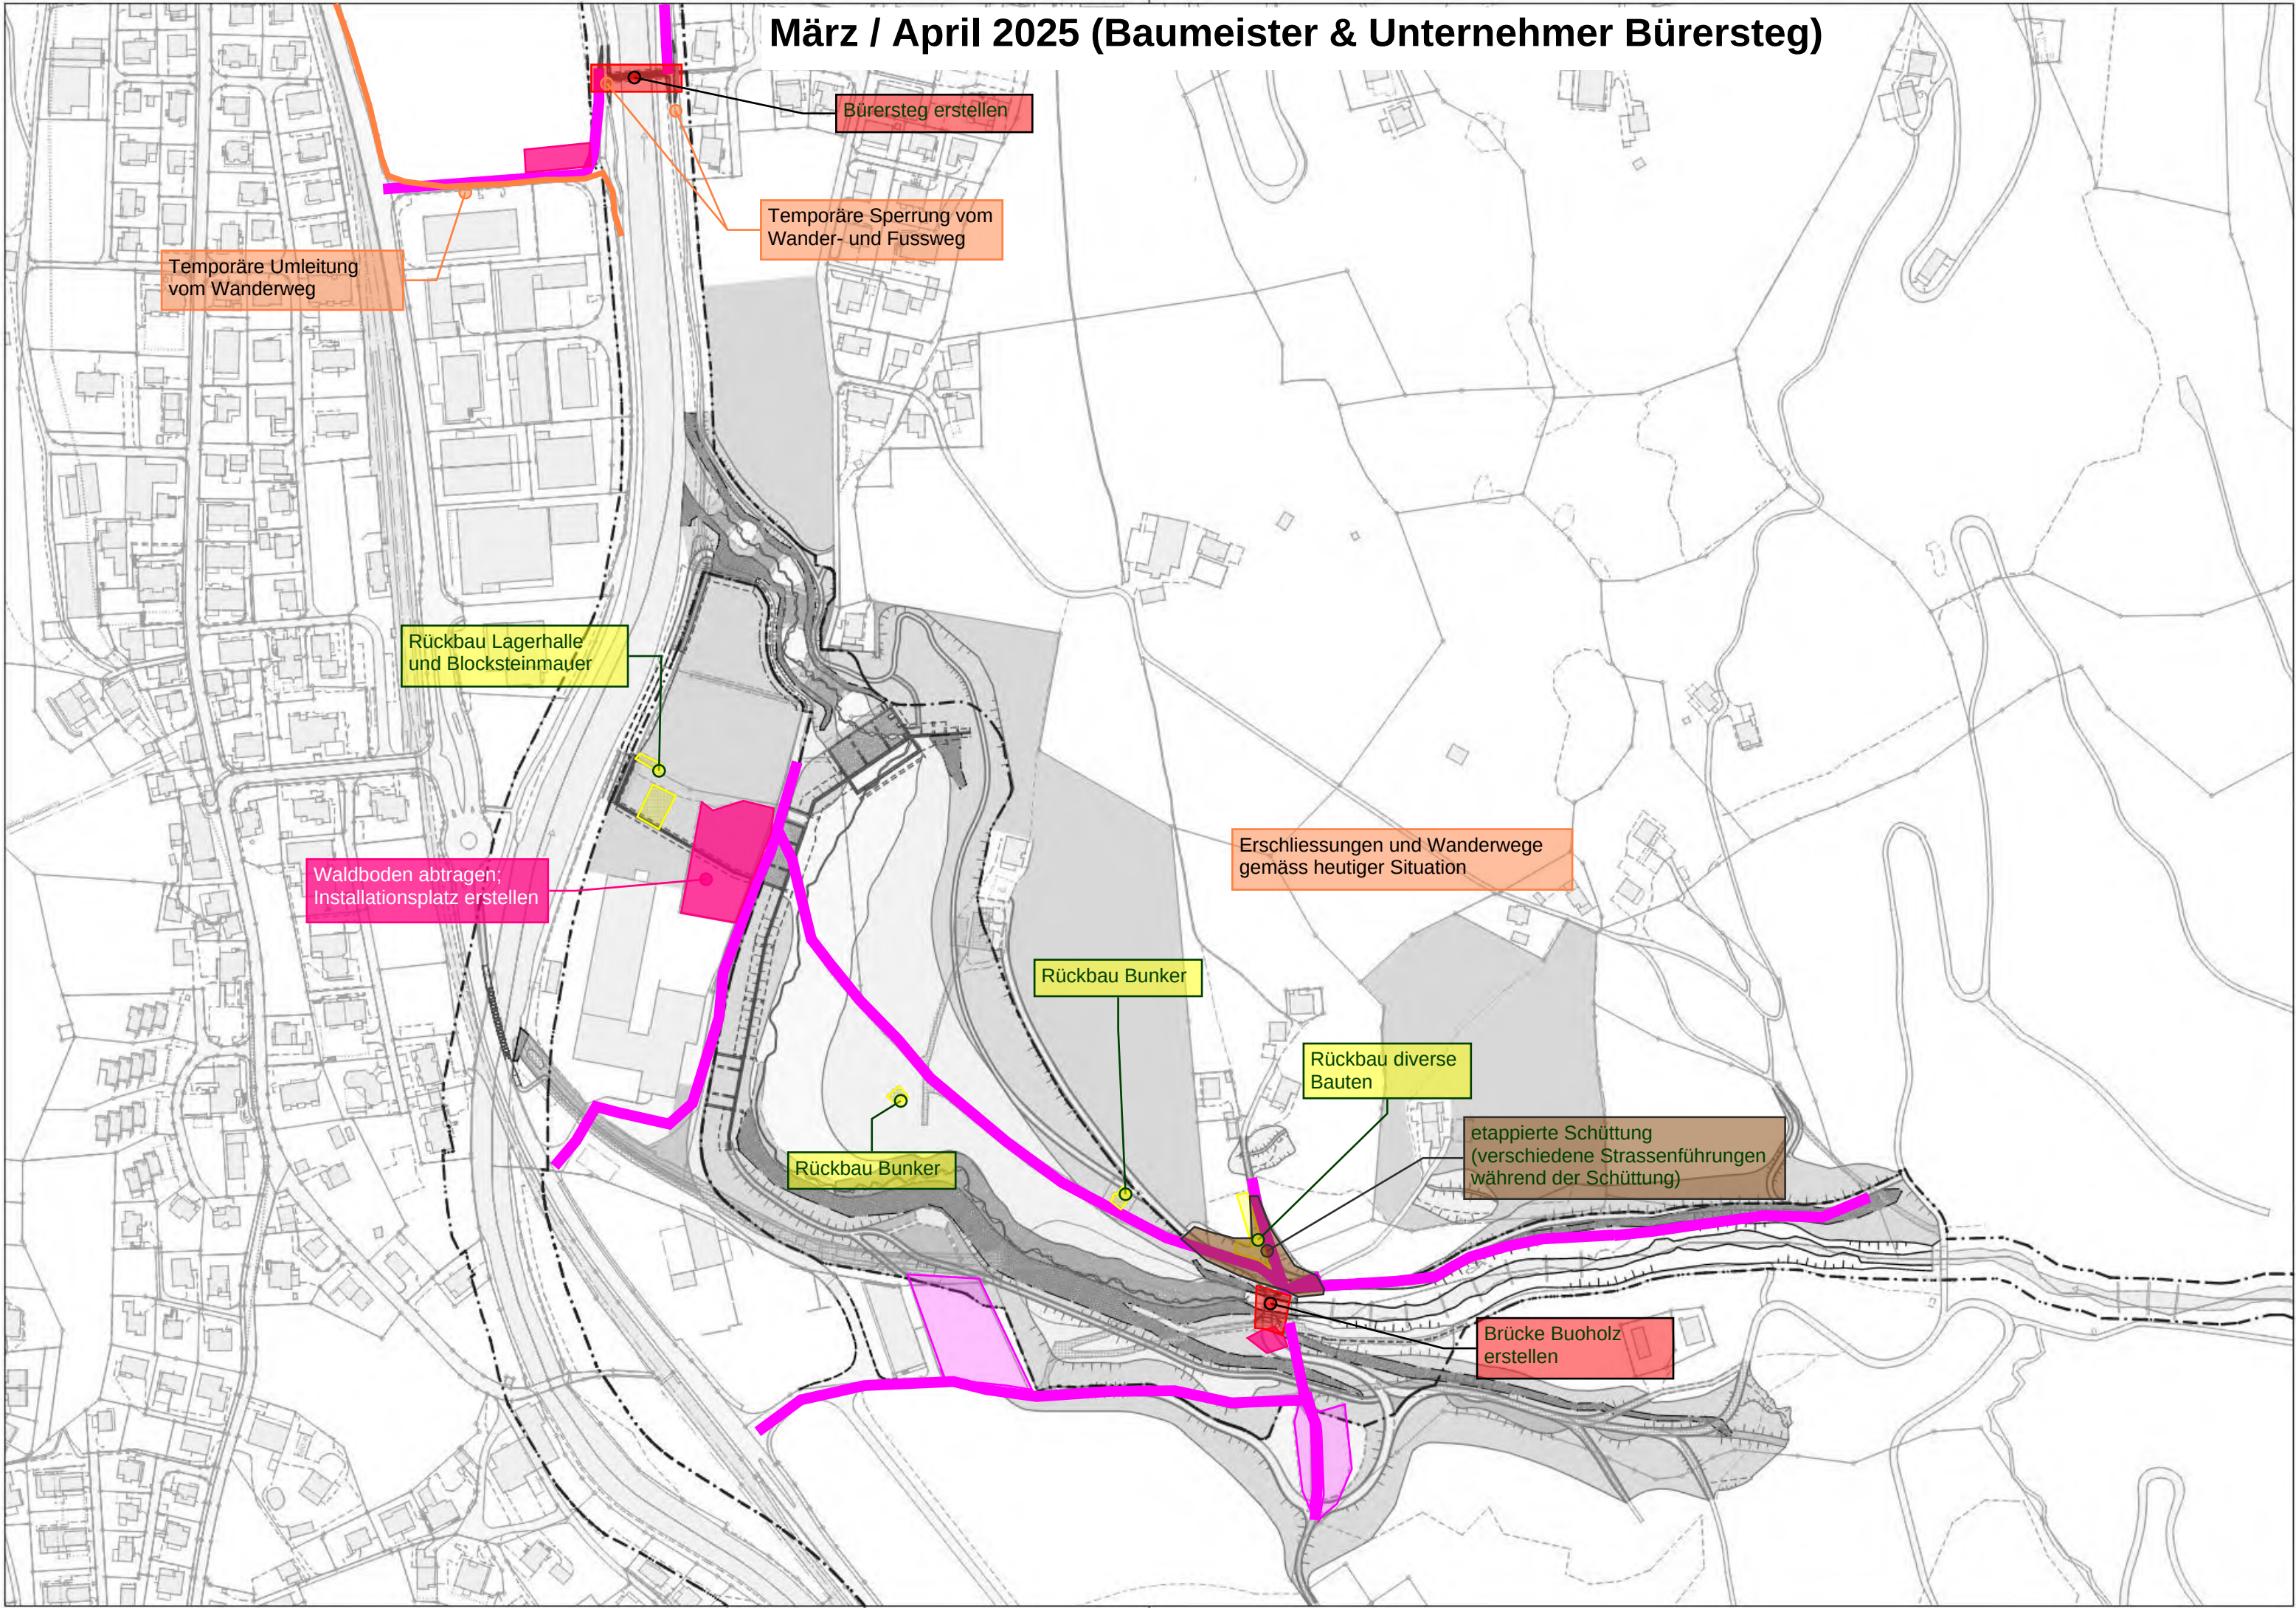

April bis August 2025 (Baumeister 1. Gruppe)

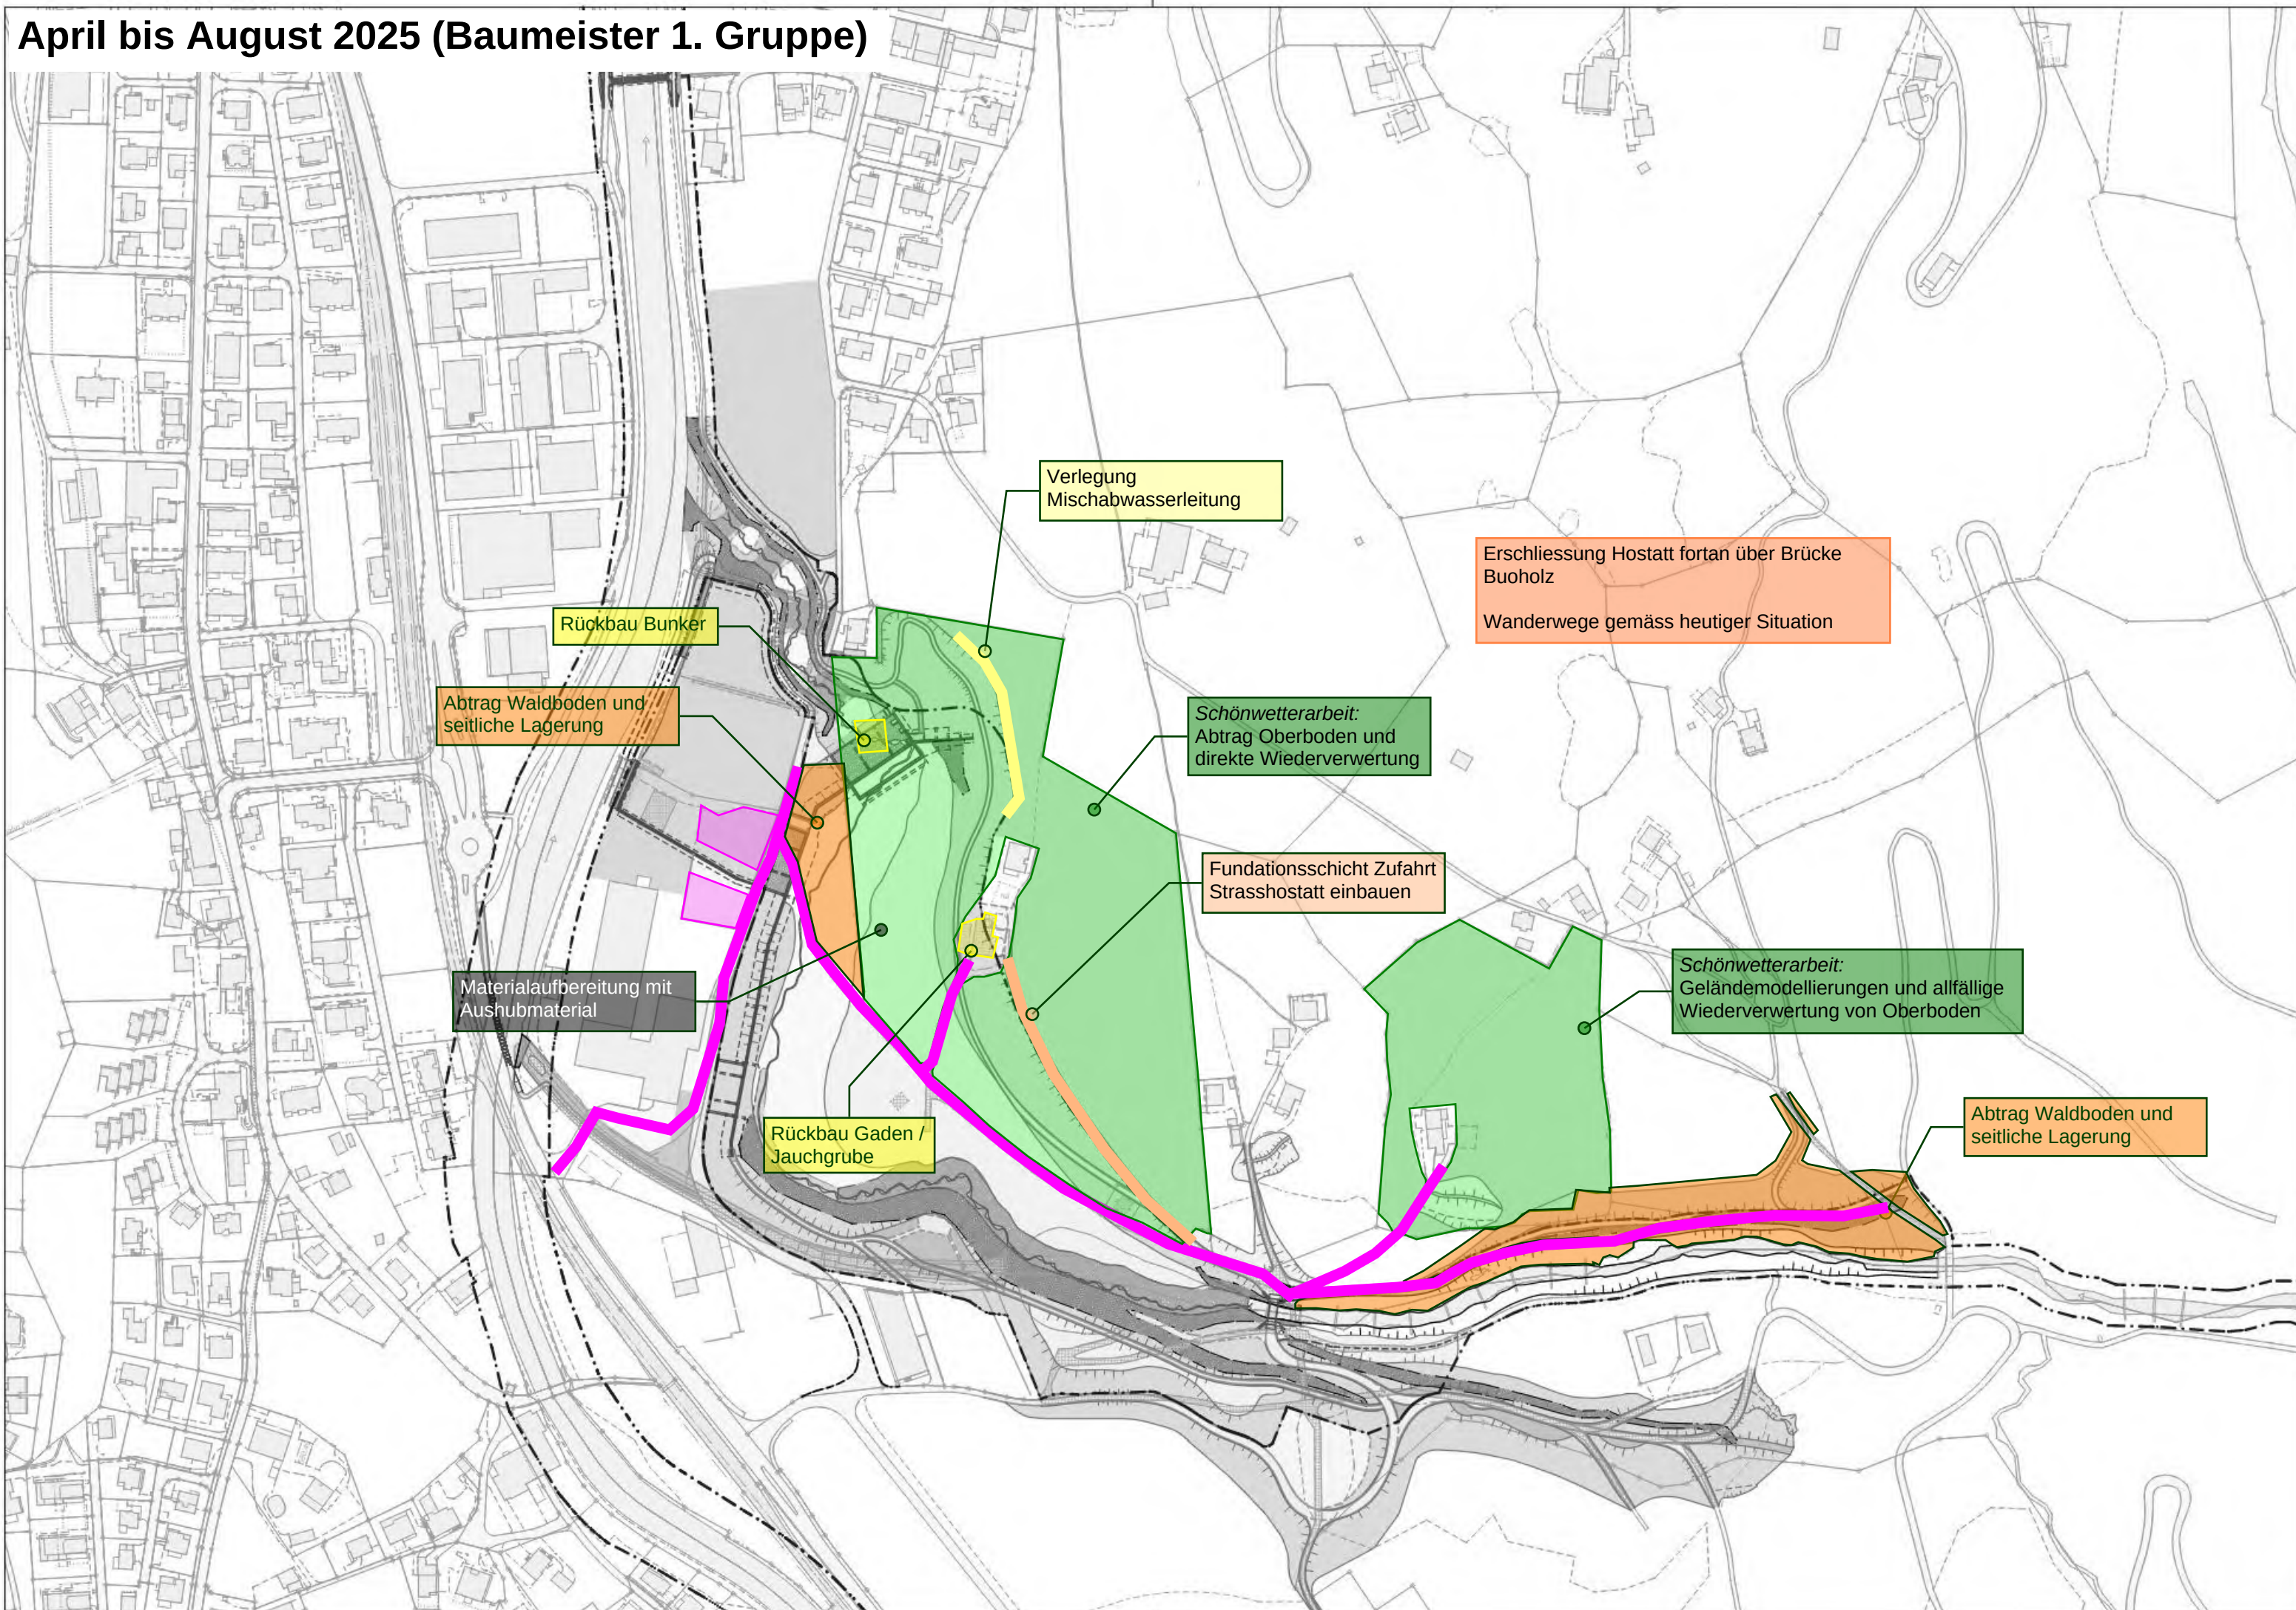

April bis Juni 2025 (Baumeister 2. Gruppe)

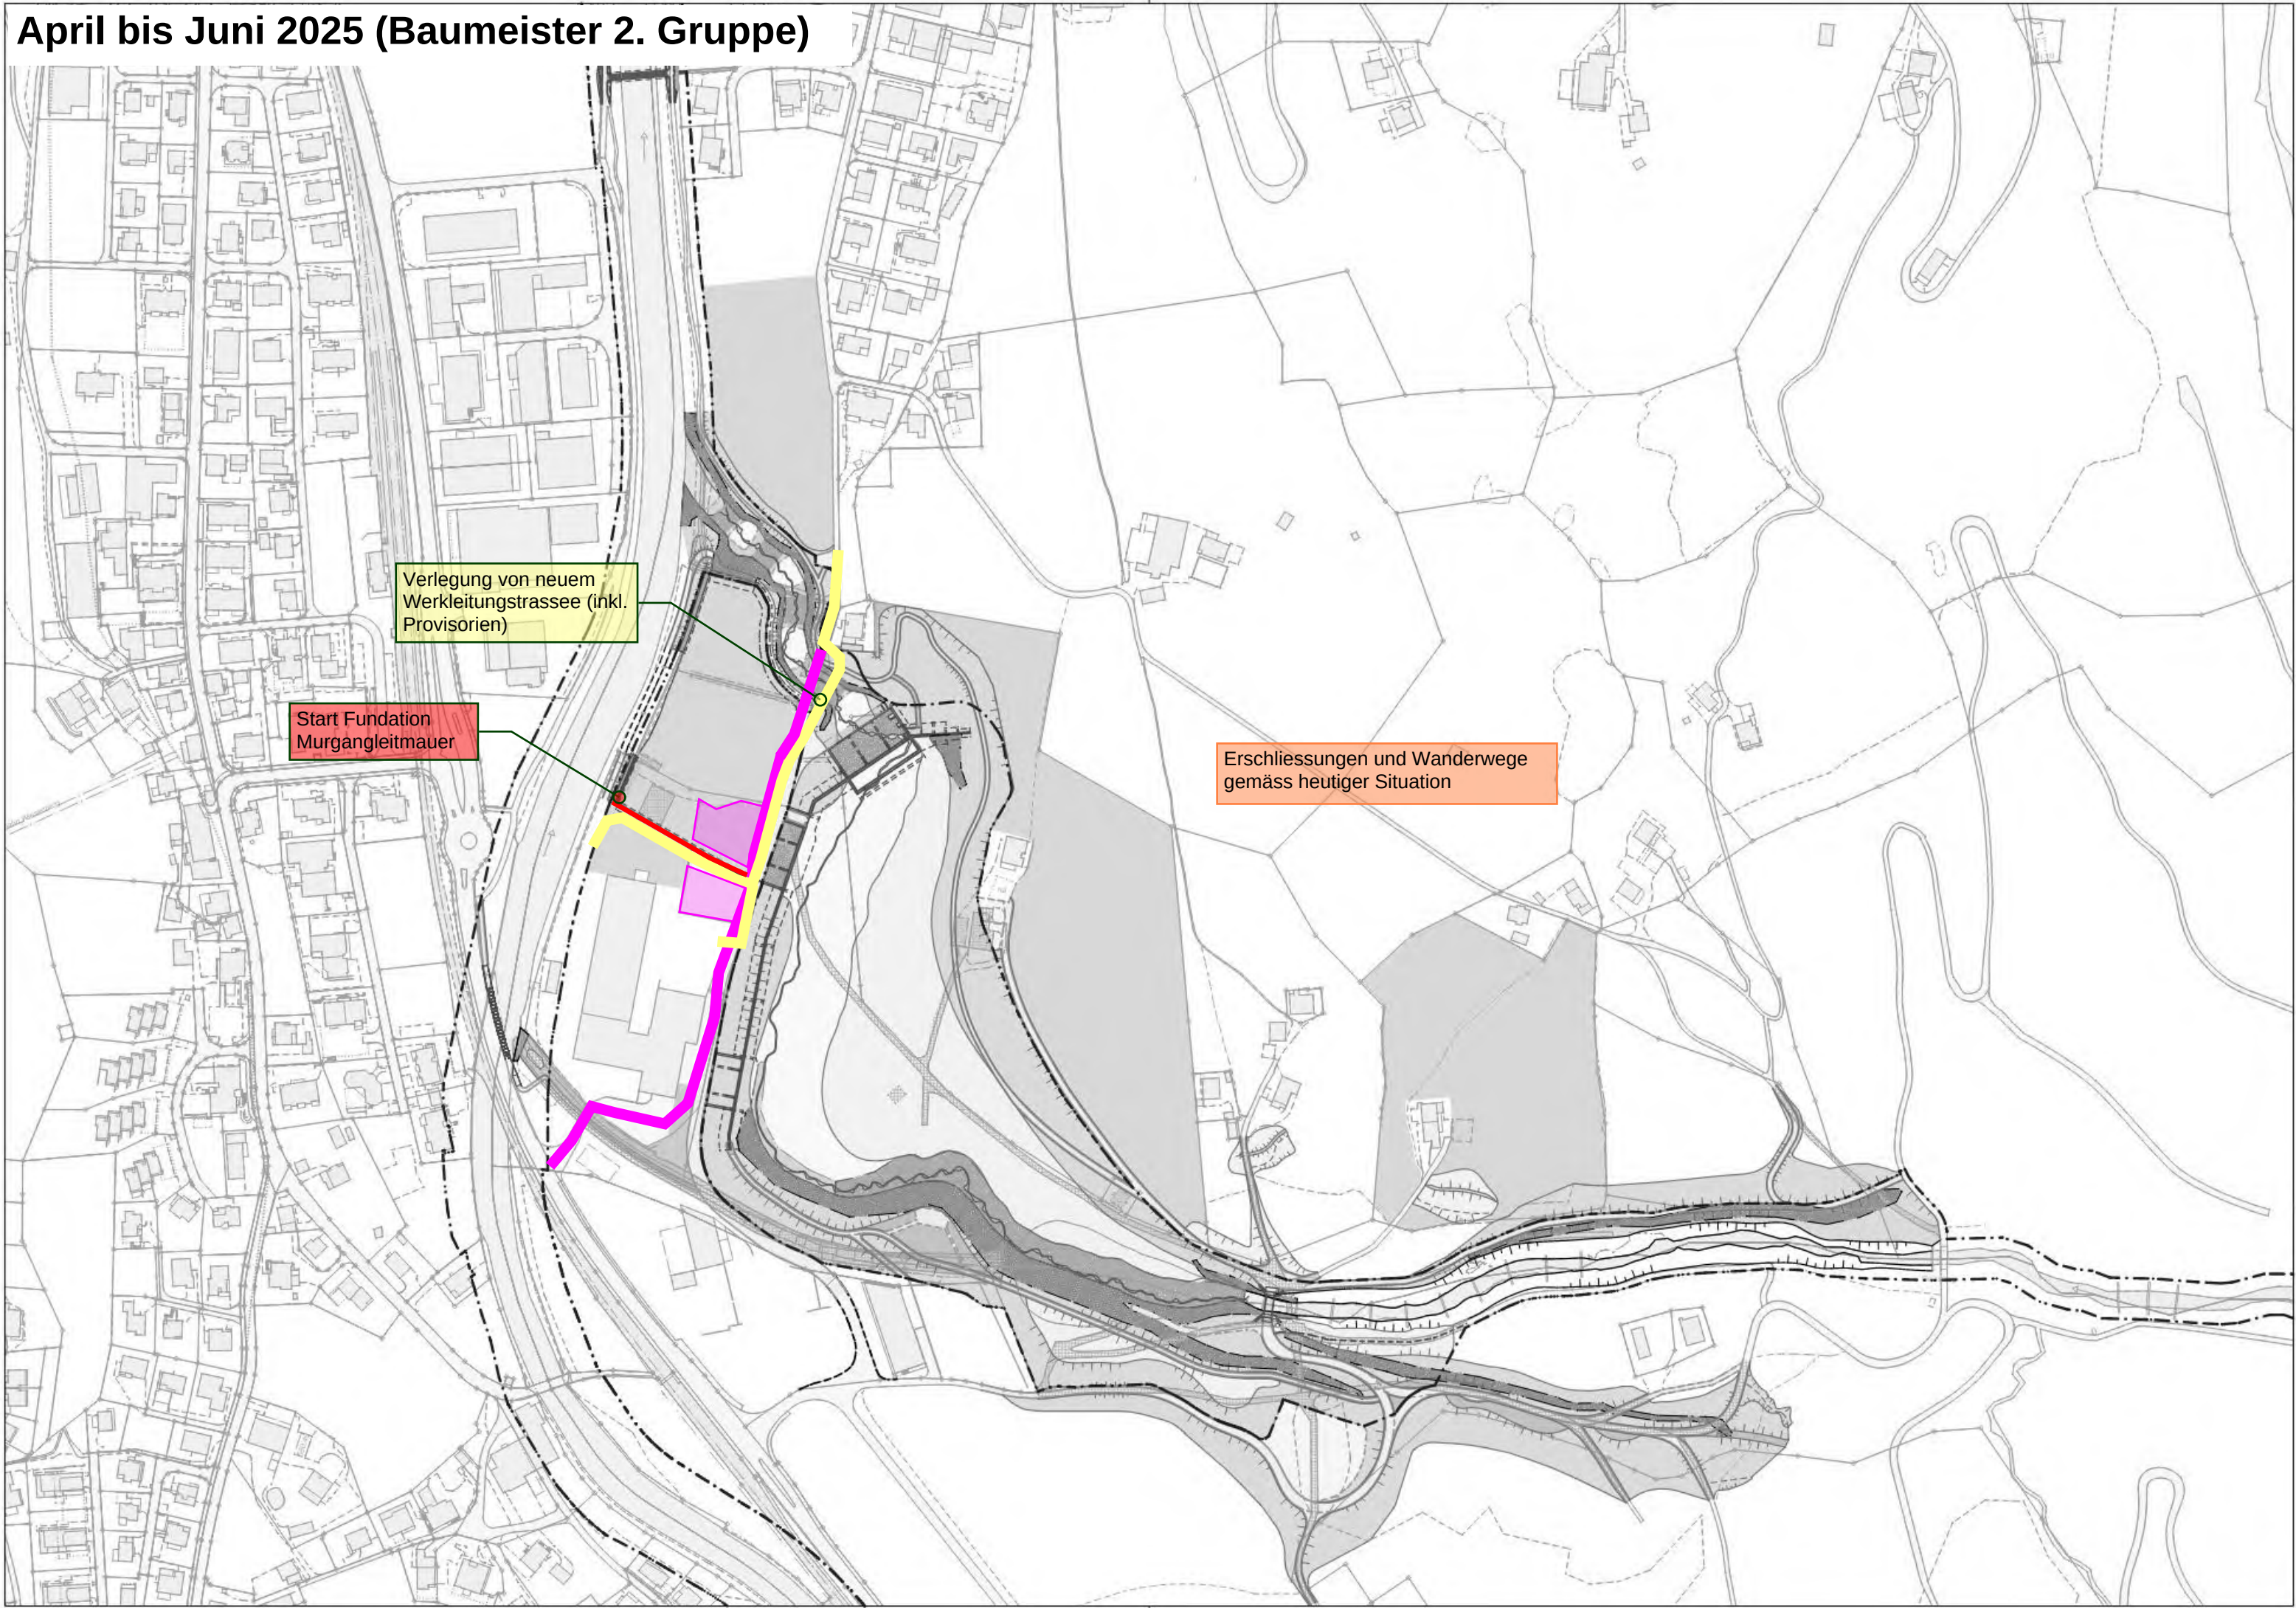

Verlegung von neuem
Werkleitungstrasse (inkl.
Provisorien)

Start Fundation
Murgangleitmauer

Erschliessungen und Wanderwege
gemäss heutiger Situation

Mai 2025 (Unternehmer Bürersteg)


Rückbau Installationsplatz


Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

Anschlüsse an Bürersteg erstellen

Temporäre Sperrung vom
Wander- und Fussweg

Erschliessungen und Wanderwege
gemäss heutiger Situation

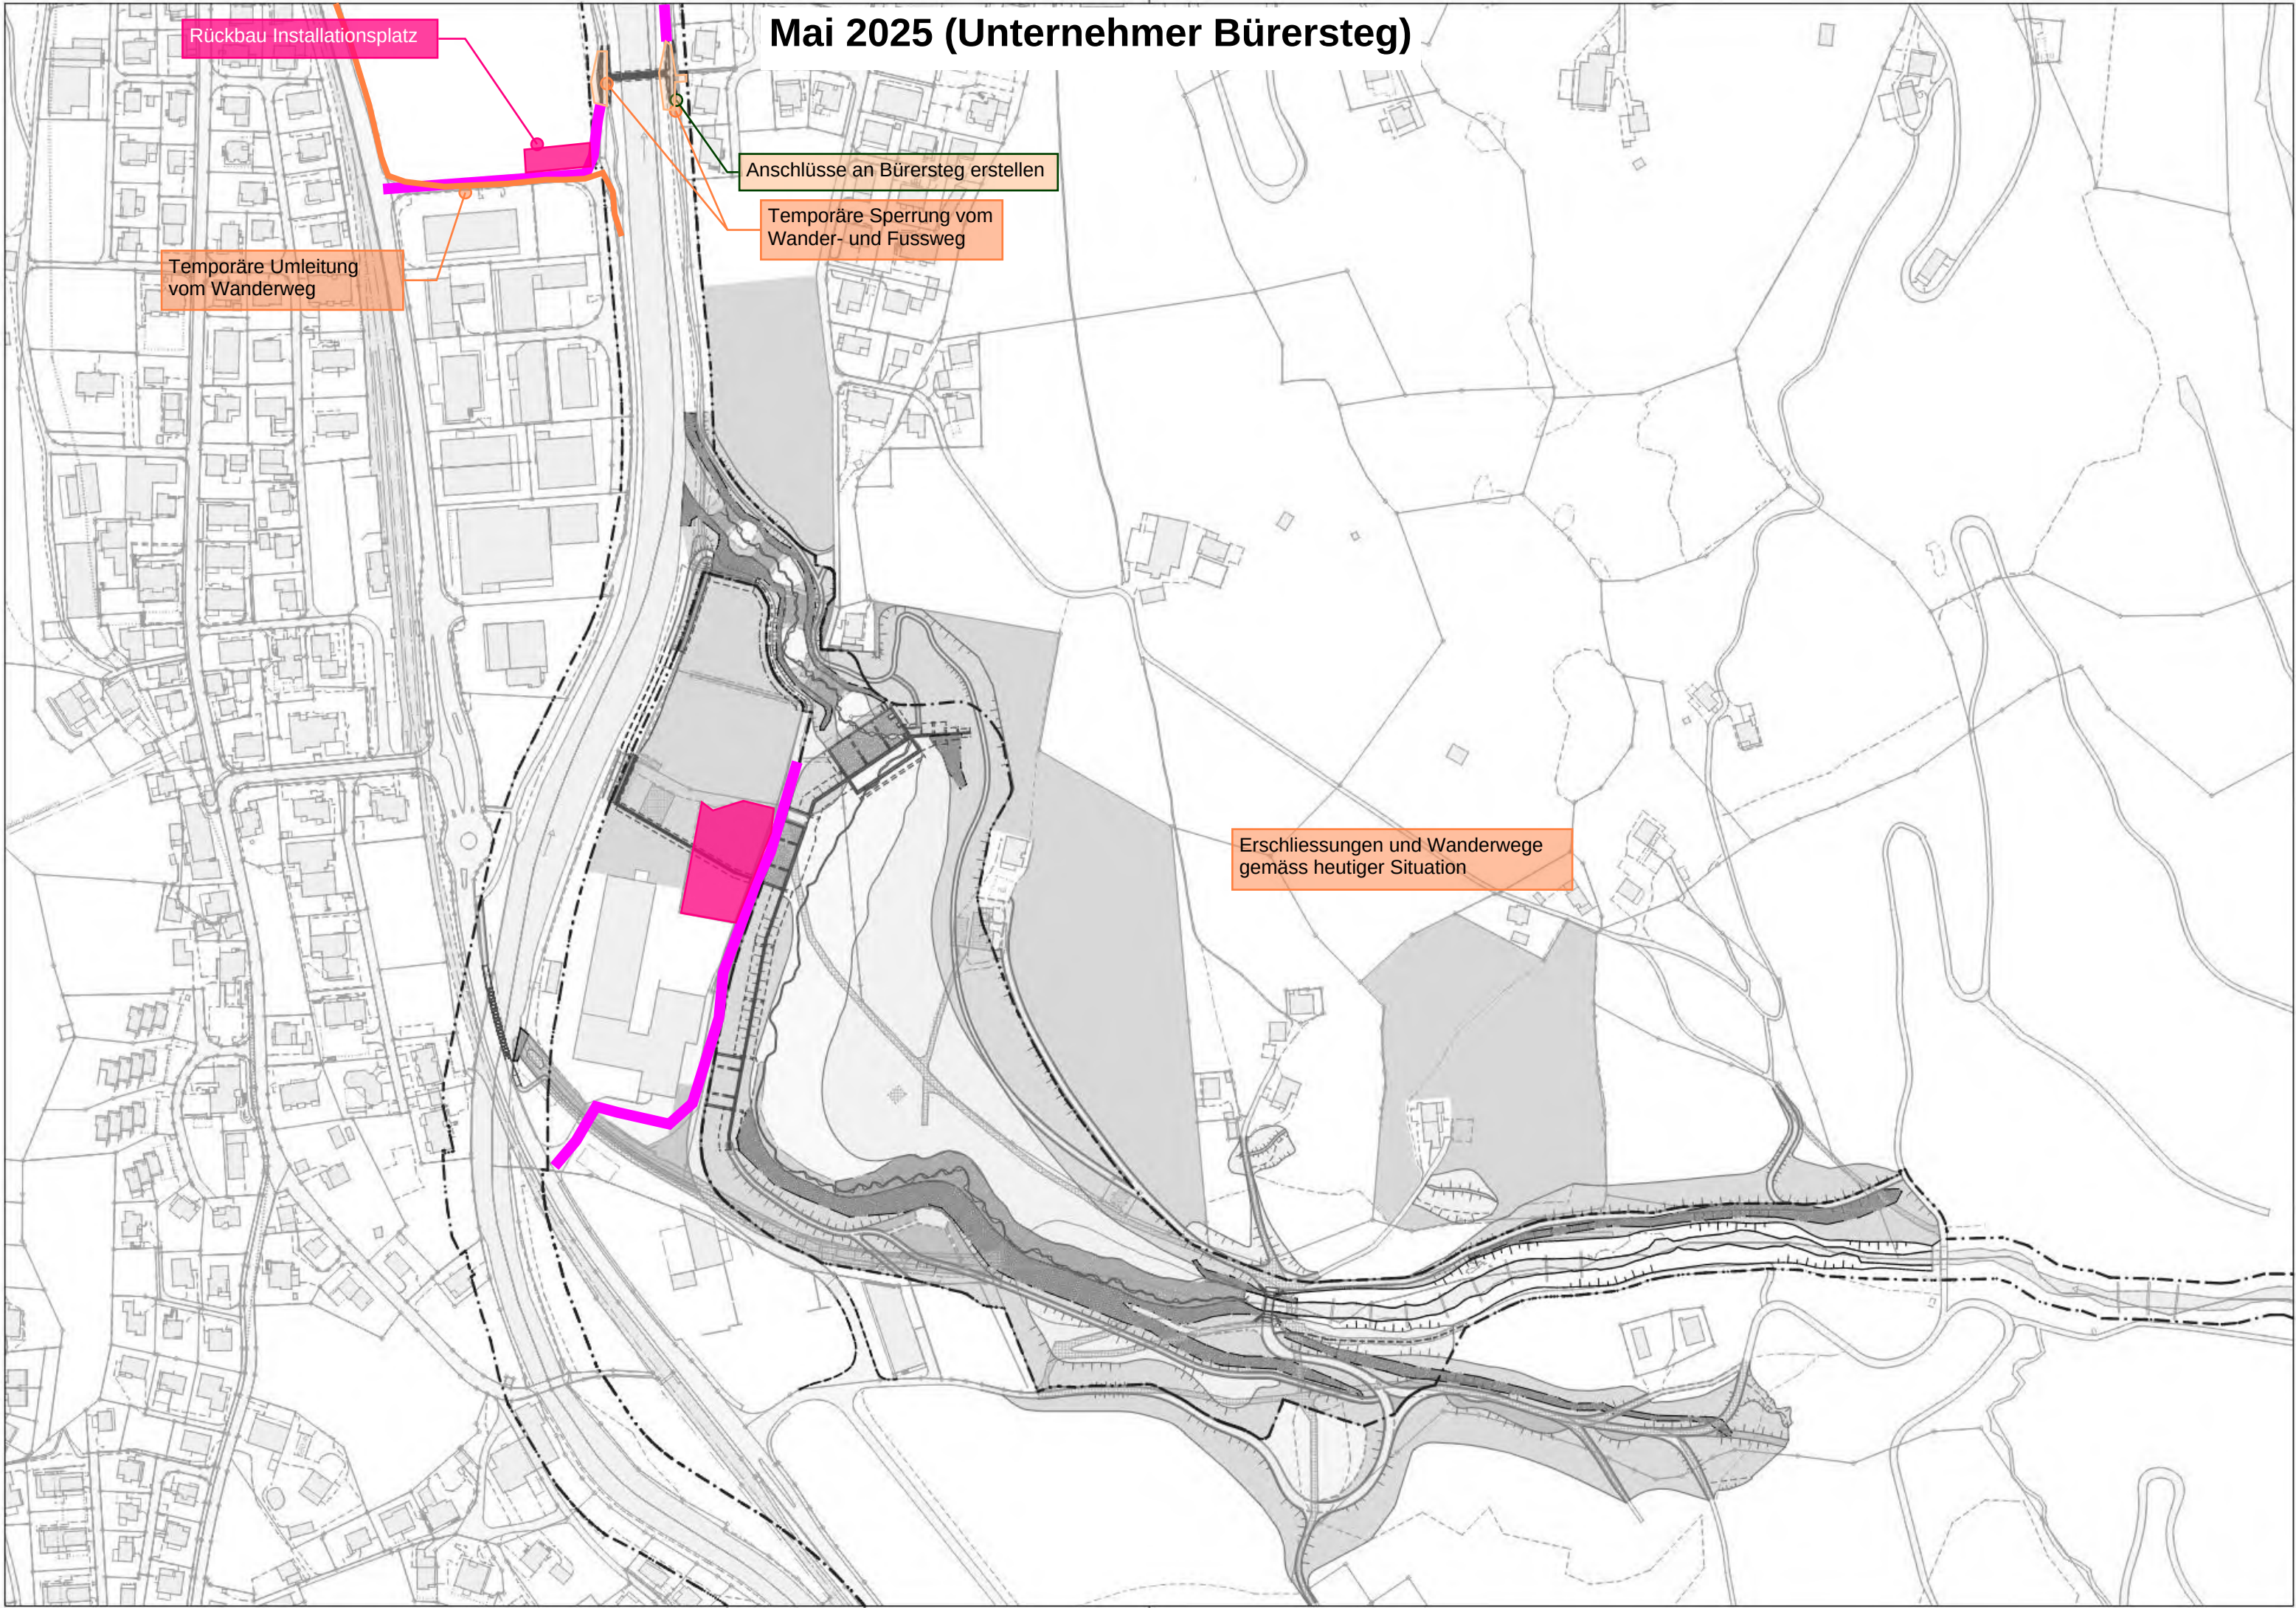


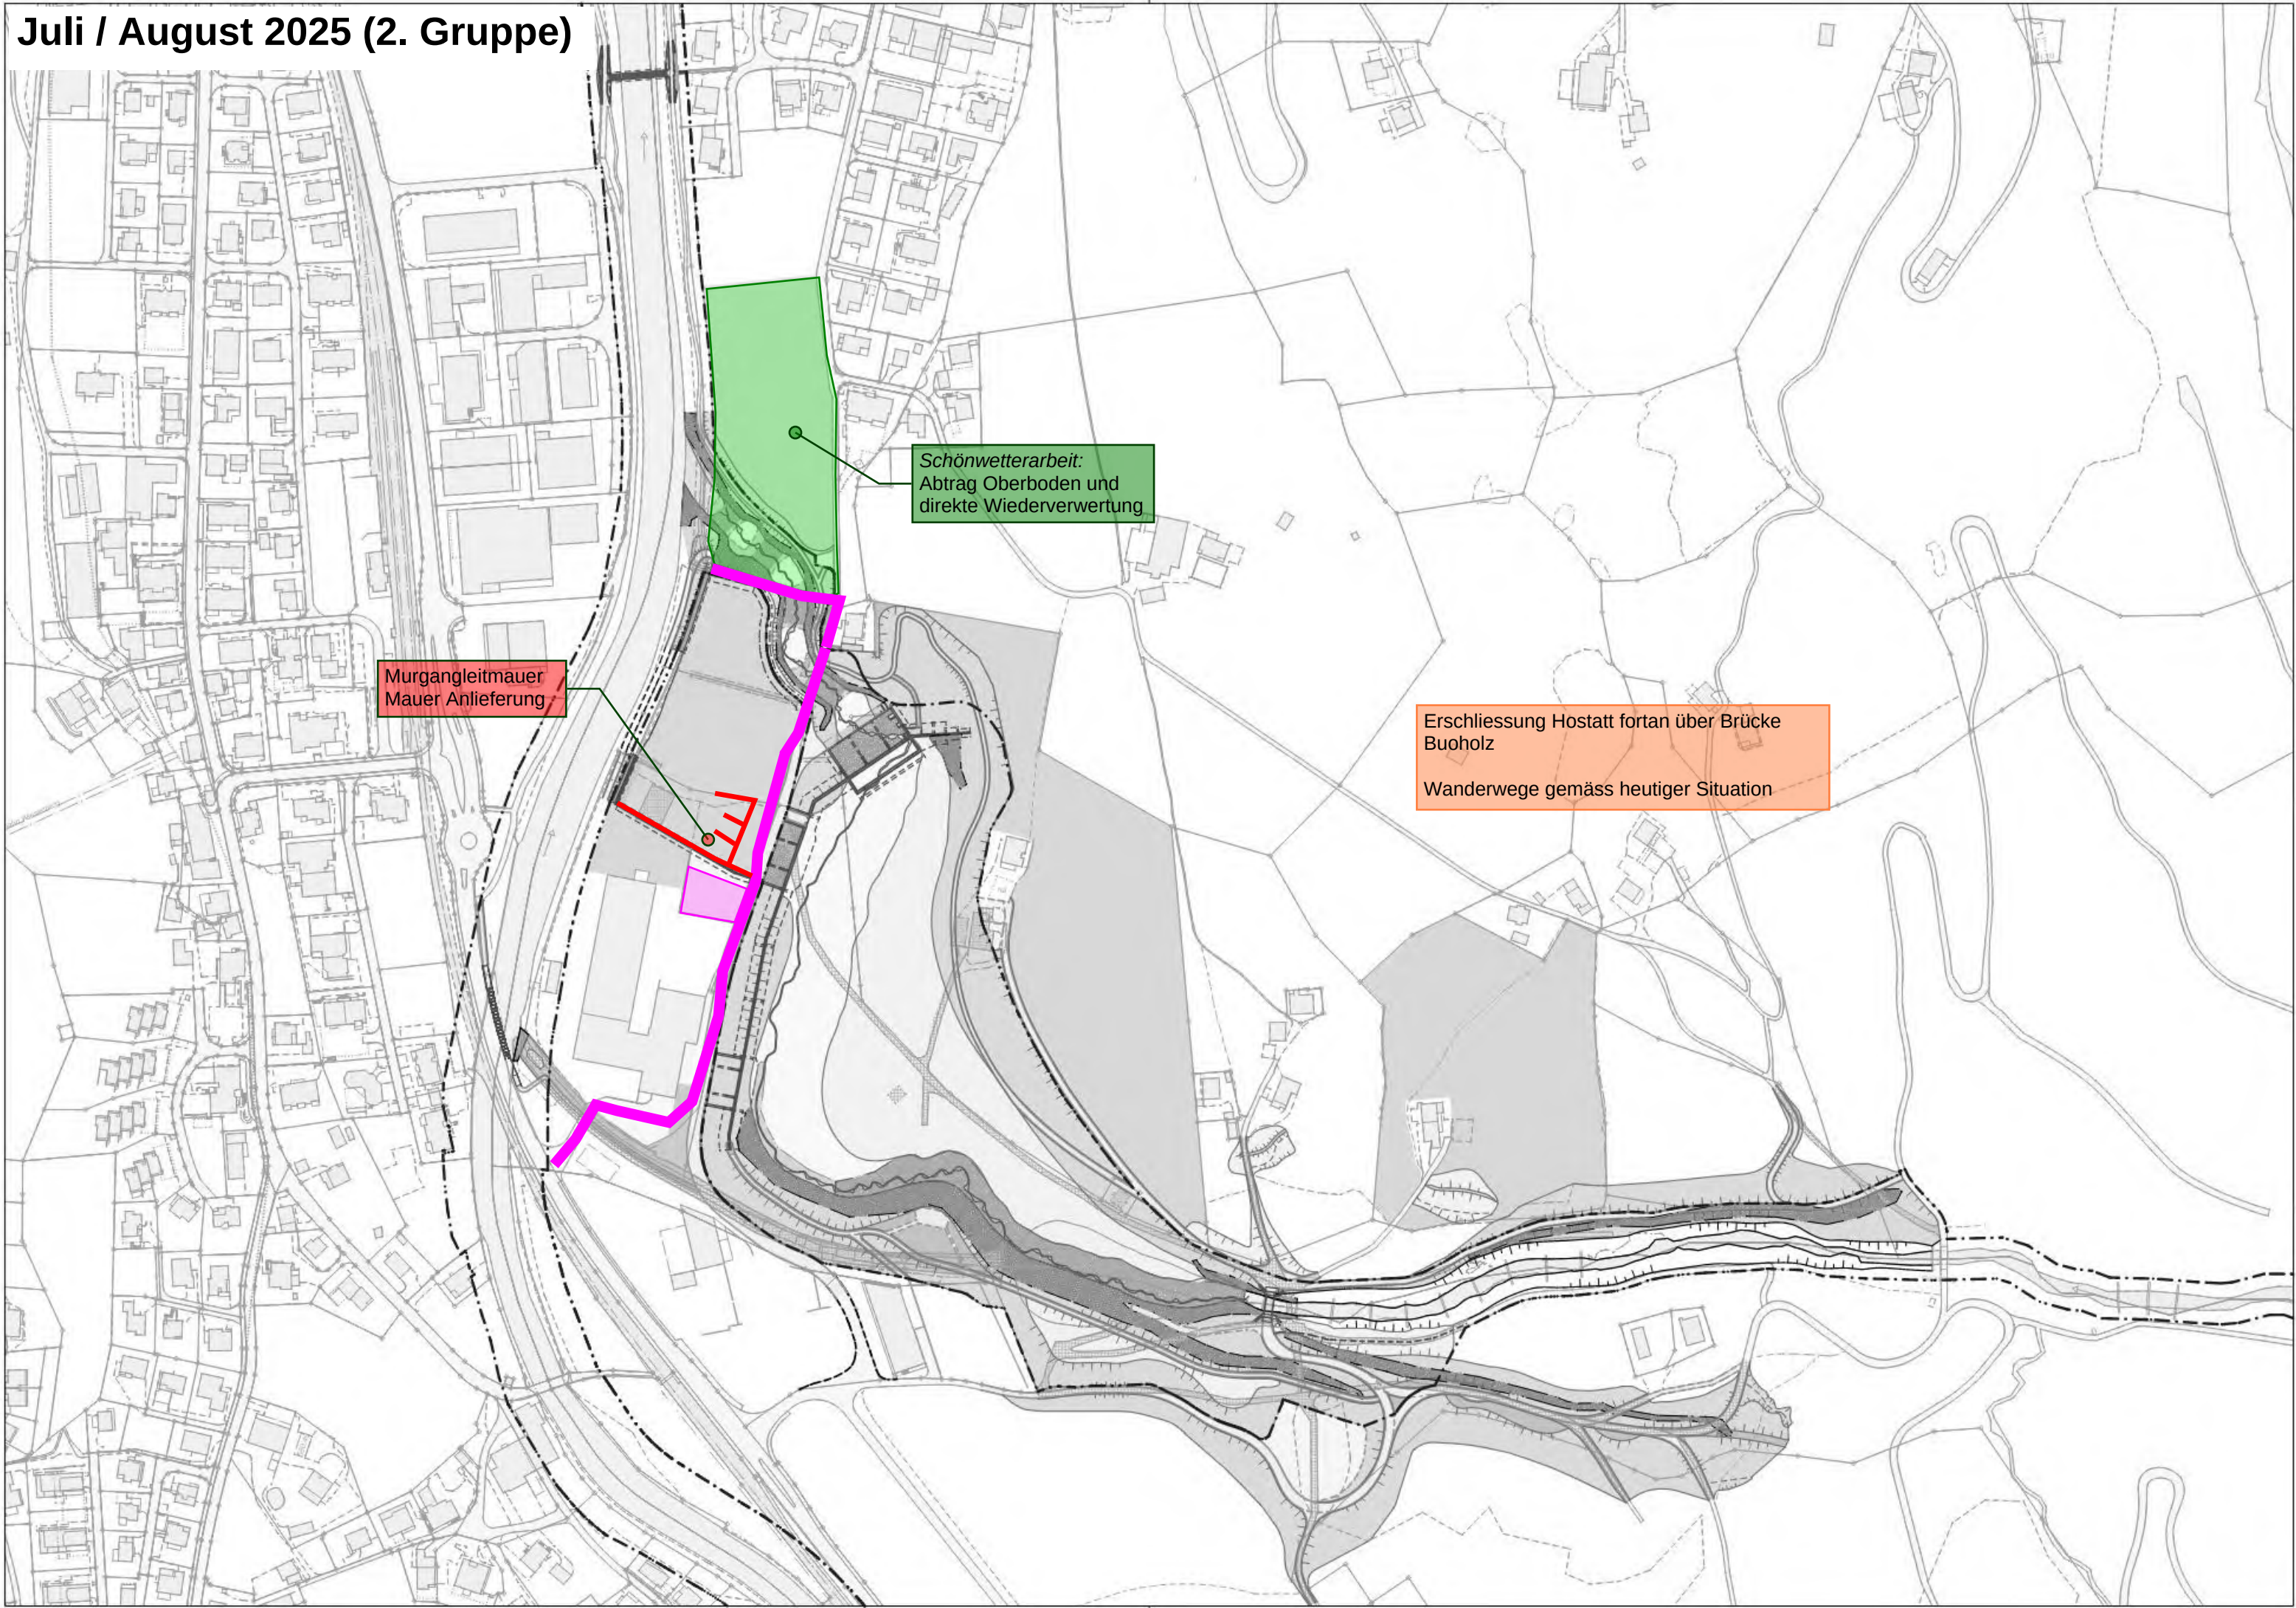

Schönwetterarbeit:
Abtrag Oberboden und
direkte Wiederverwertung

Murgangleitmauer
Mauer Anlieferung


Erschliessung Hostatt fortan über Brücke
Buoholz
Wanderwege gemäss heutiger Situation

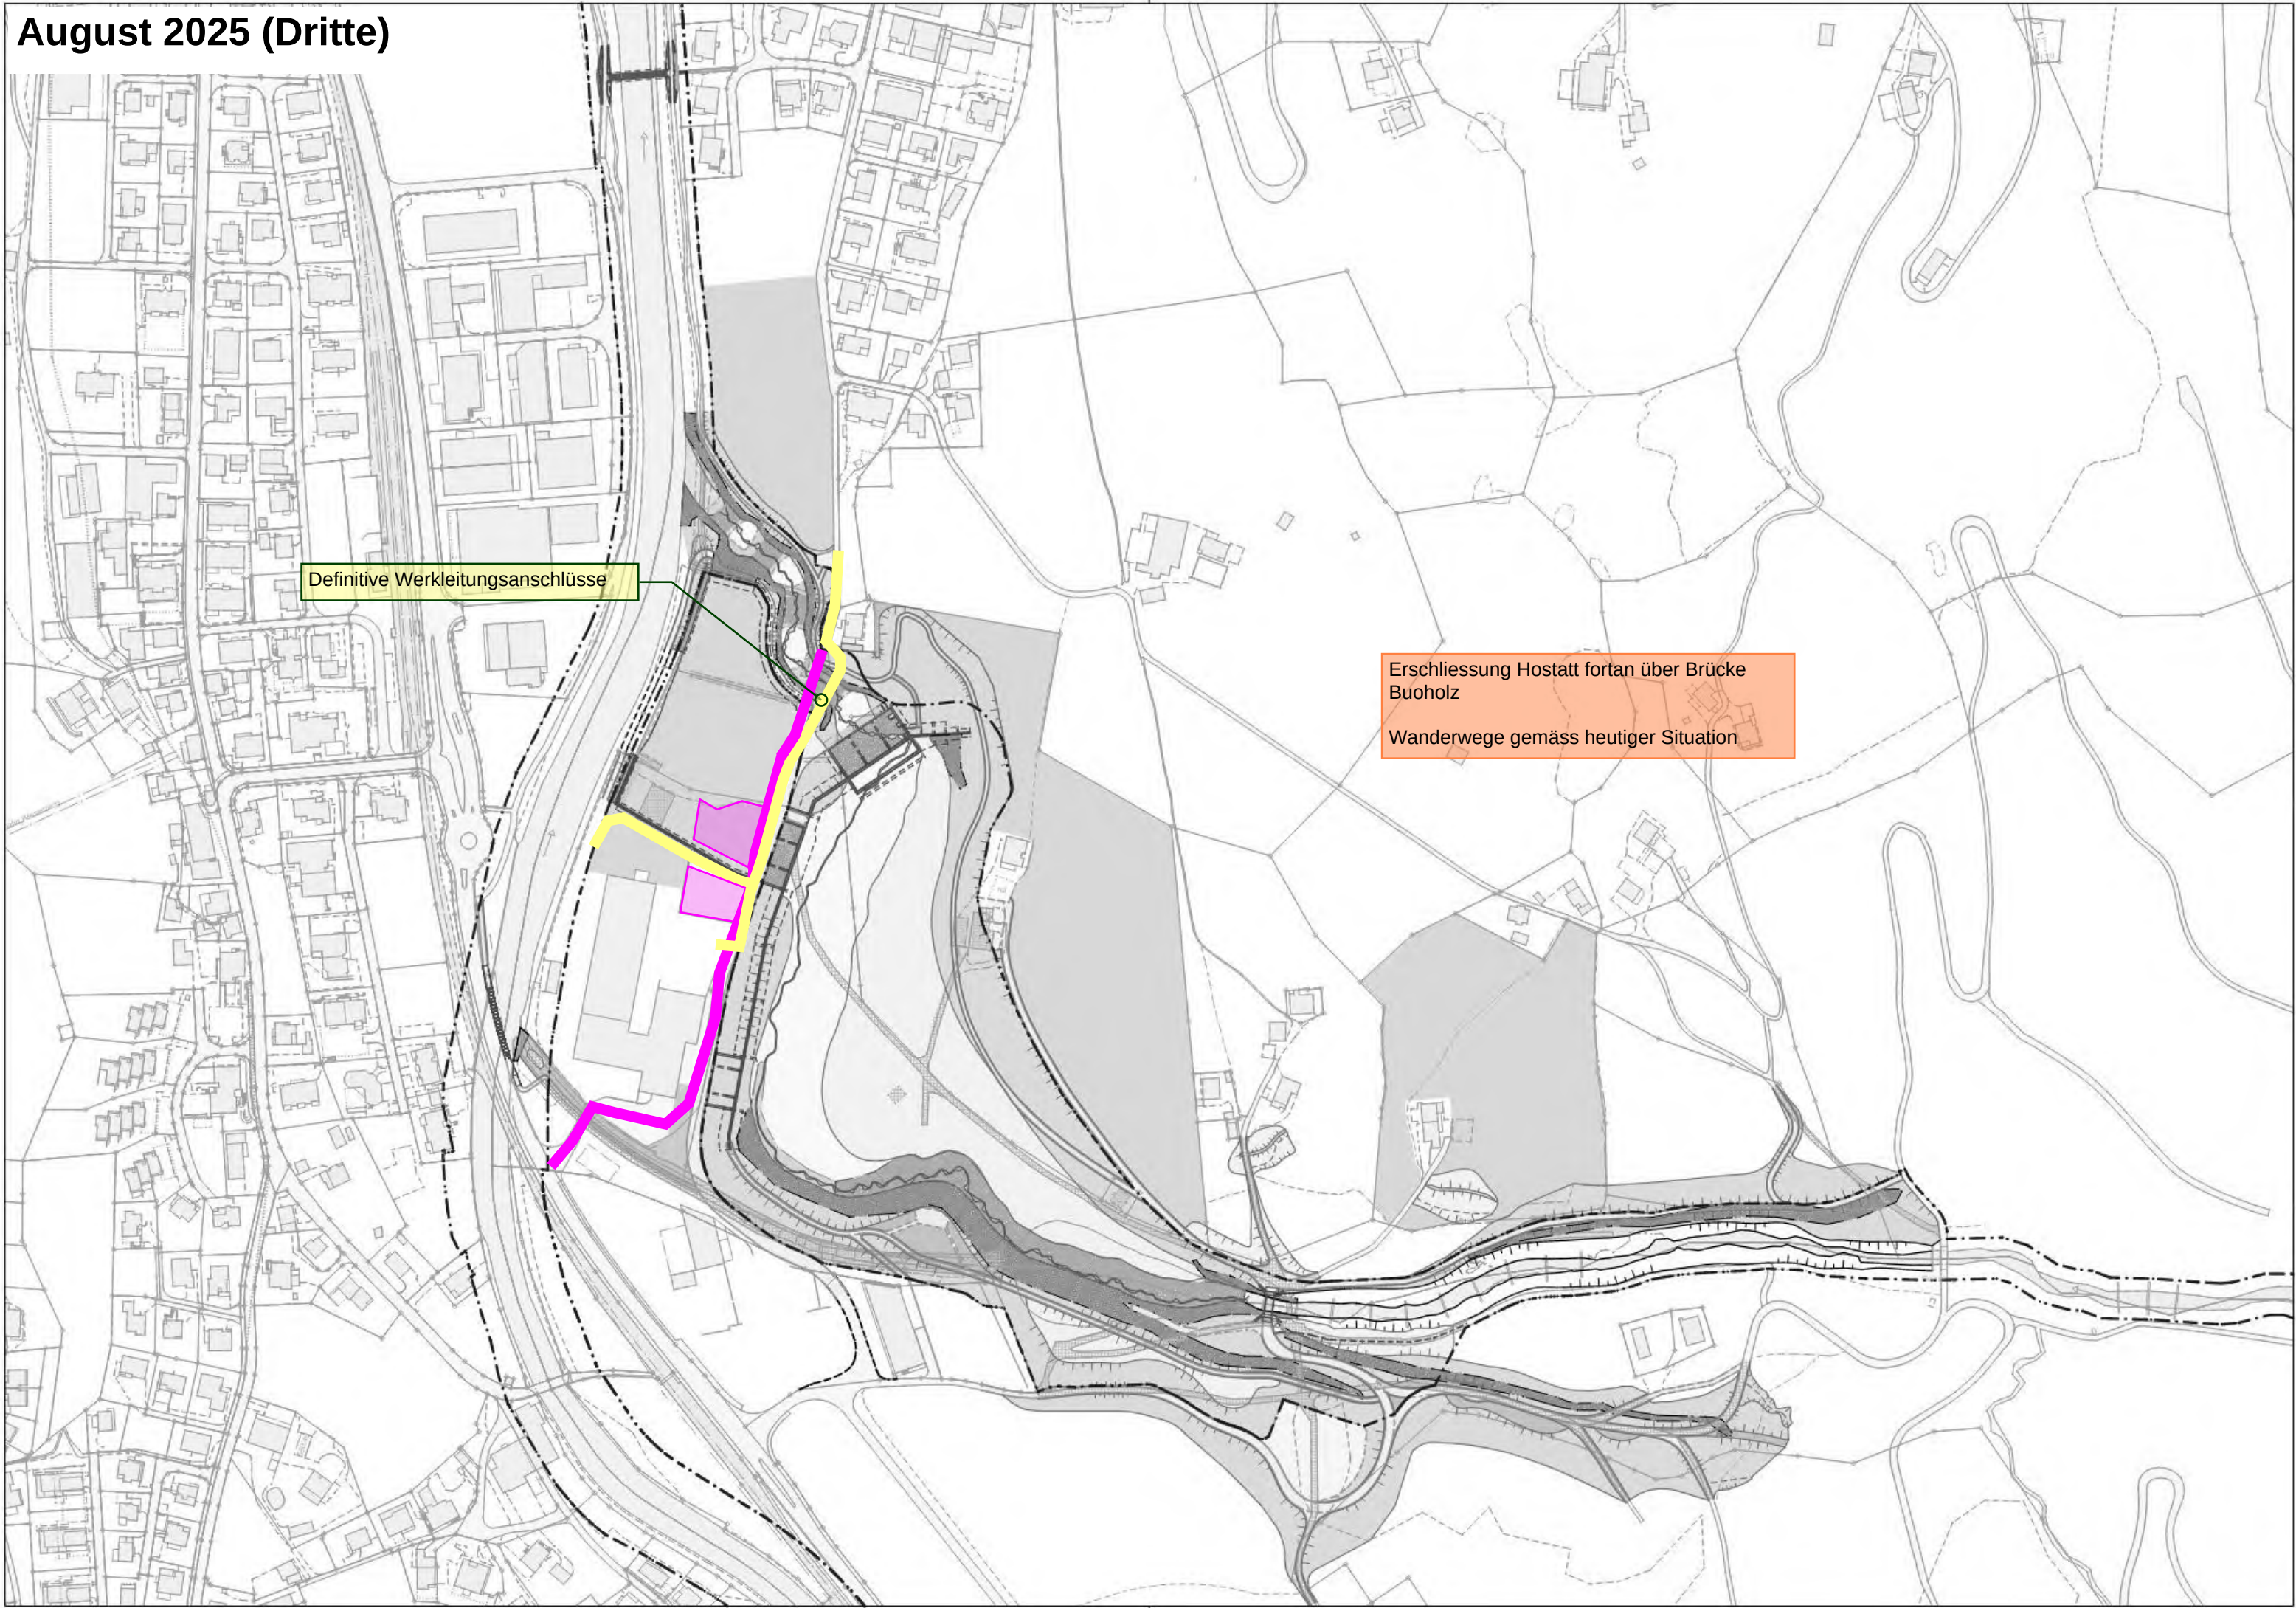


Definitive Werkleitungsanschlüsse


Erschliessung Hostatt fortan über Brücke
Buoholz
Wanderwege gemäss heutiger Situation


September - November 2025 (1. Gruppe)

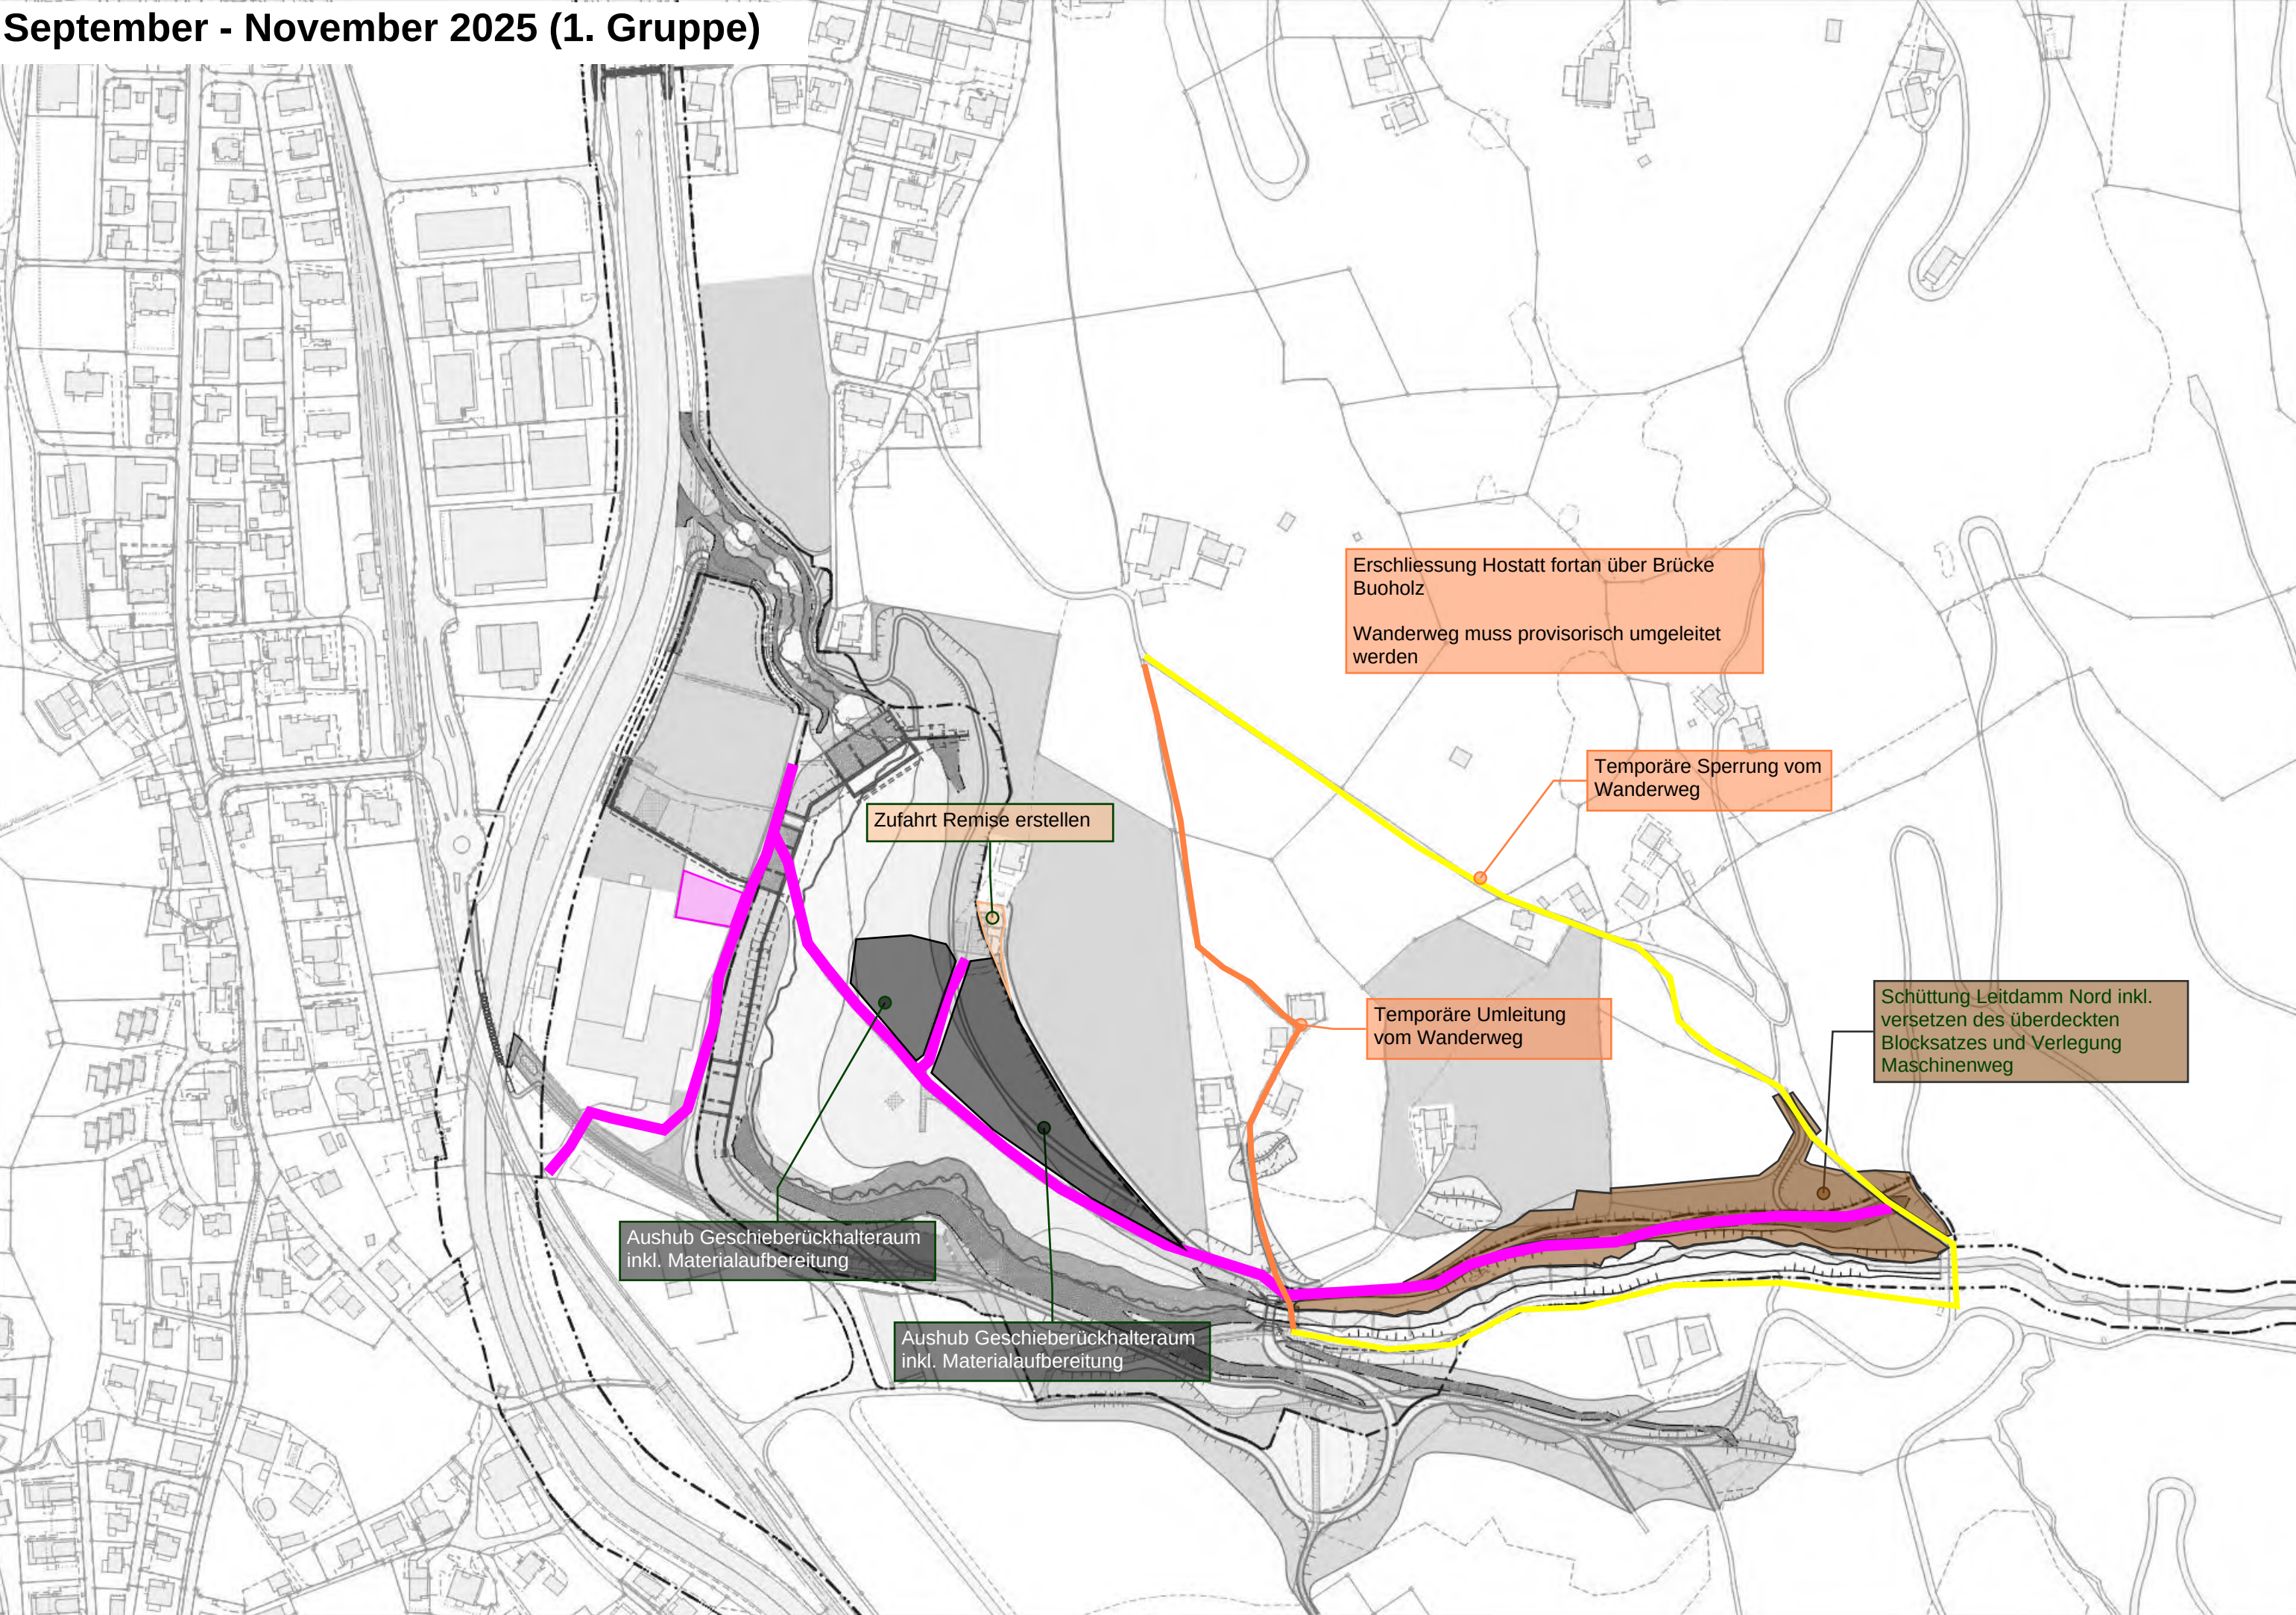


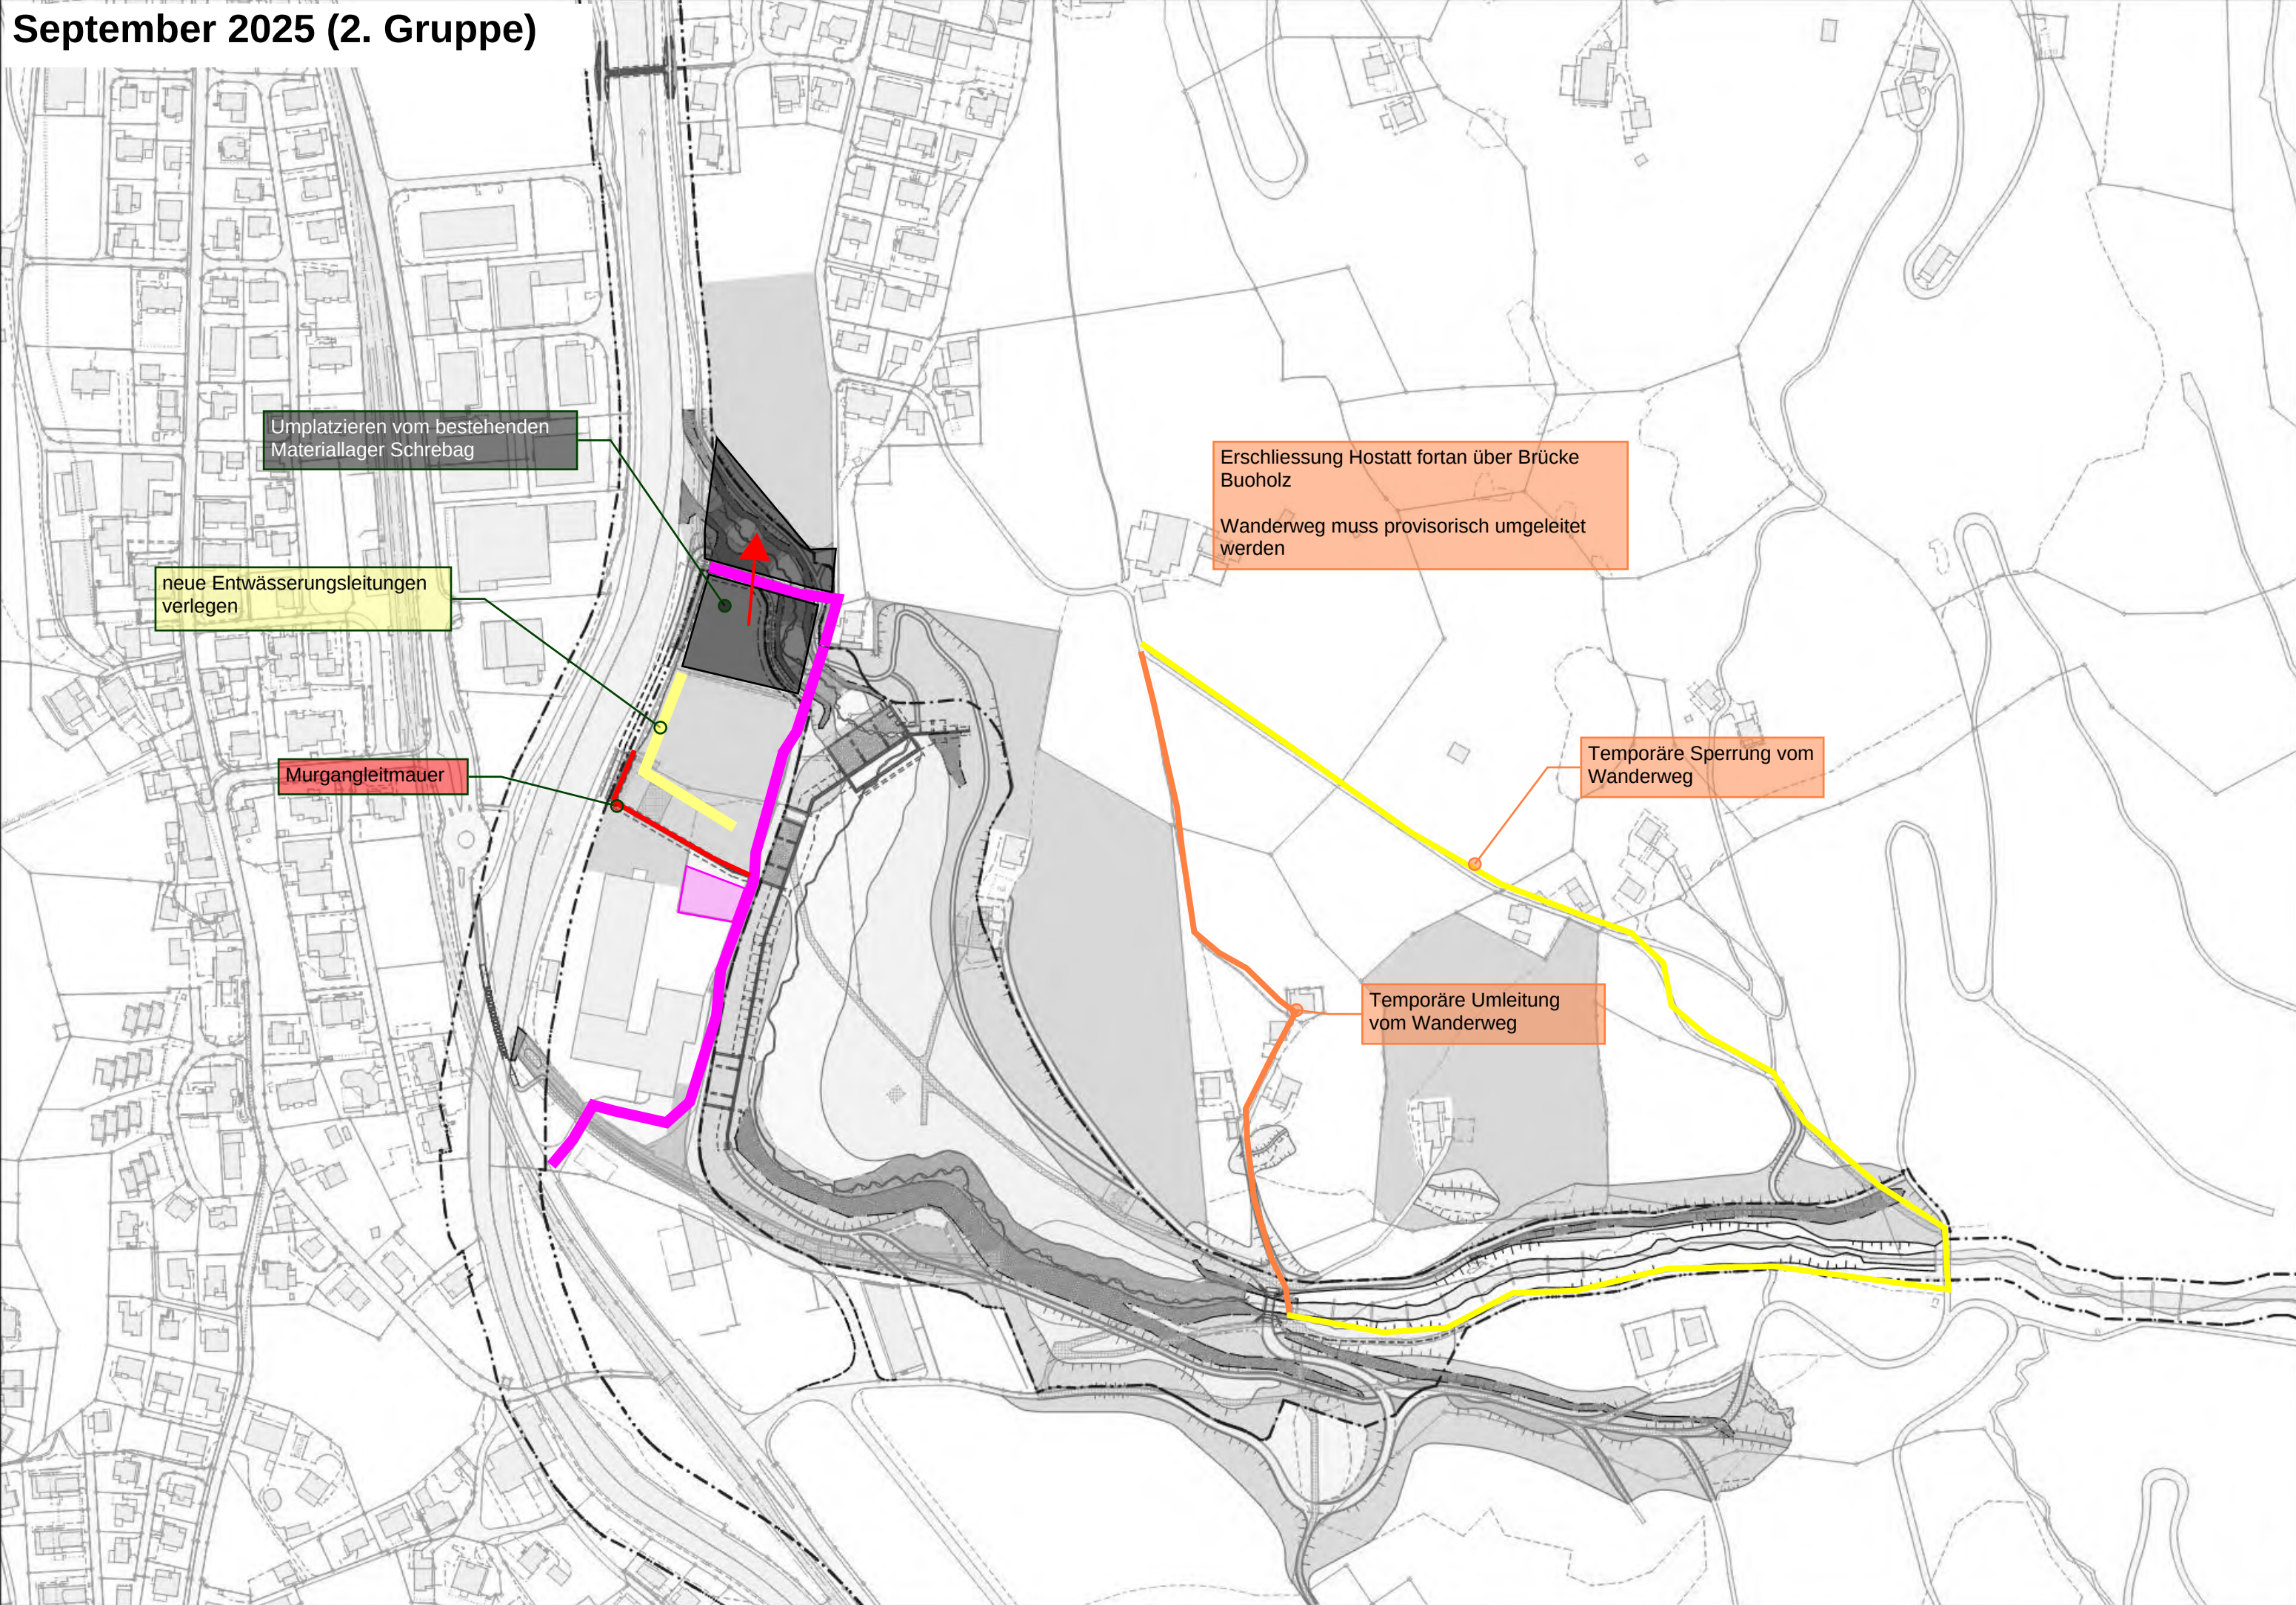

September 2025 (Belagsgruppe)

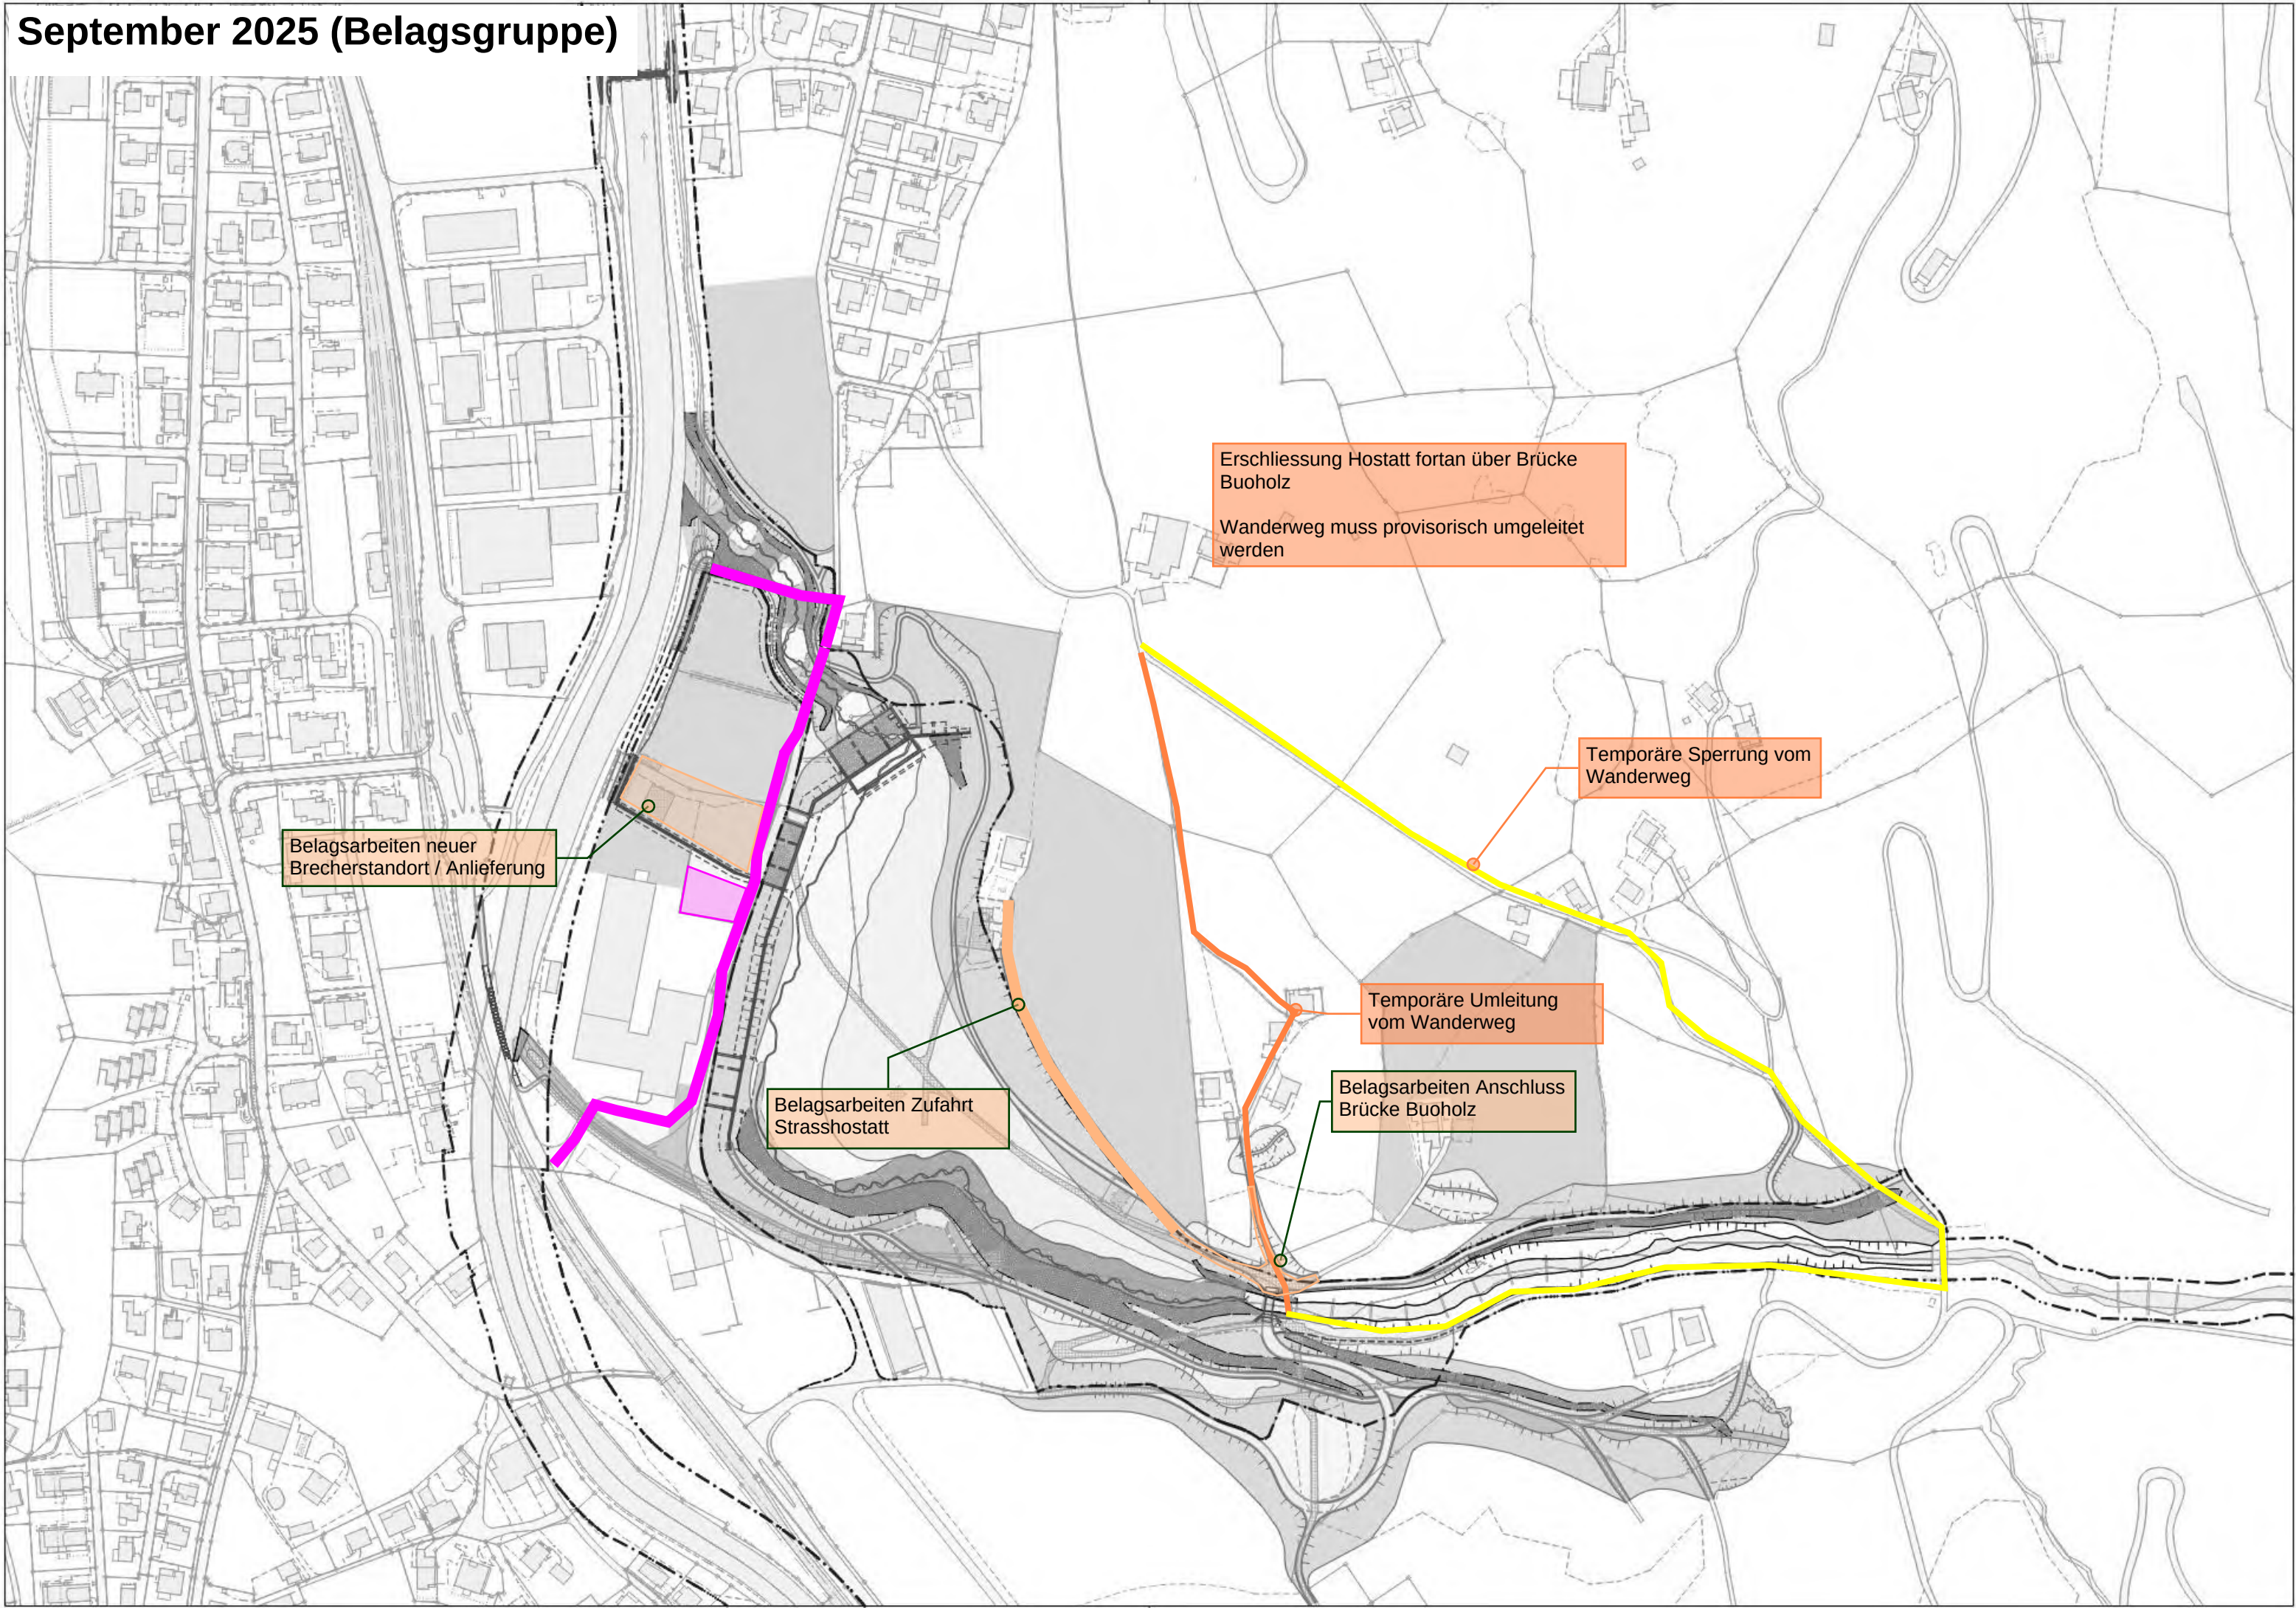

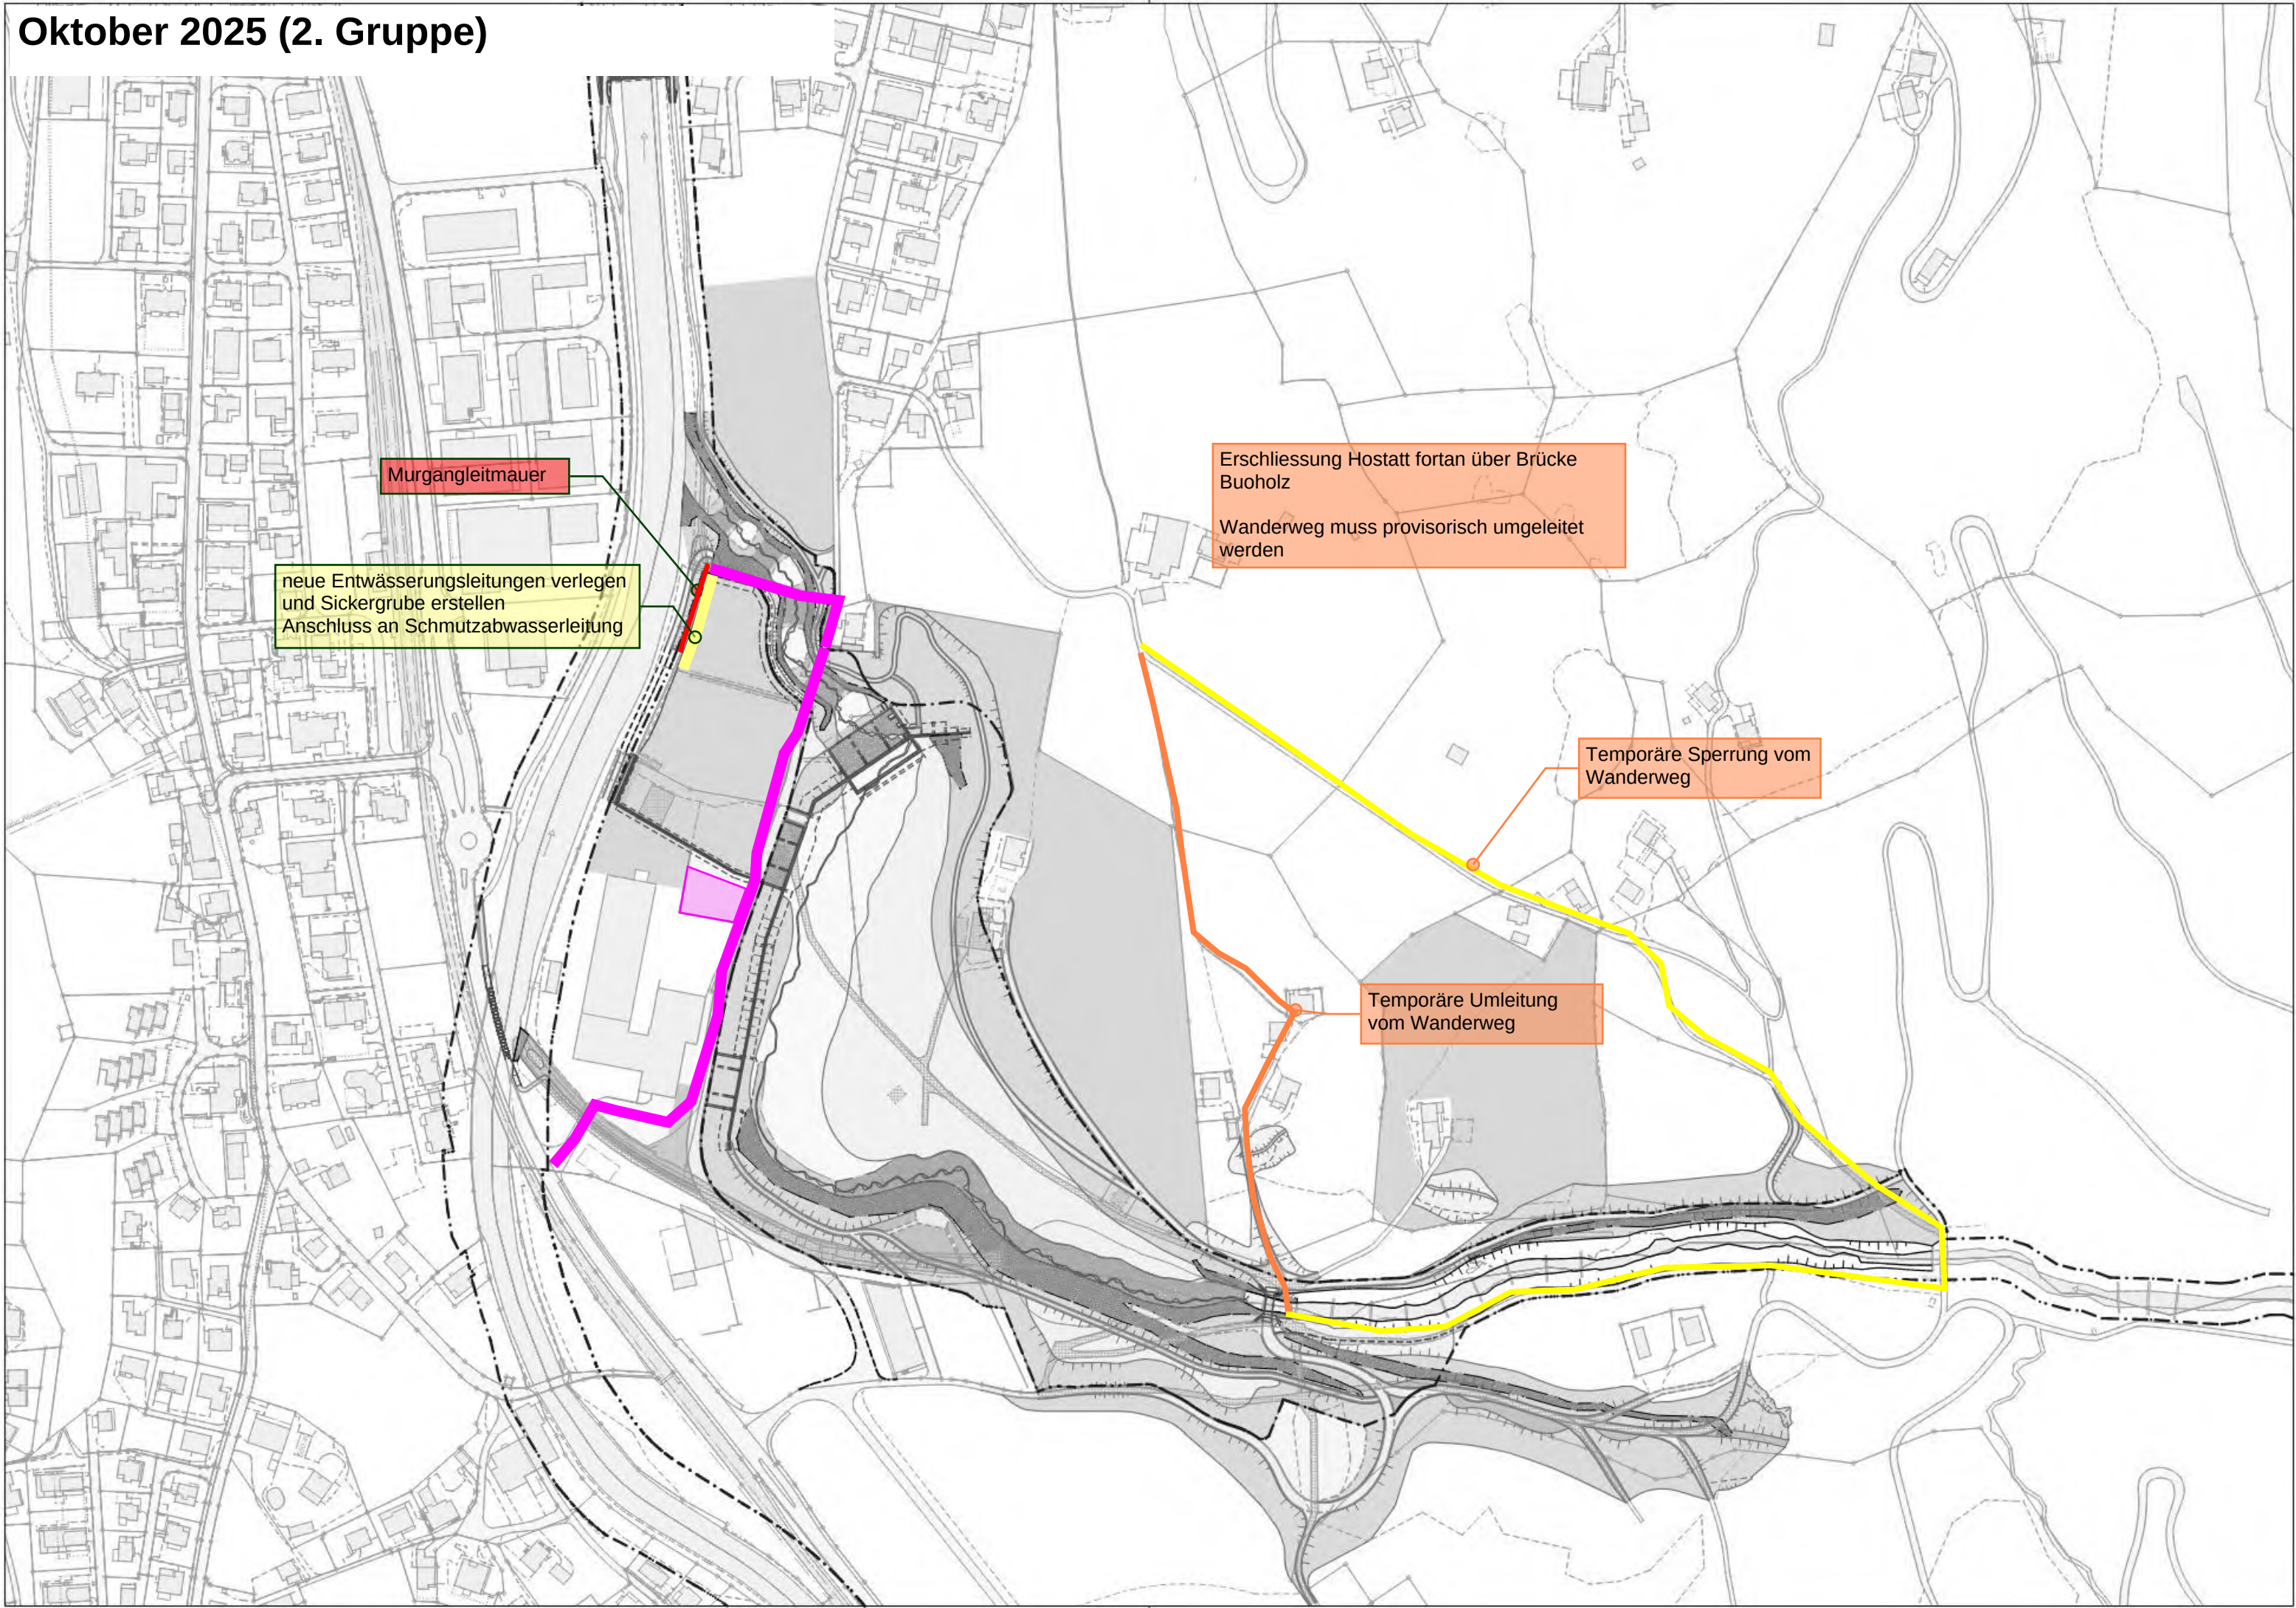

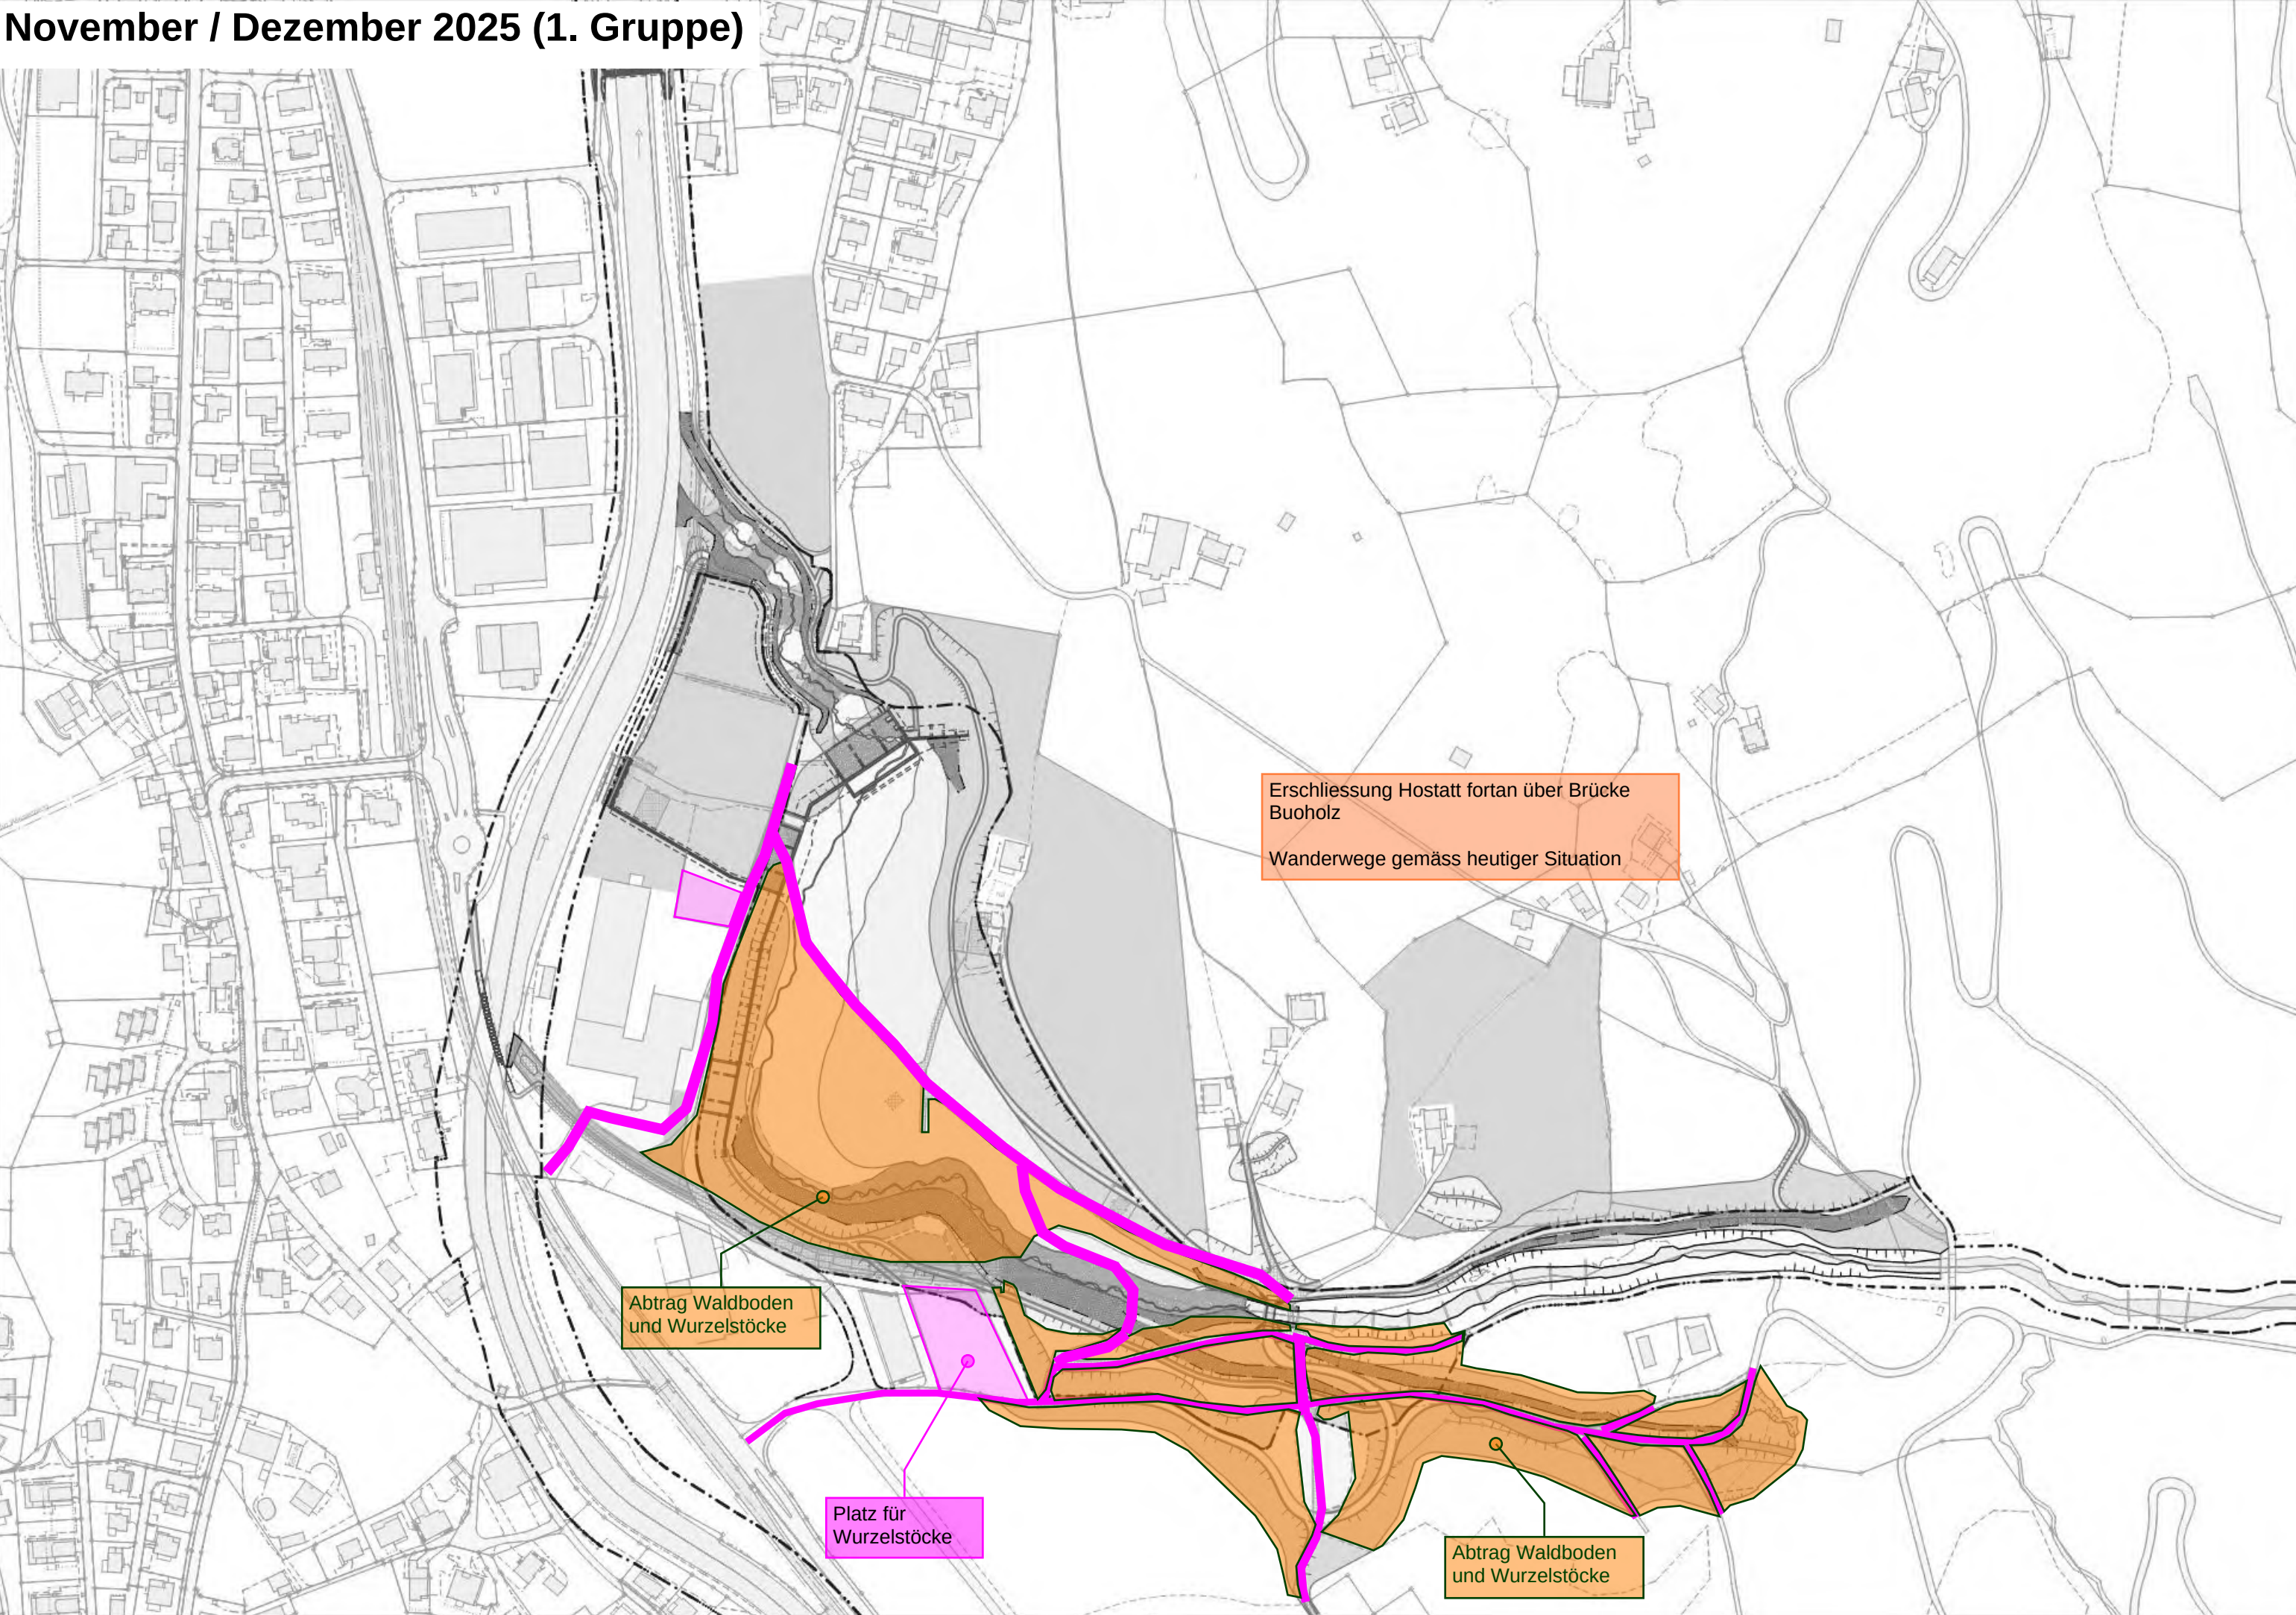

Erschliessung Hostatt fortan über Brücke
Buoholz


Wanderwege gemäss heutiger Situation

Abtrag Waldboden
und Wurzelstöcke

Platz für
Wurzelstöcke


Abtrag Waldboden
und Wurzelstöcke


November 2025 (2. Gruppe)

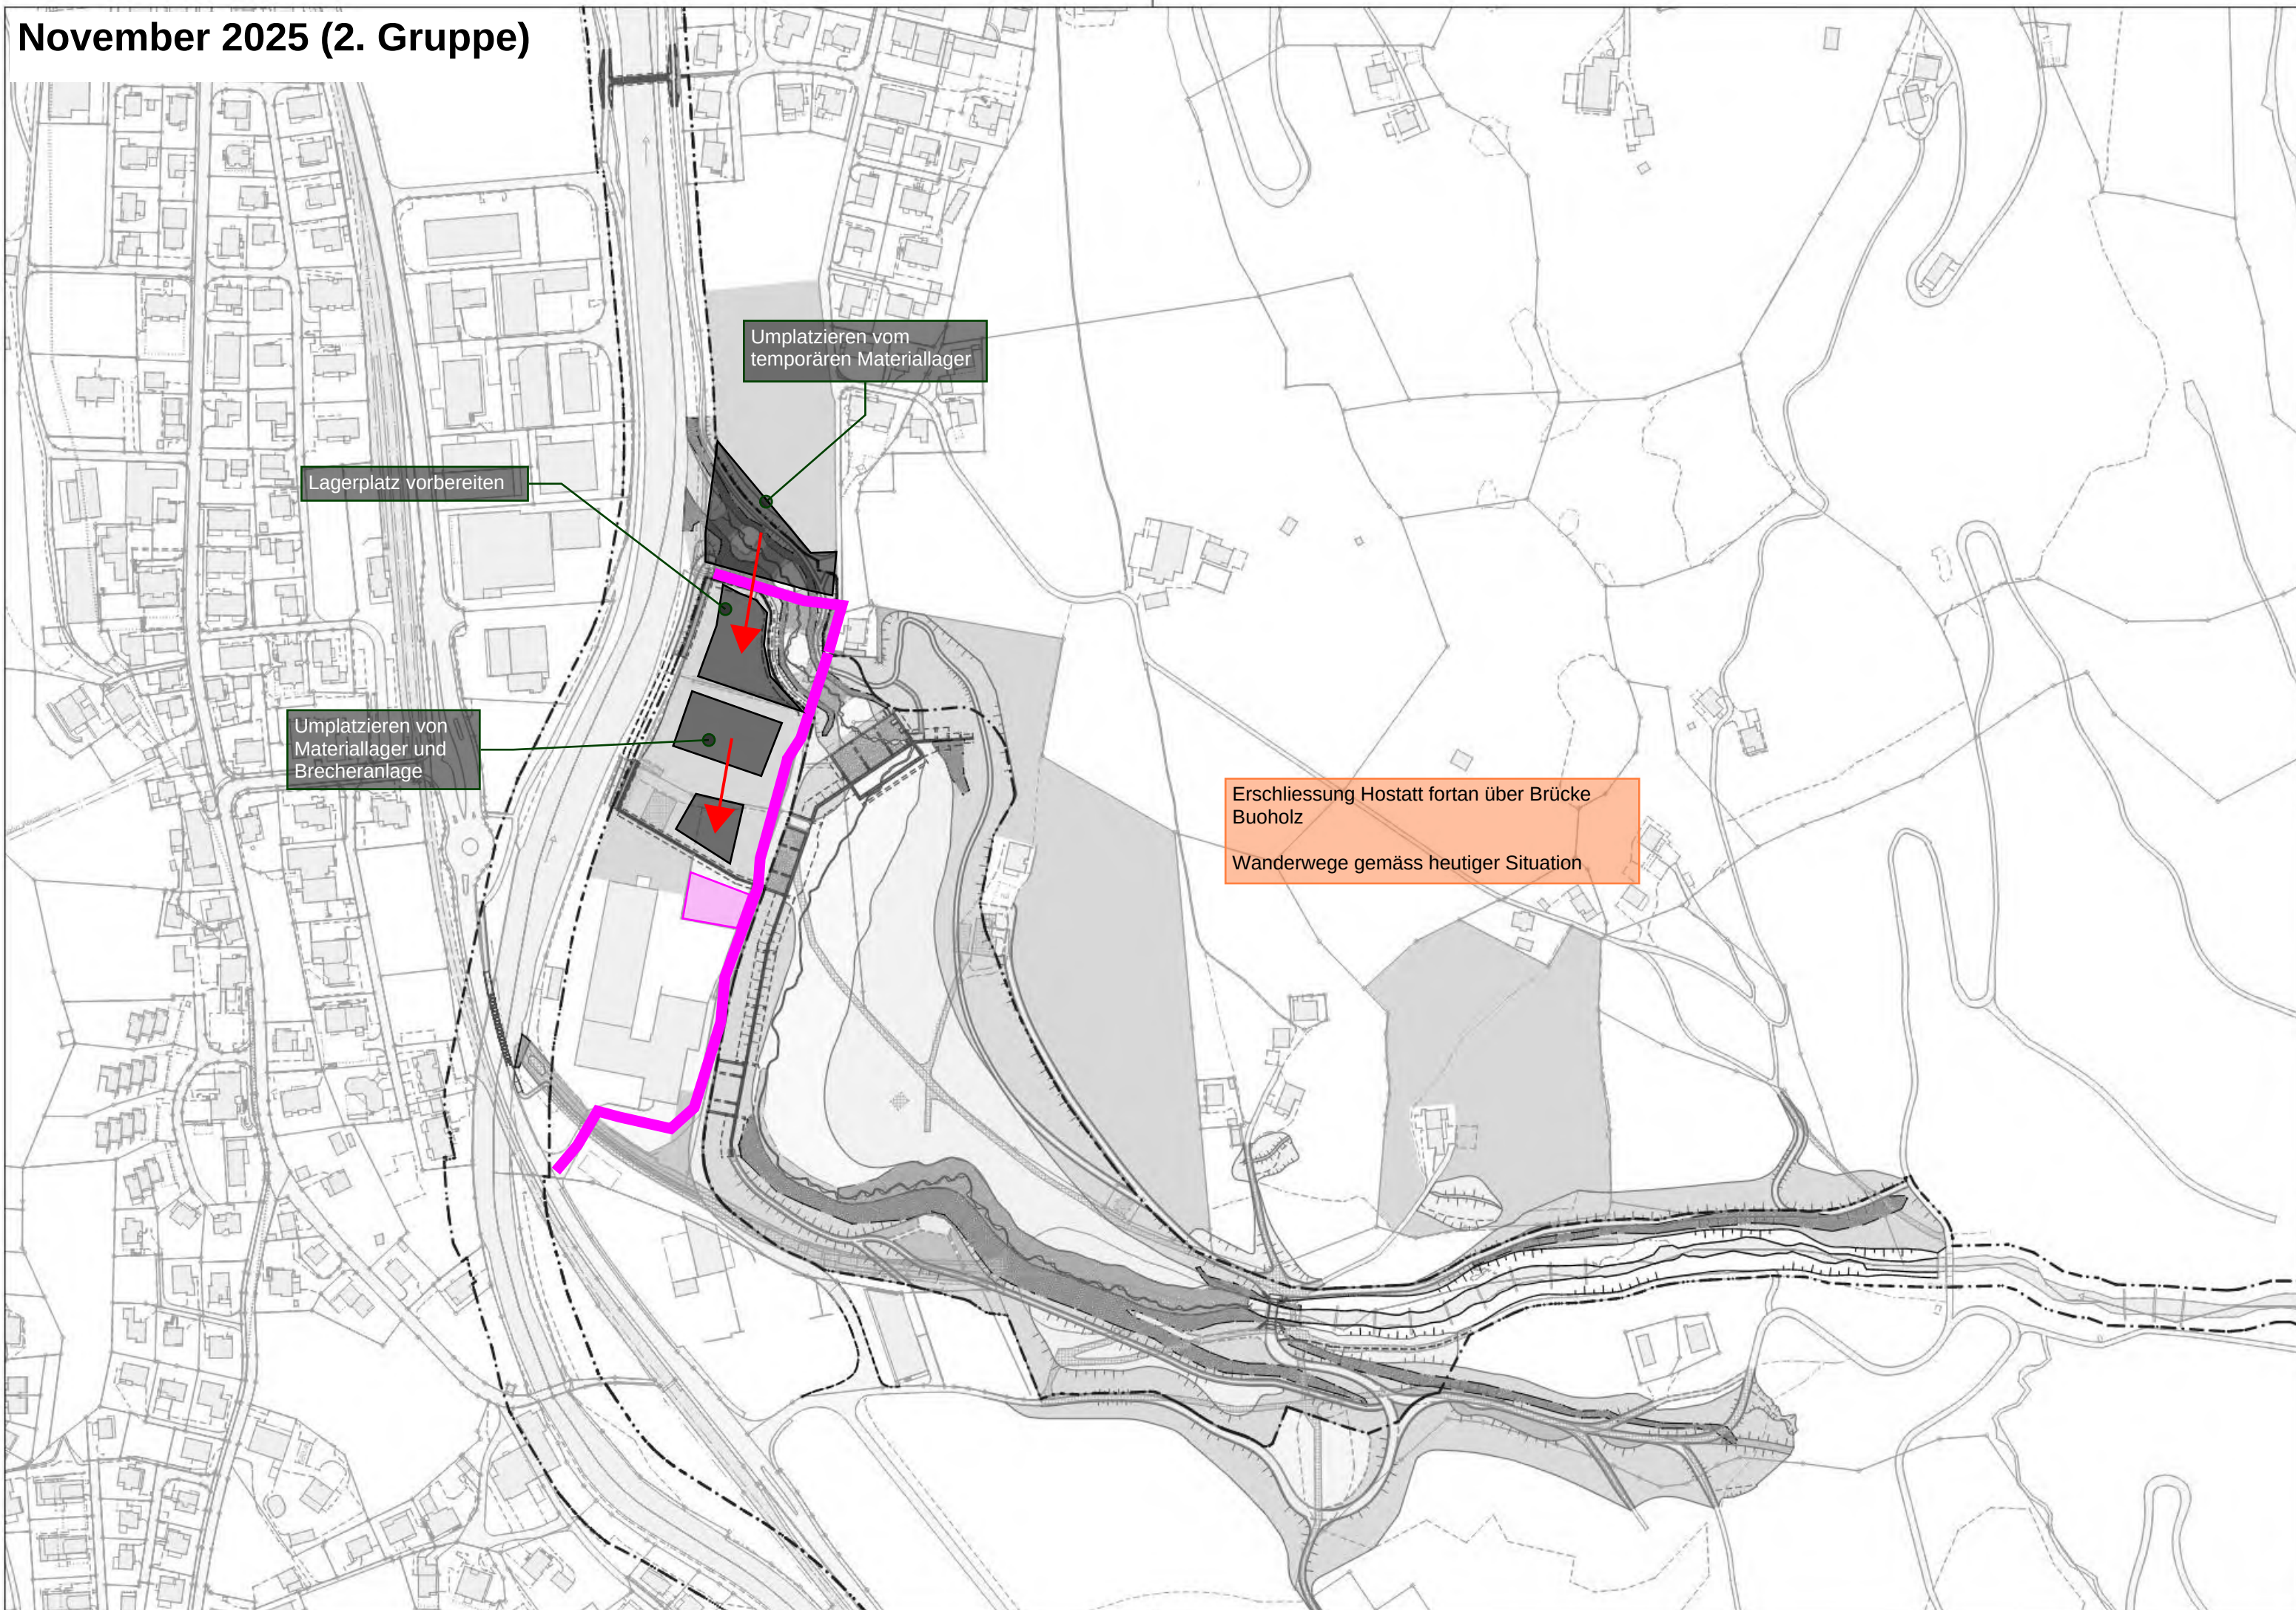


neue Lagerboxen
erstellen

Erschliessung Hostatt fortan über Brücke
Buoholz
Wanderwege gemäss heutiger Situation

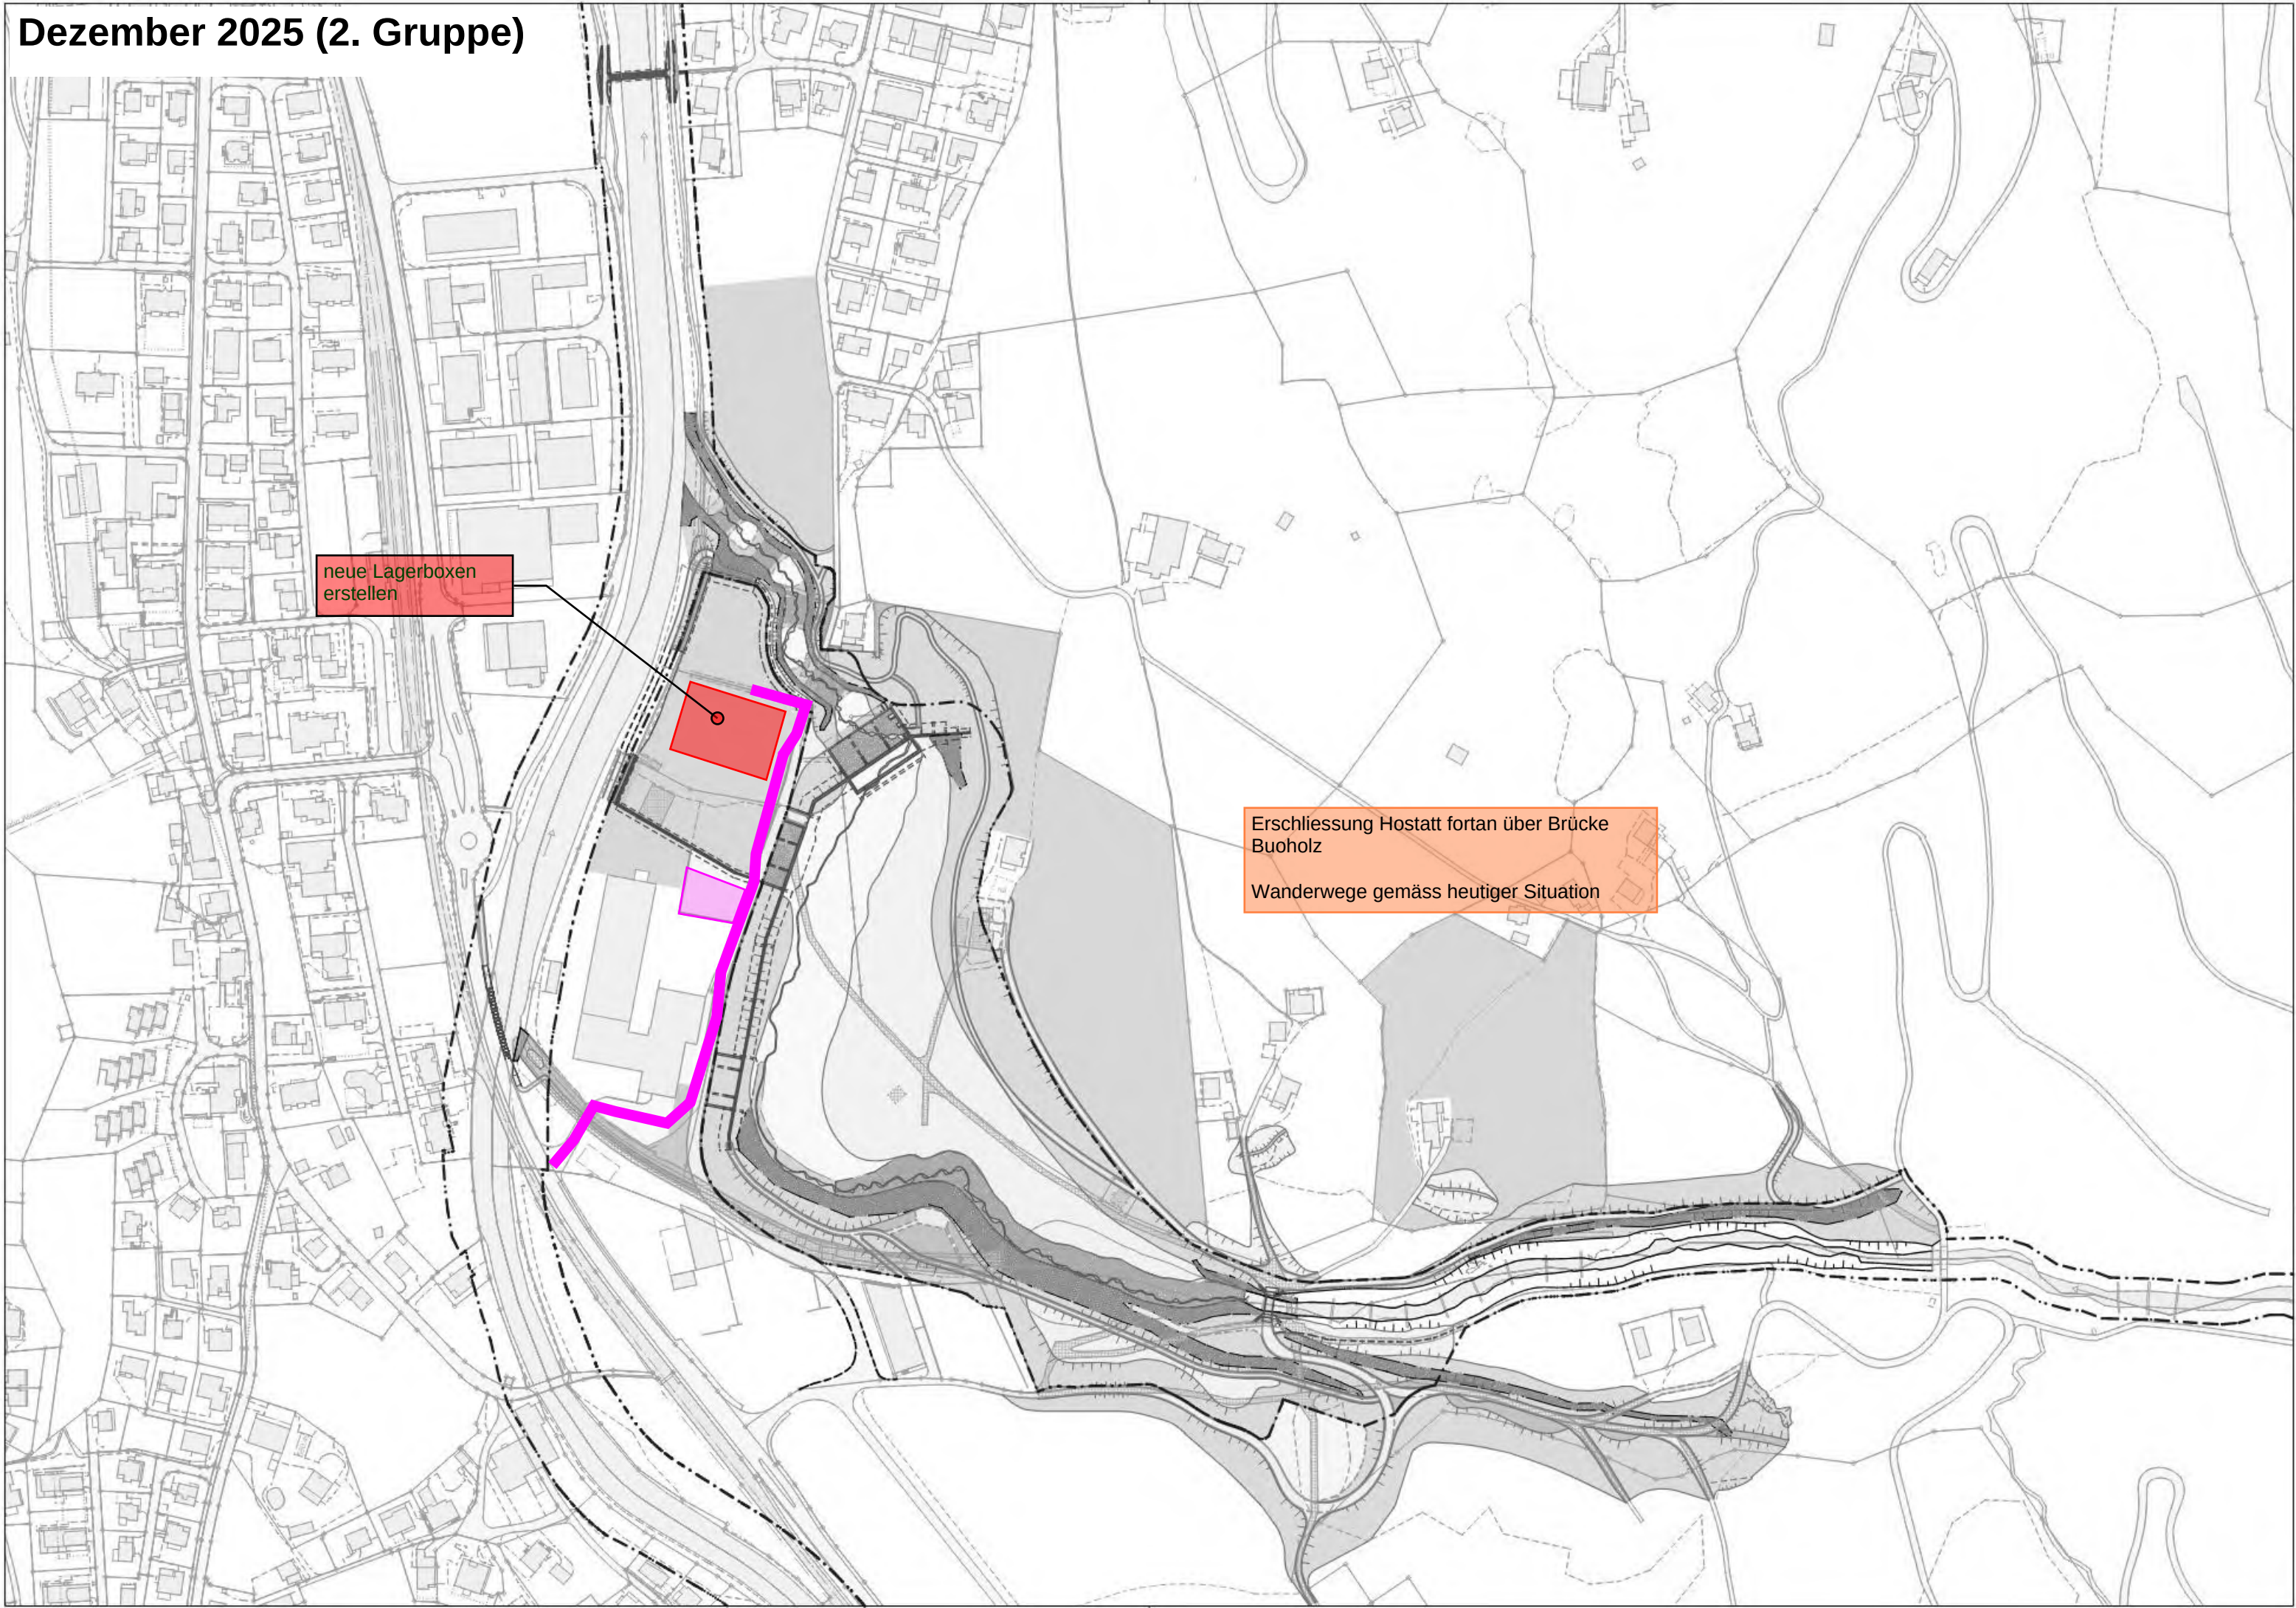


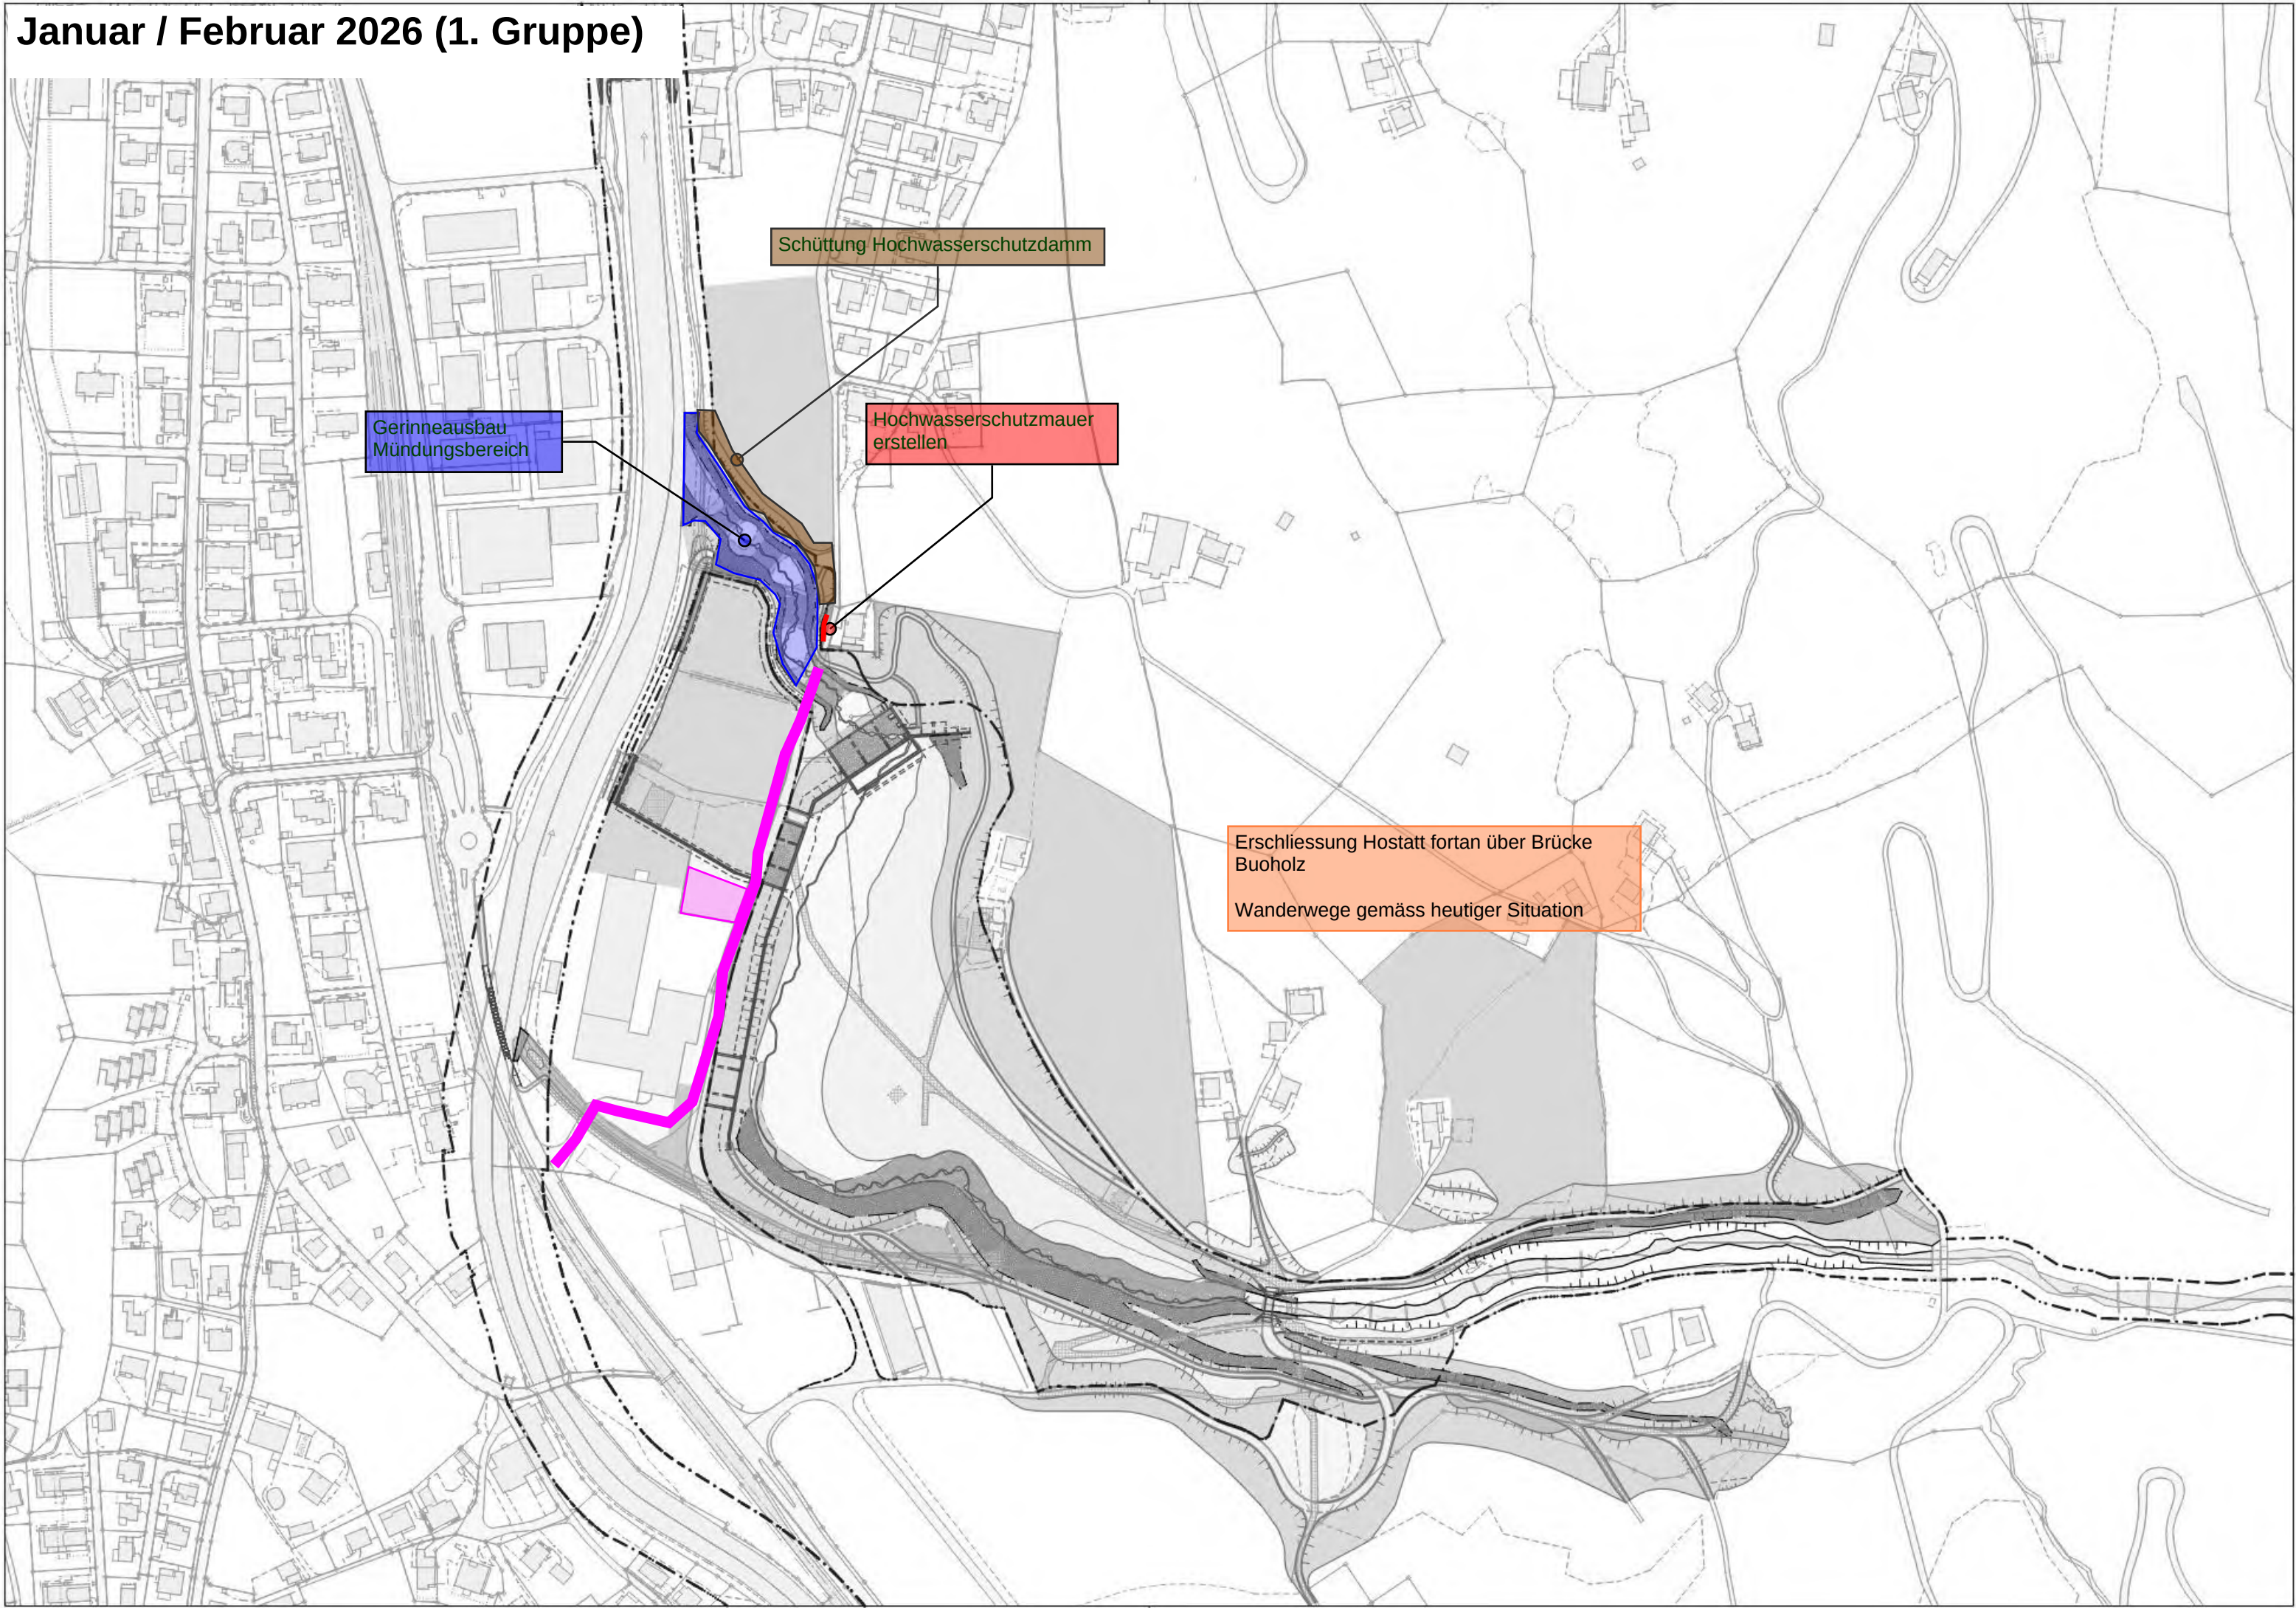


Januar / Februar 2026 (2. Gruppe)

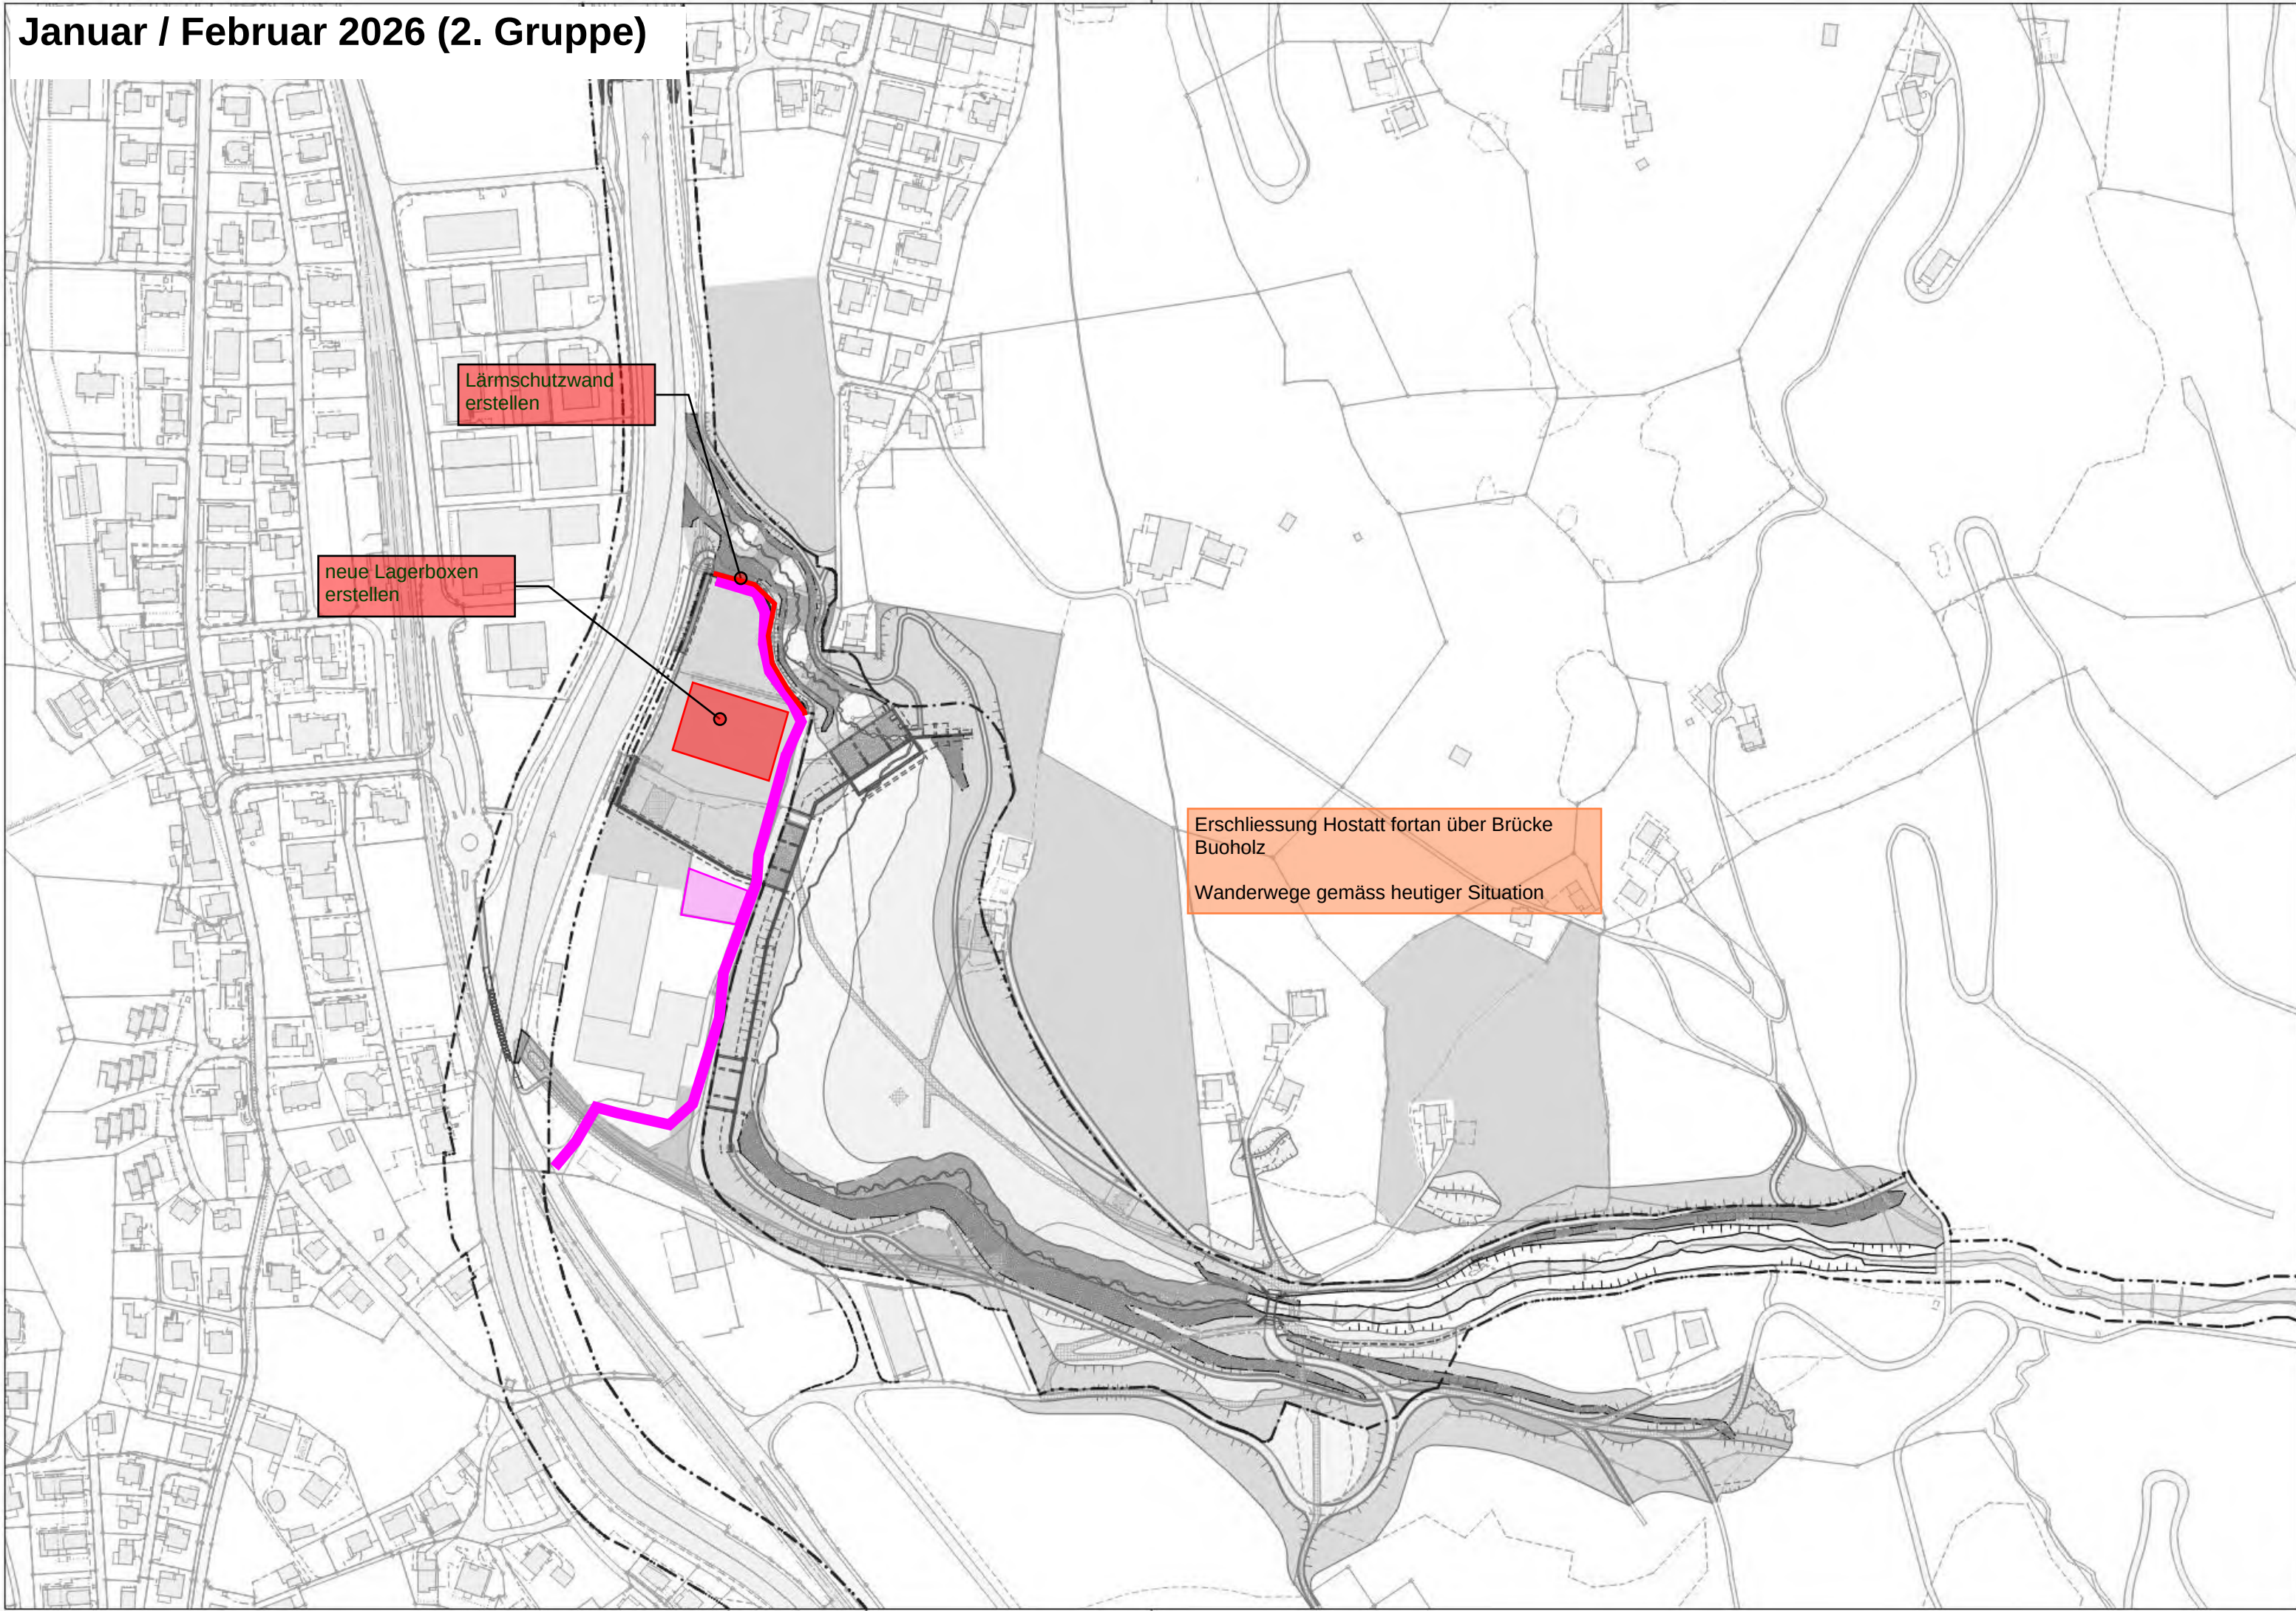

März - Juni 2026 (1. Gruppe)

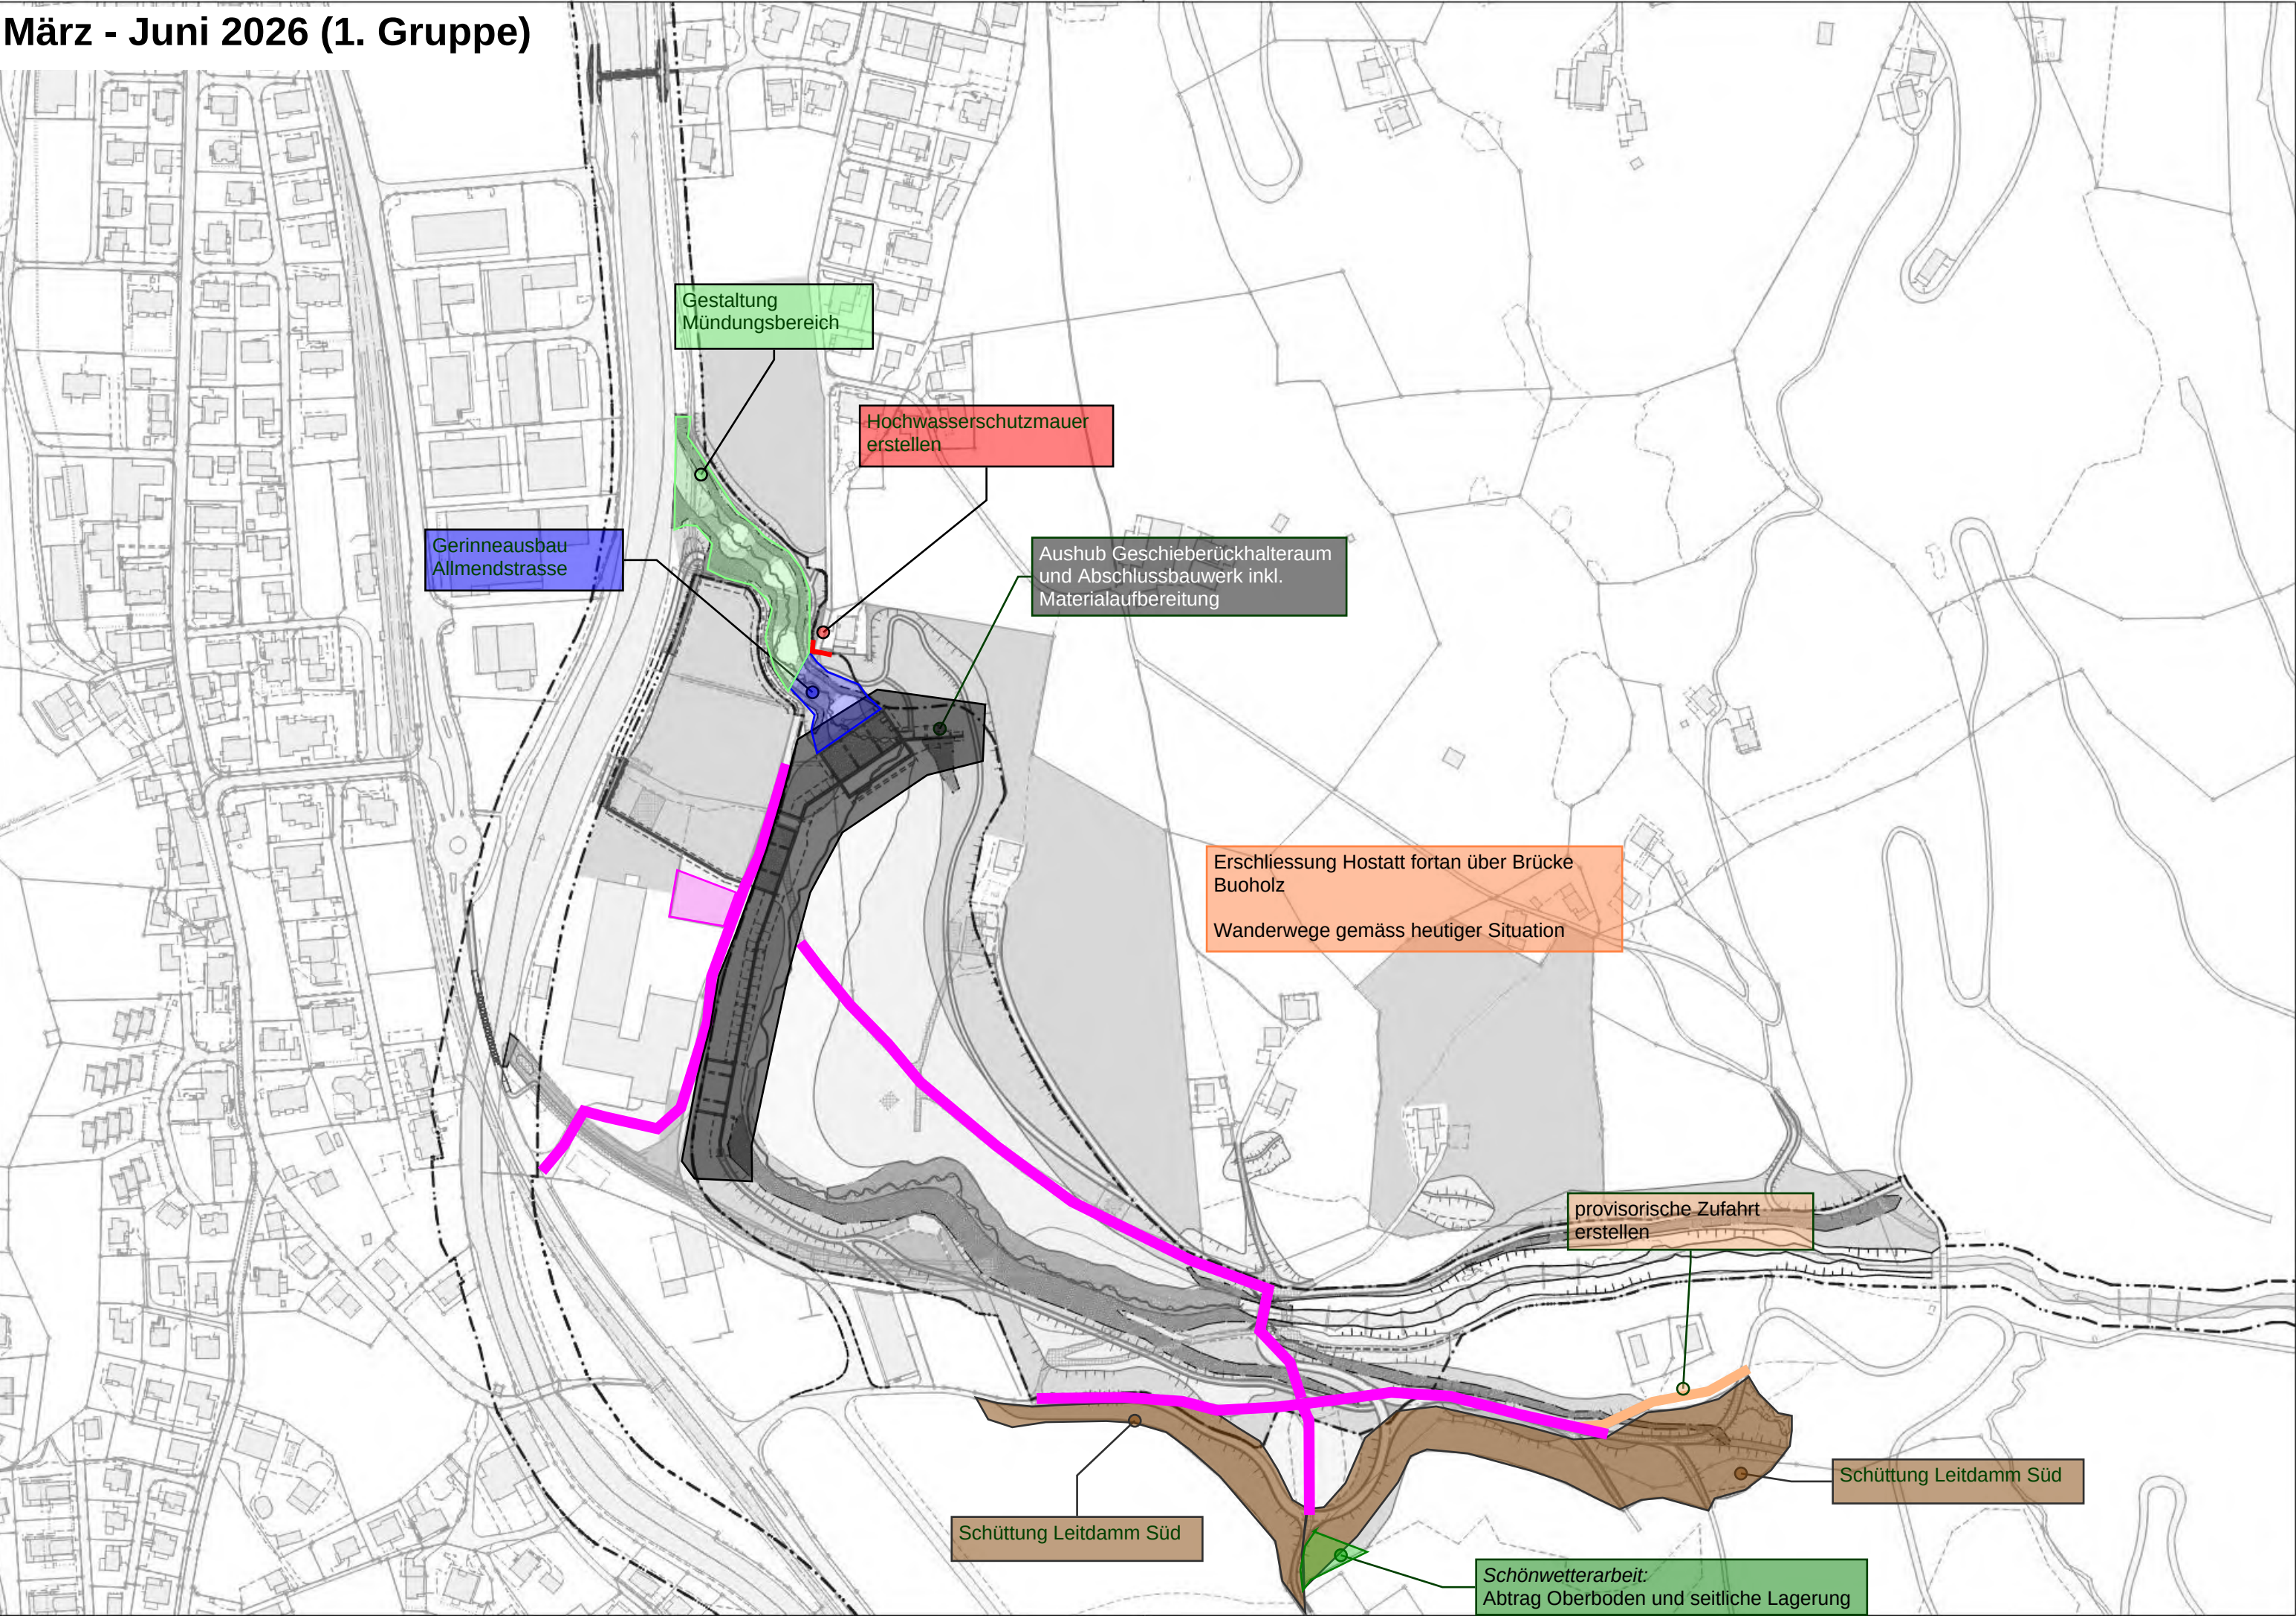


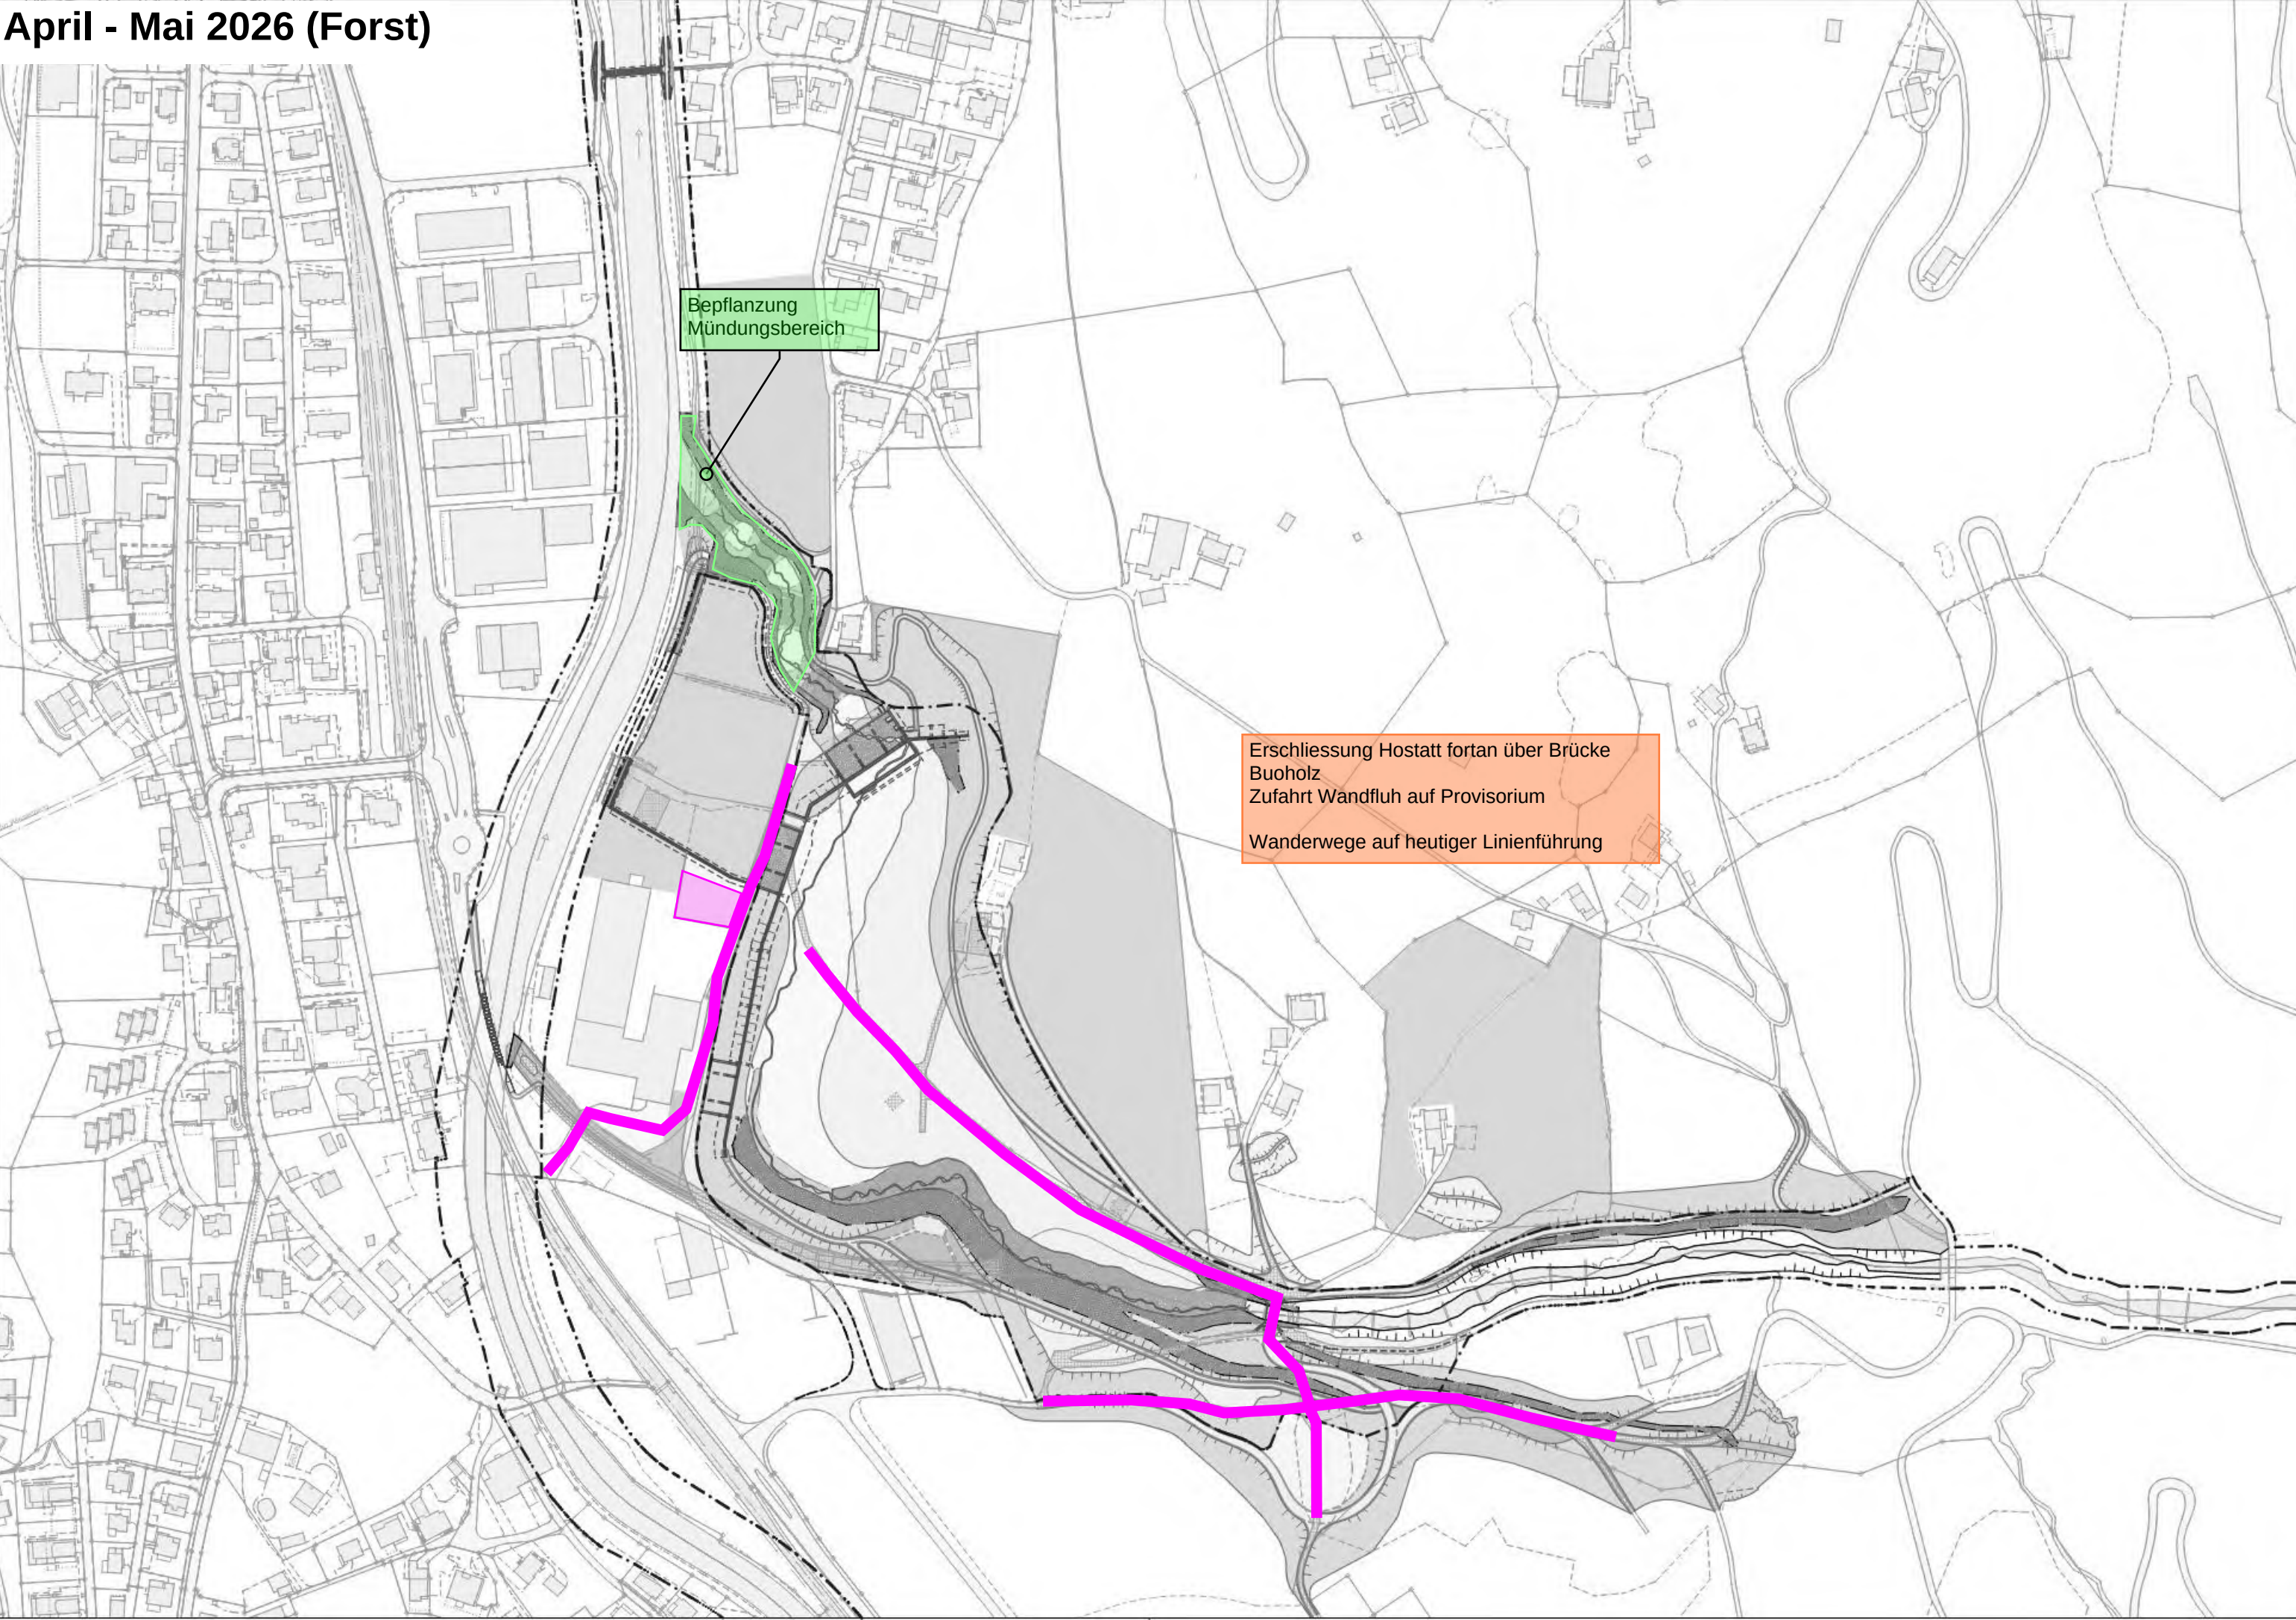


Bepflanzung
Mündungsbereich

Erschliessung Hostatt fortan über Brücke
Buoholz
Zufahrt Wandfluh auf Provisorium
Wanderwege auf heutiger Linienführung


März - Oktober 2026 (2. Gruppe)

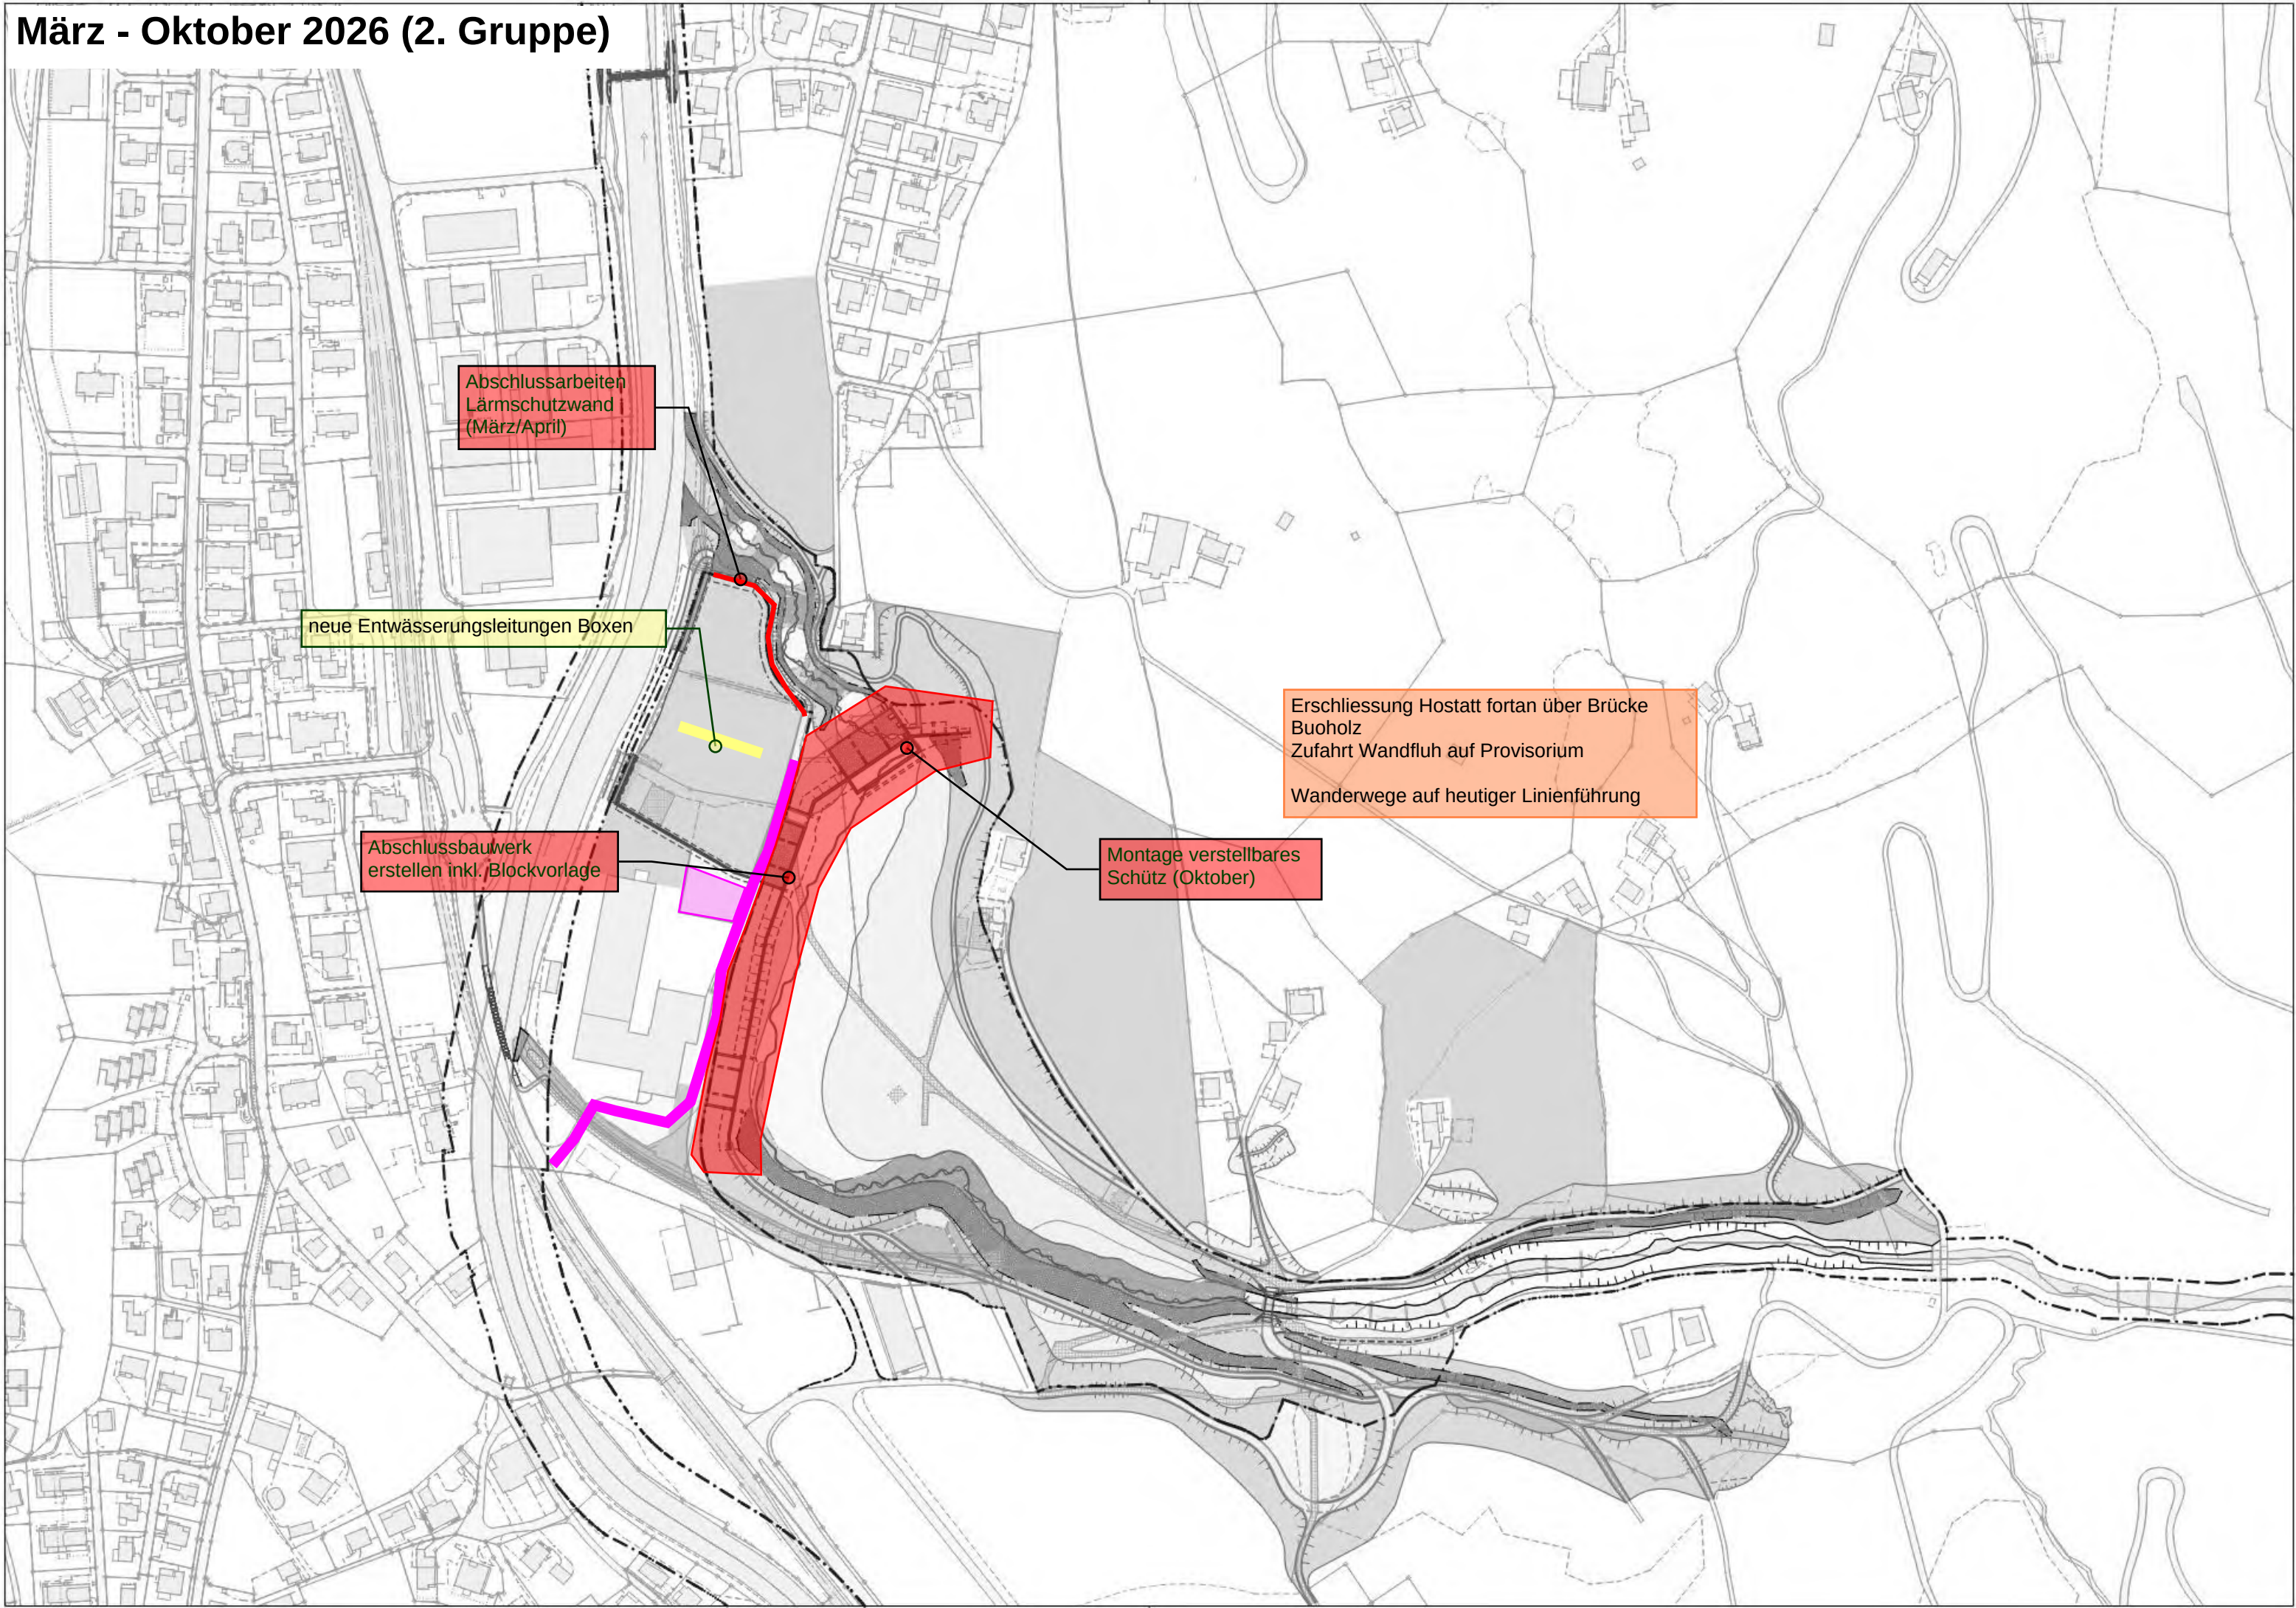


April 2026 (Belagsgruppe)

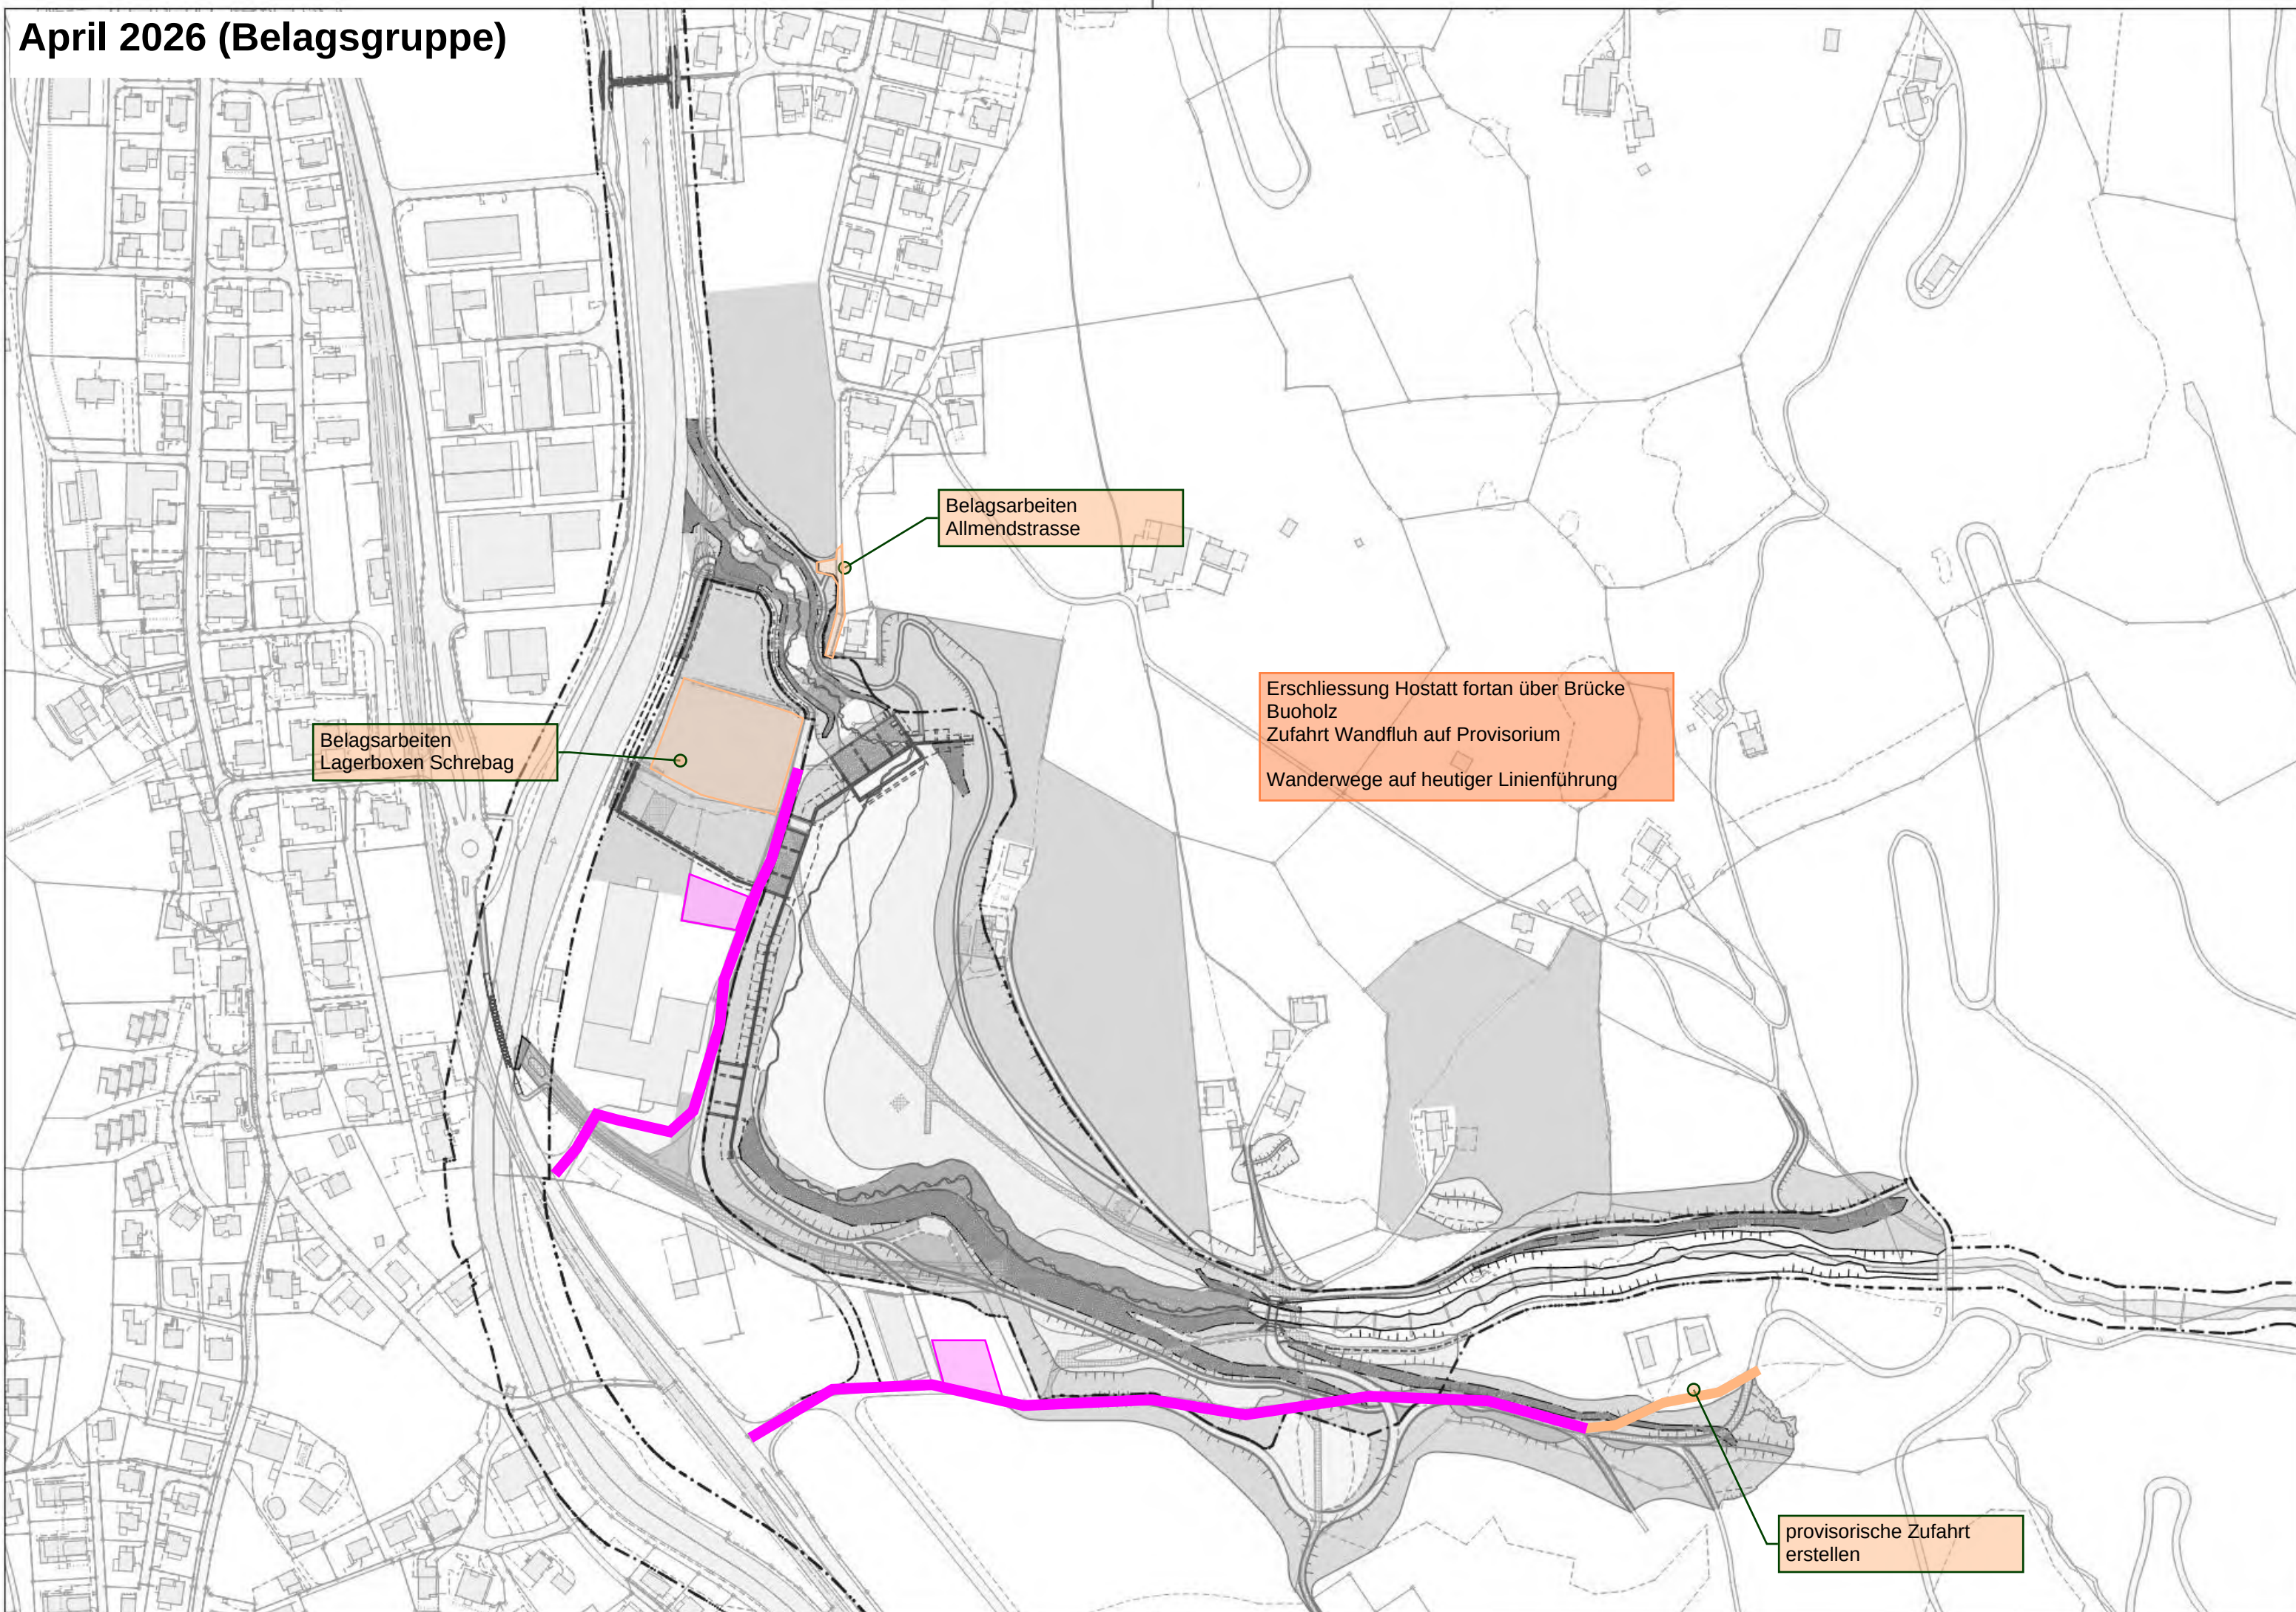


Juni 2026 (Belagsgruppe)

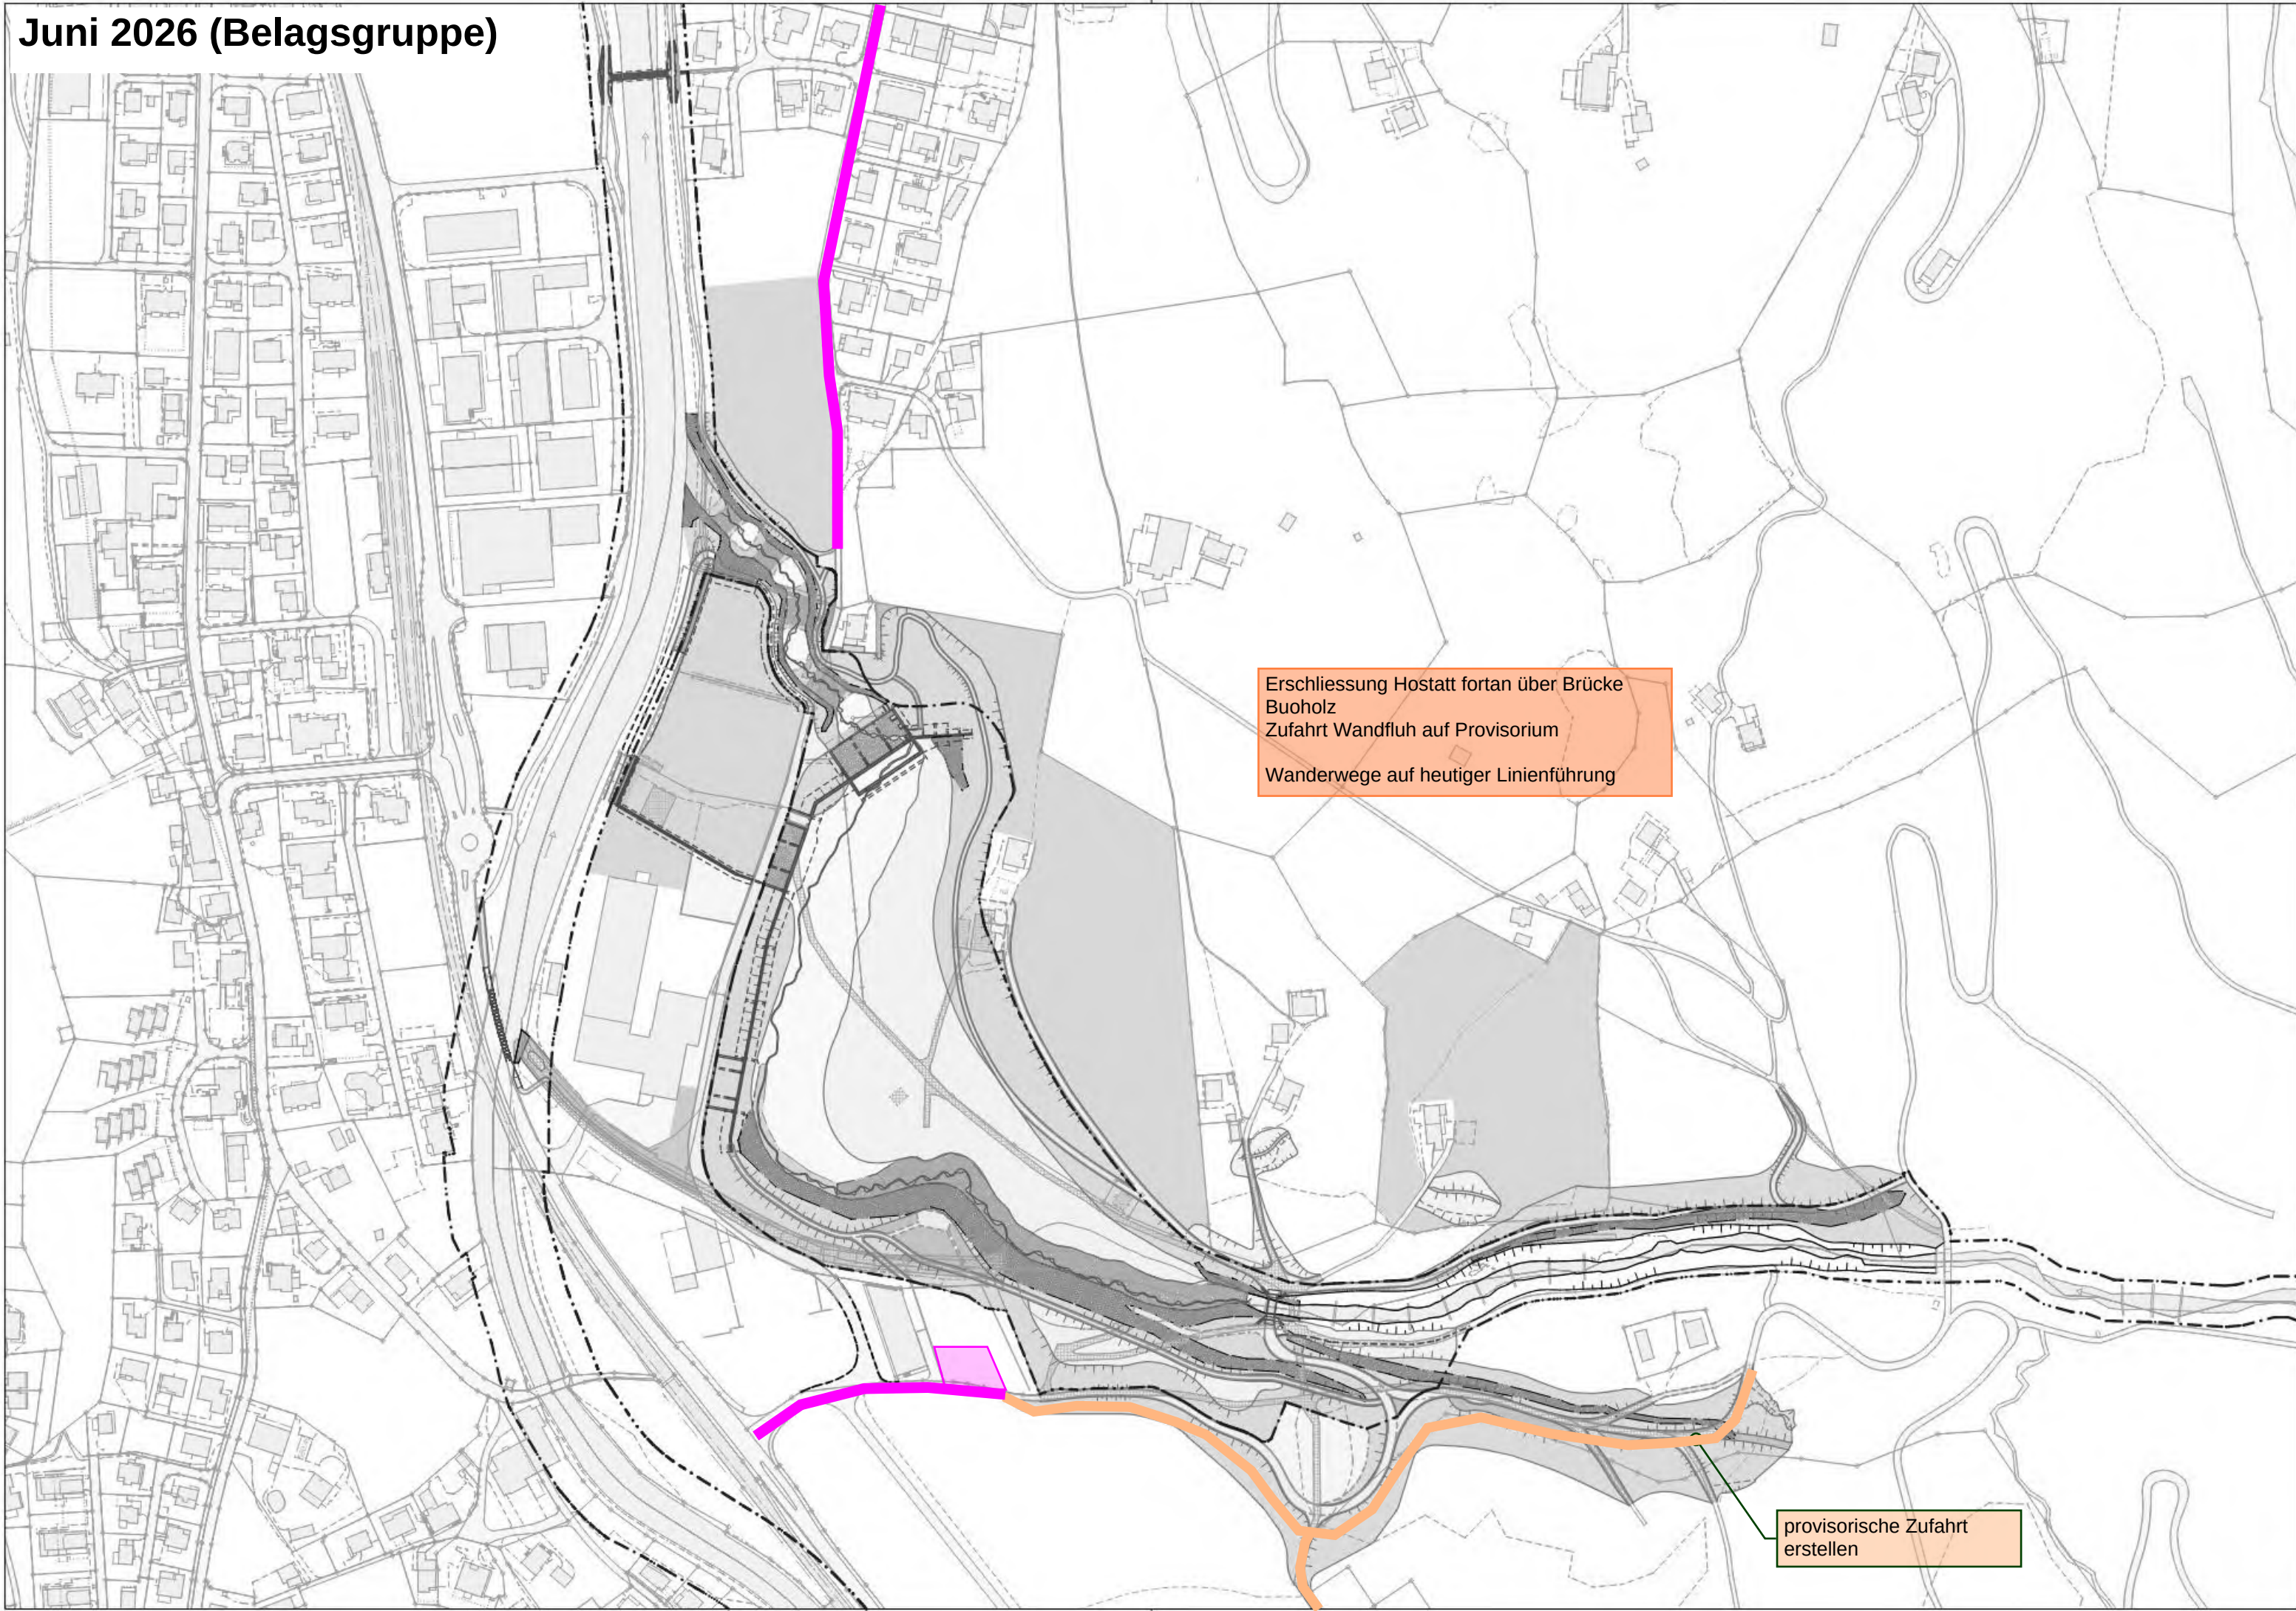


Juli bis September 2026 (1. Gruppe)

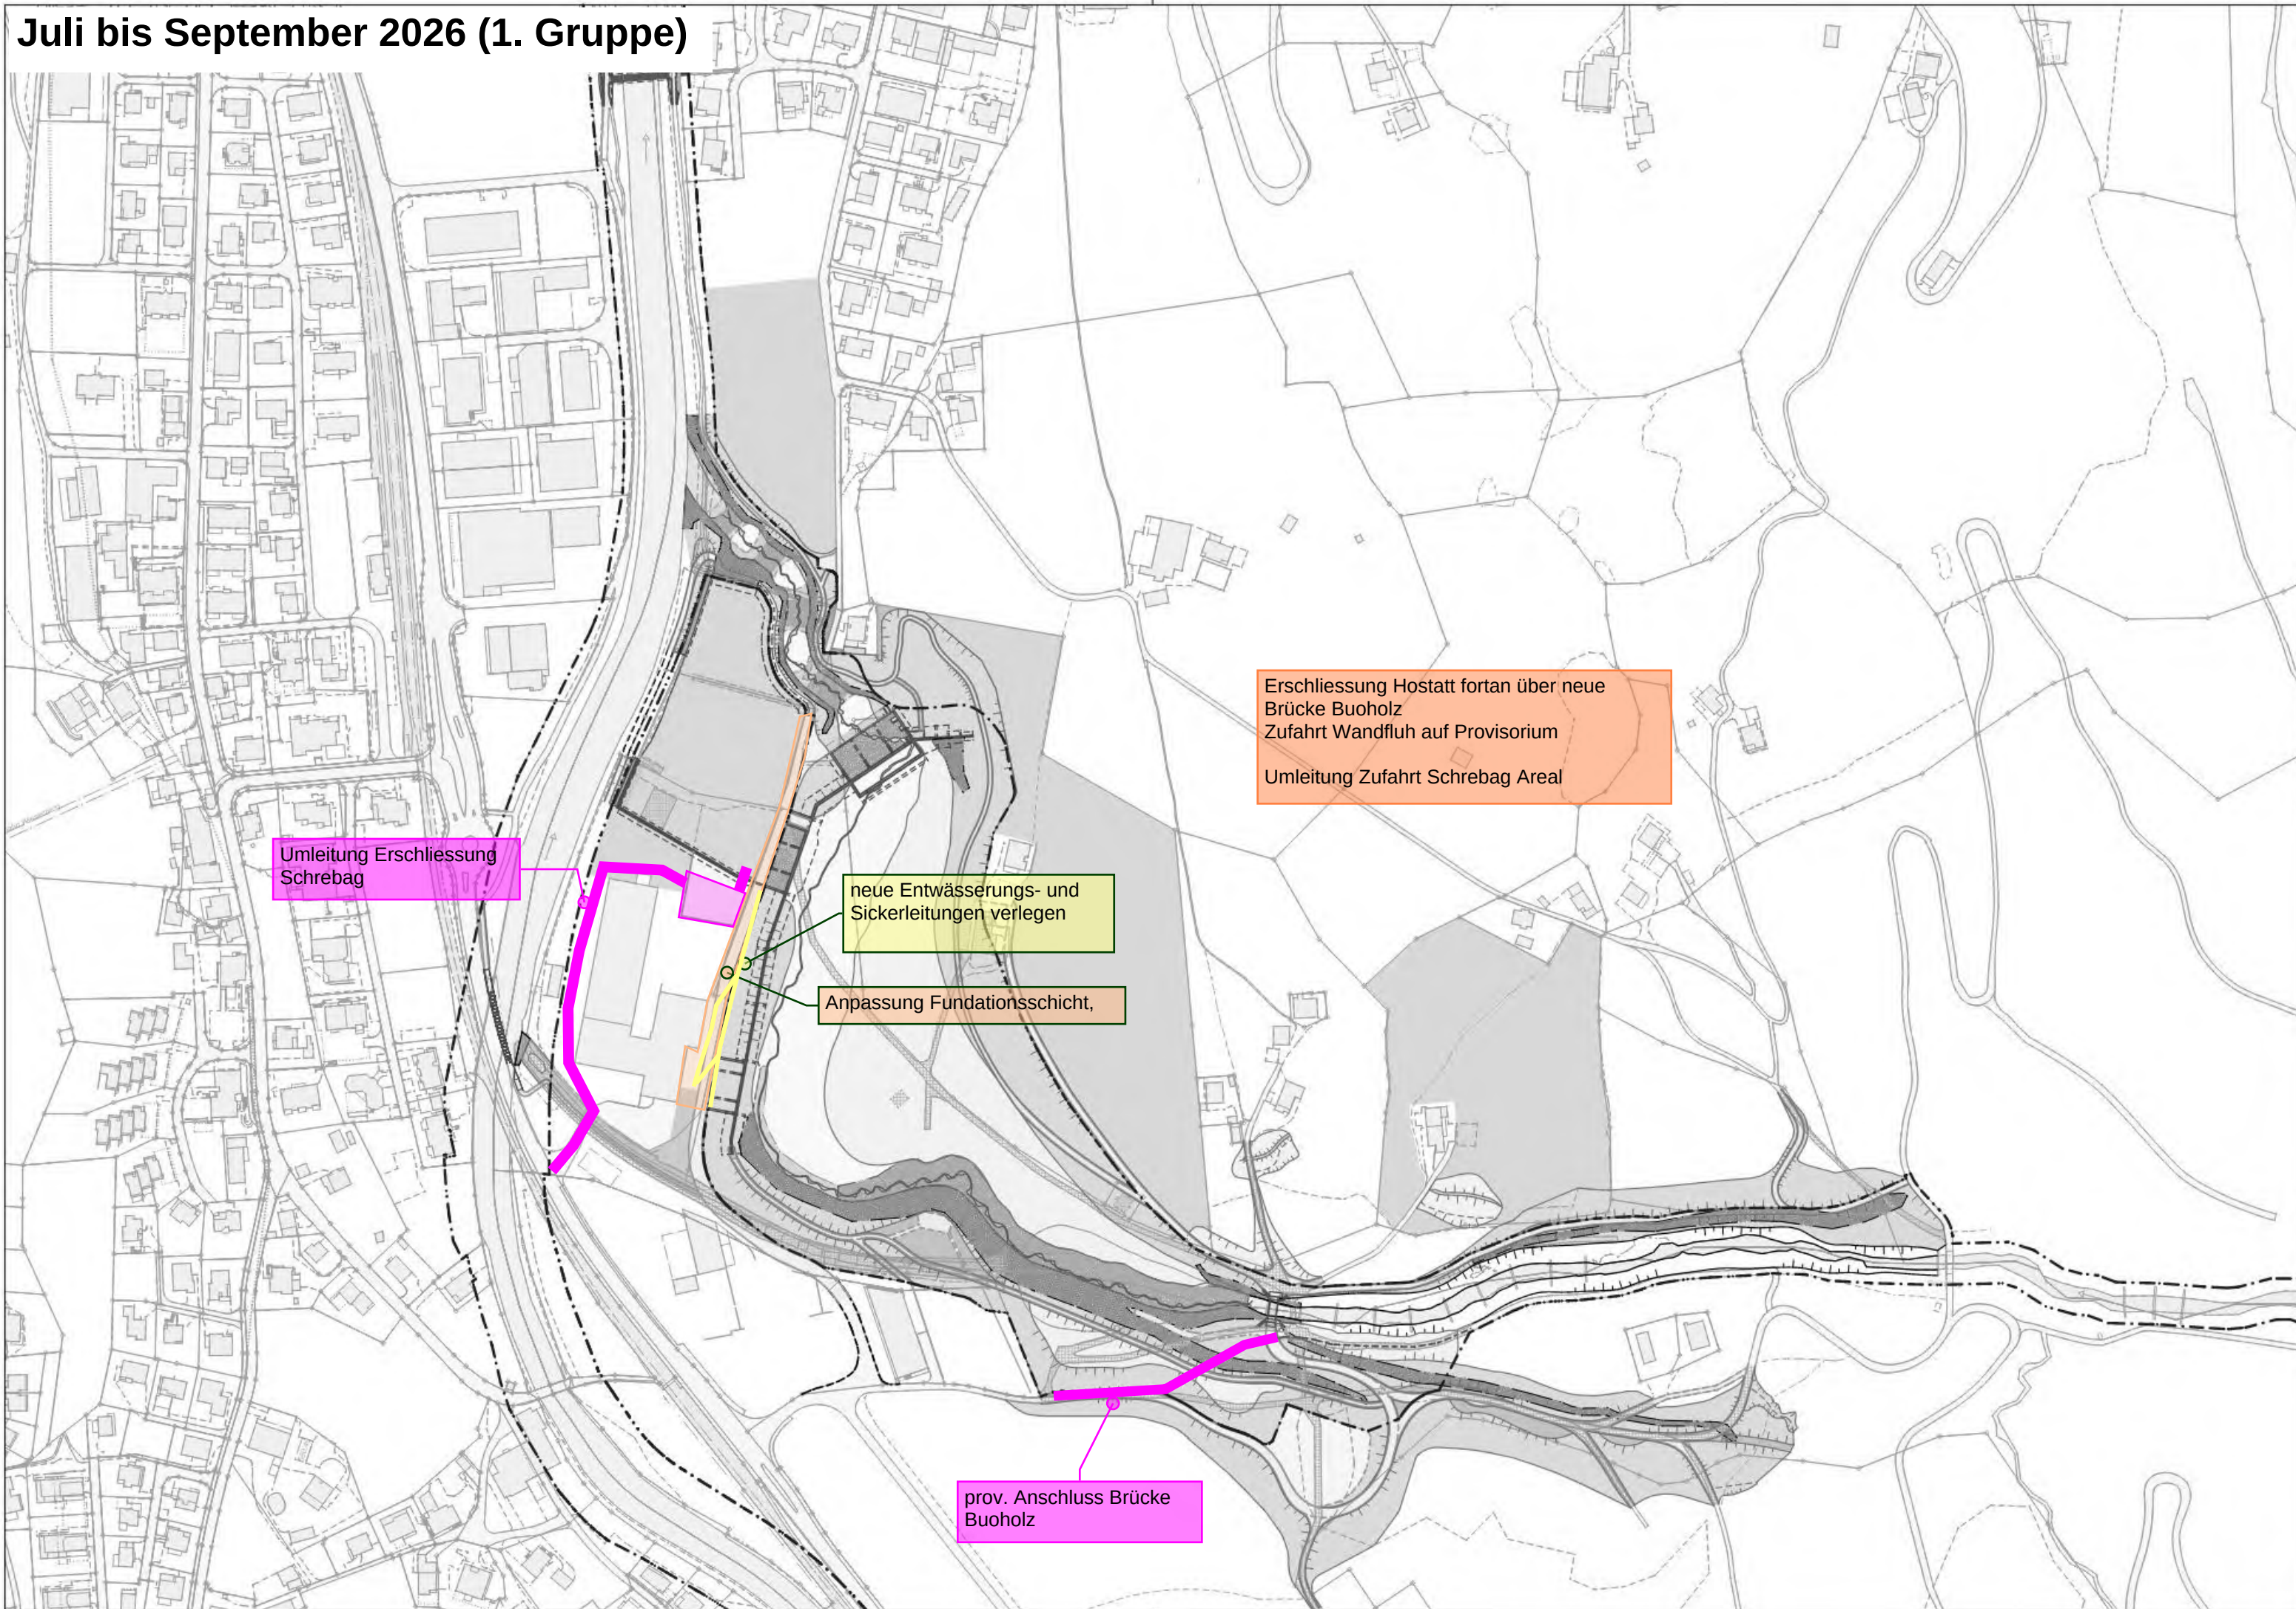


September 2026 (Belagsgruppe)

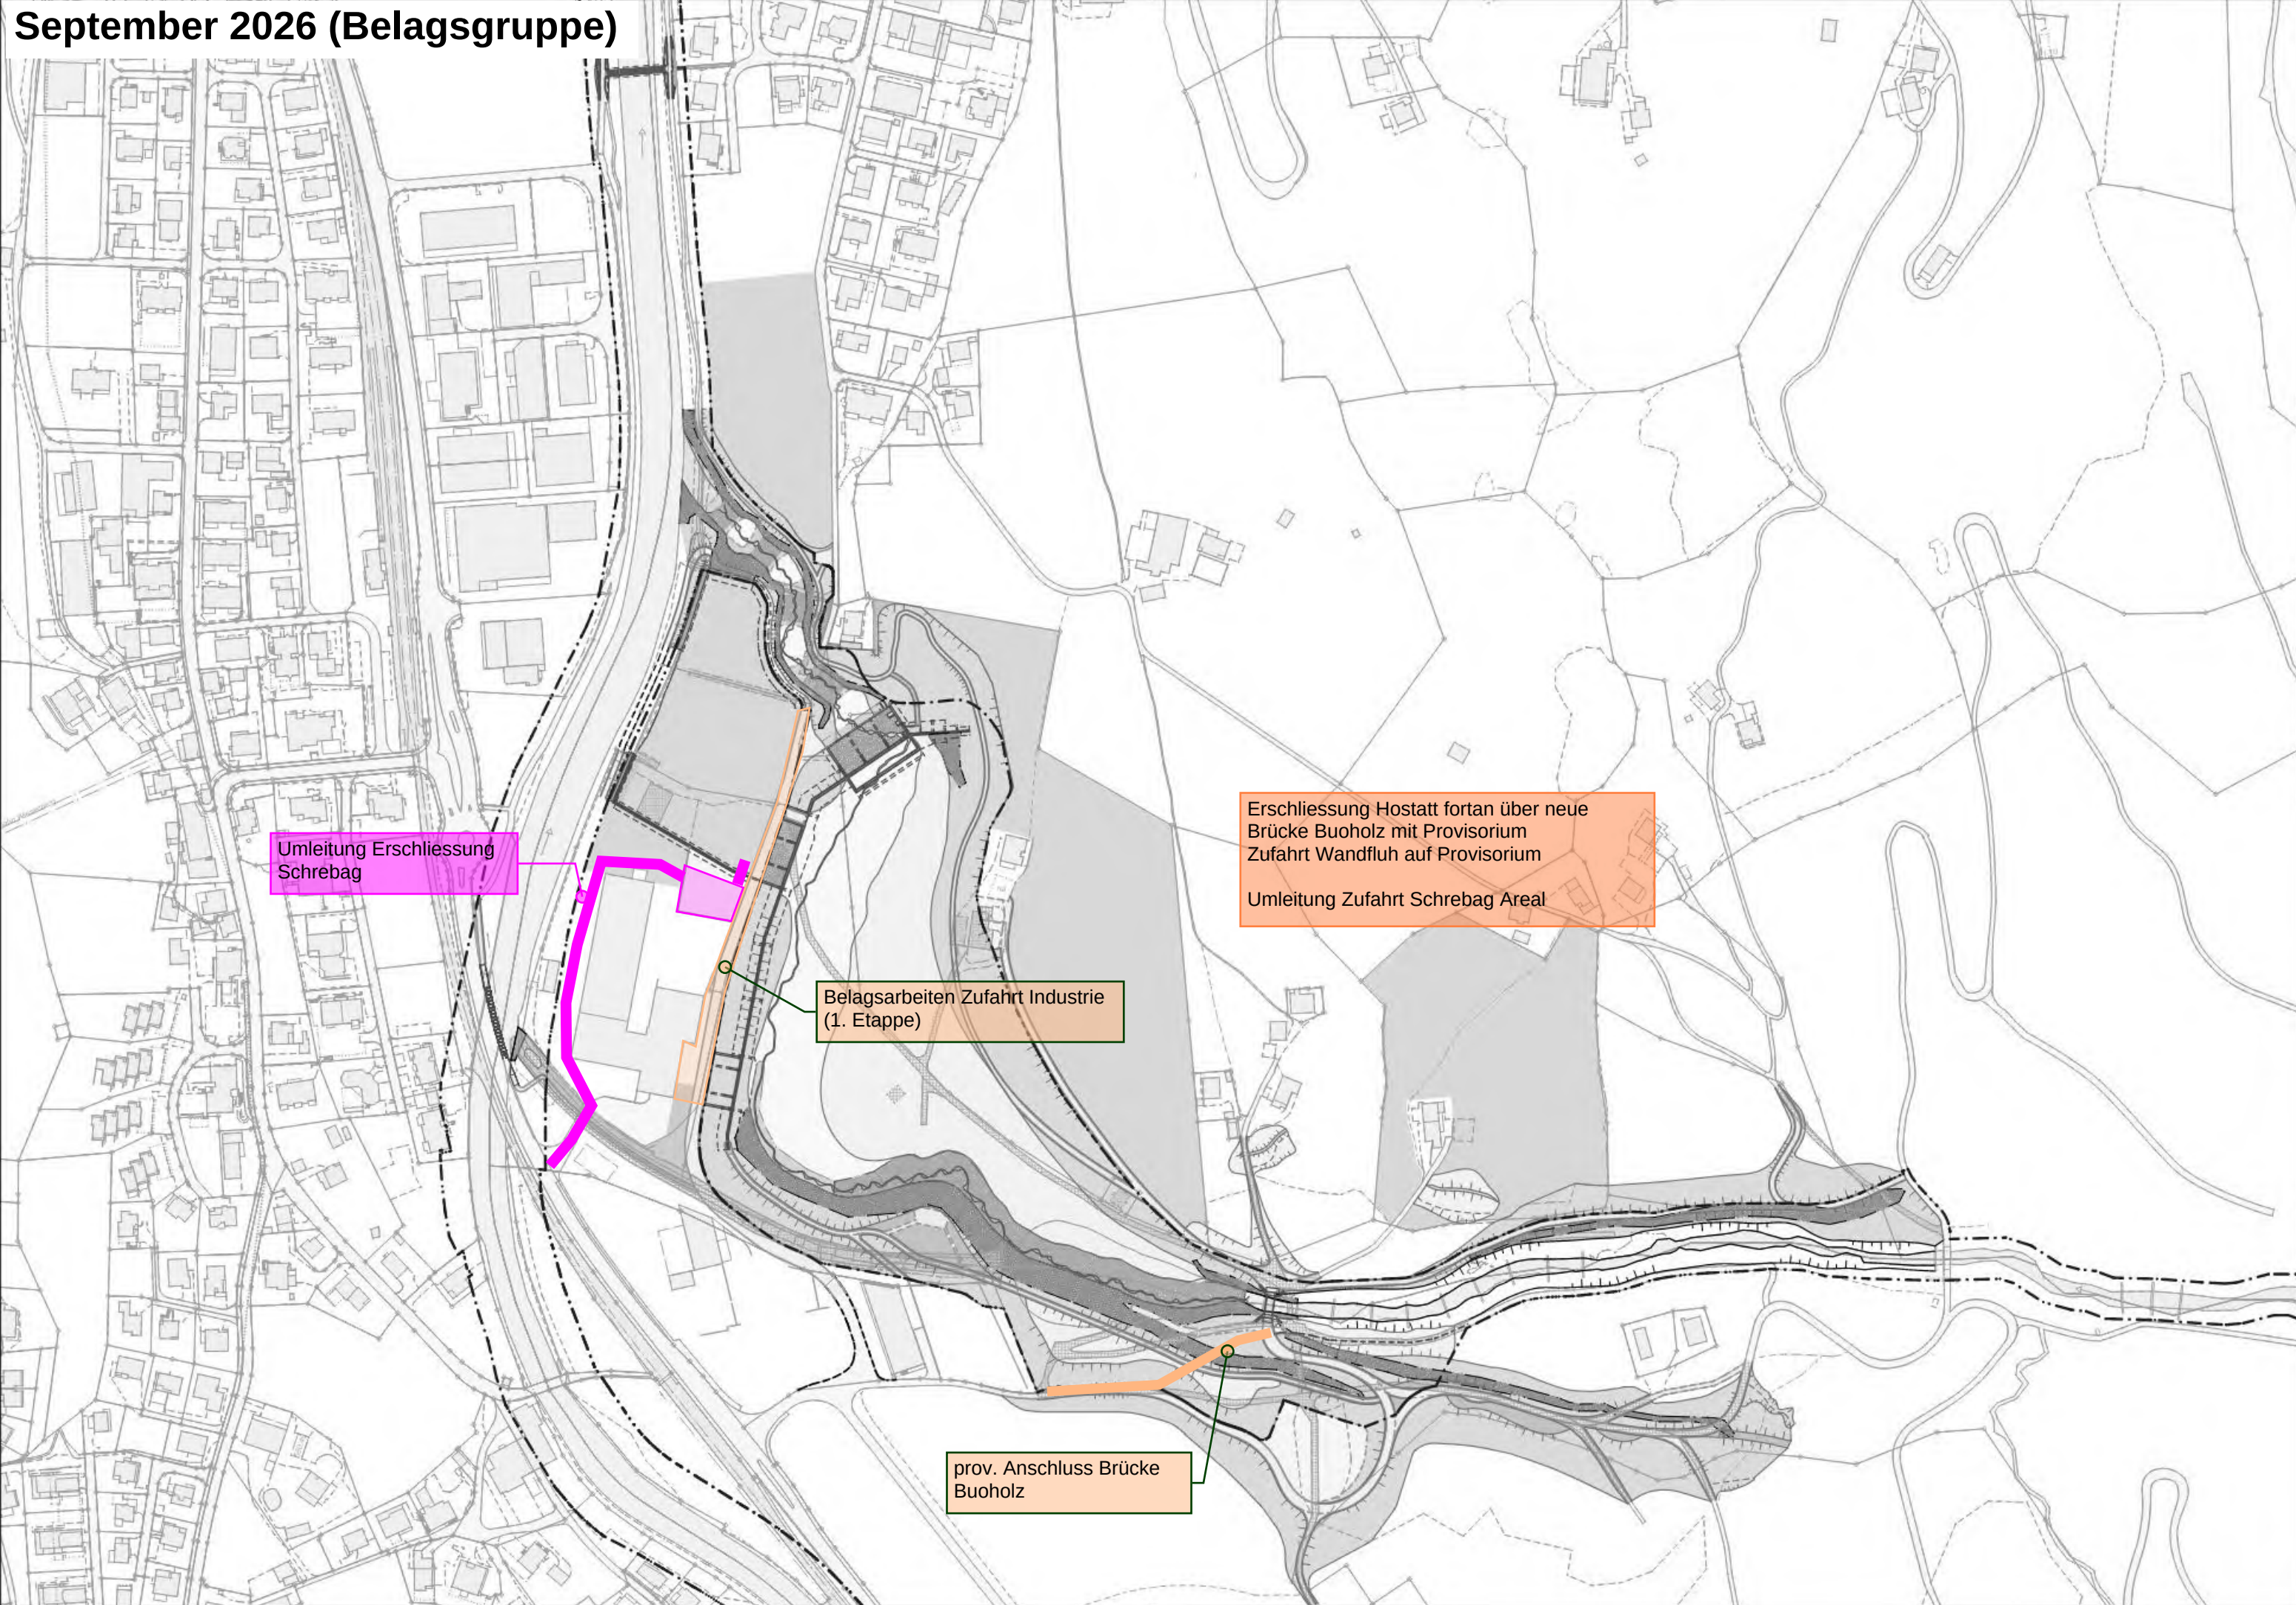


Oktober bis Dezember 2026 (1. Gruppe)

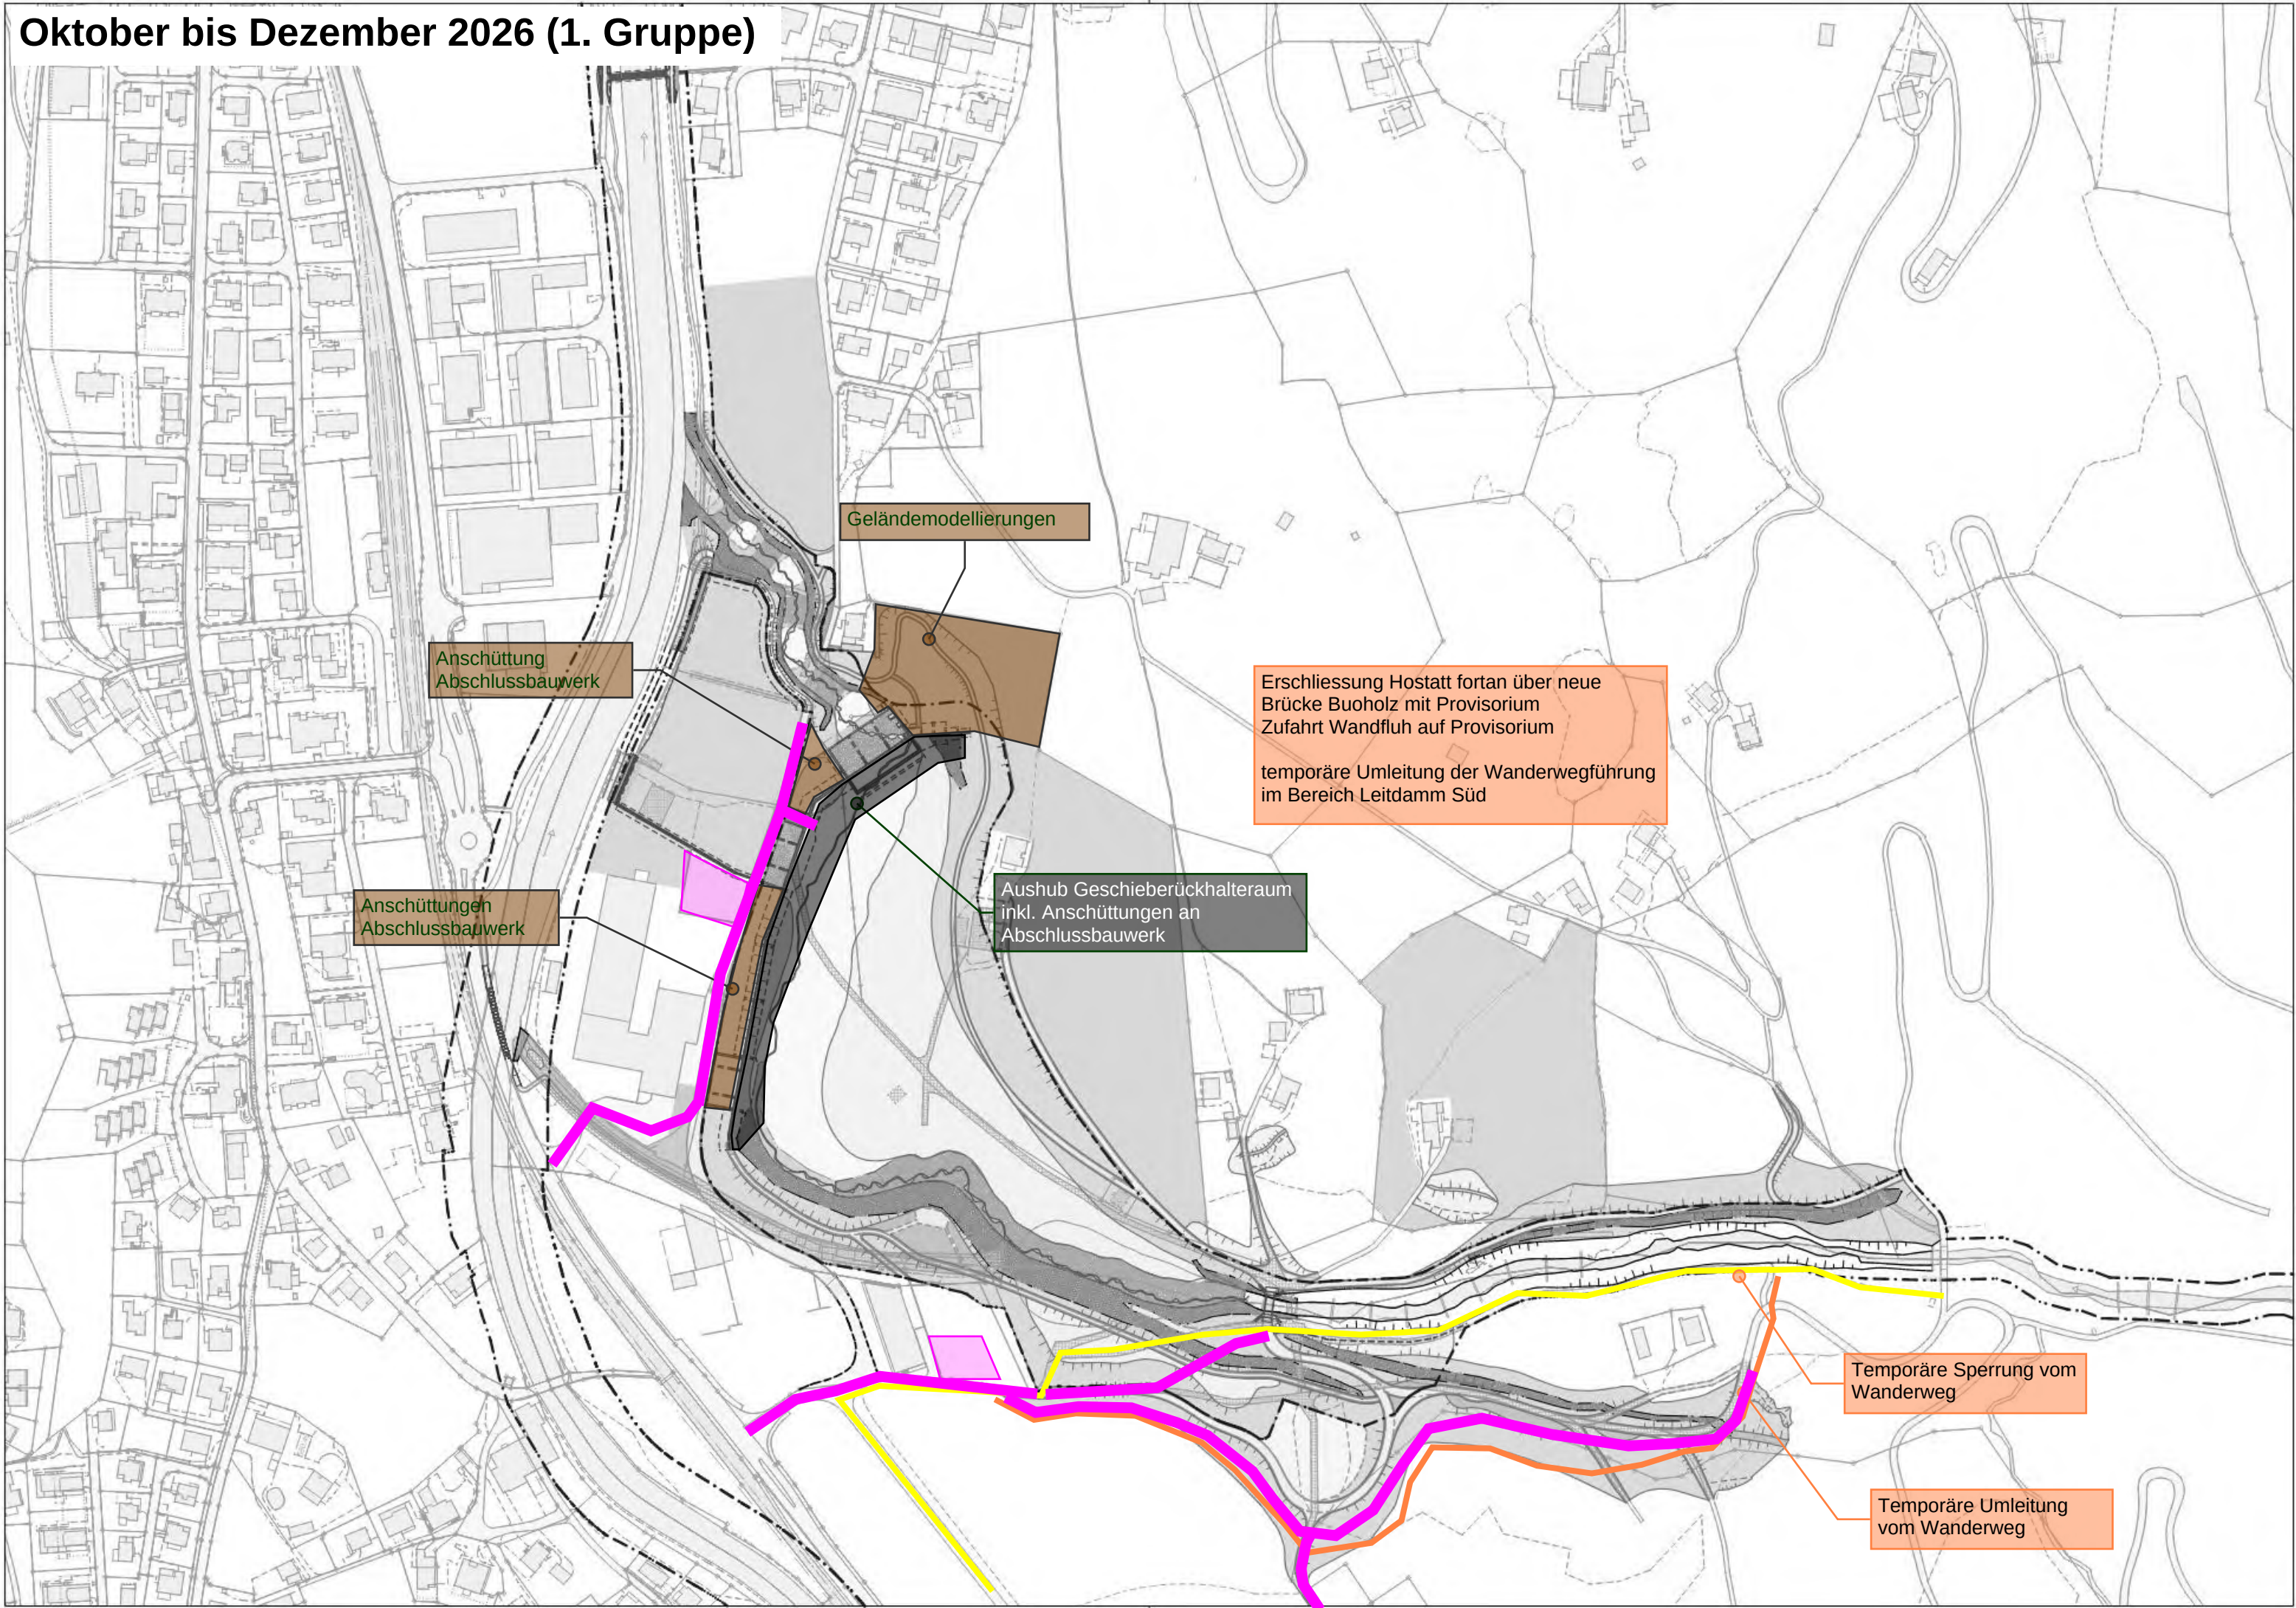

November 2026 bis Januar 2027 (2. Gruppe)

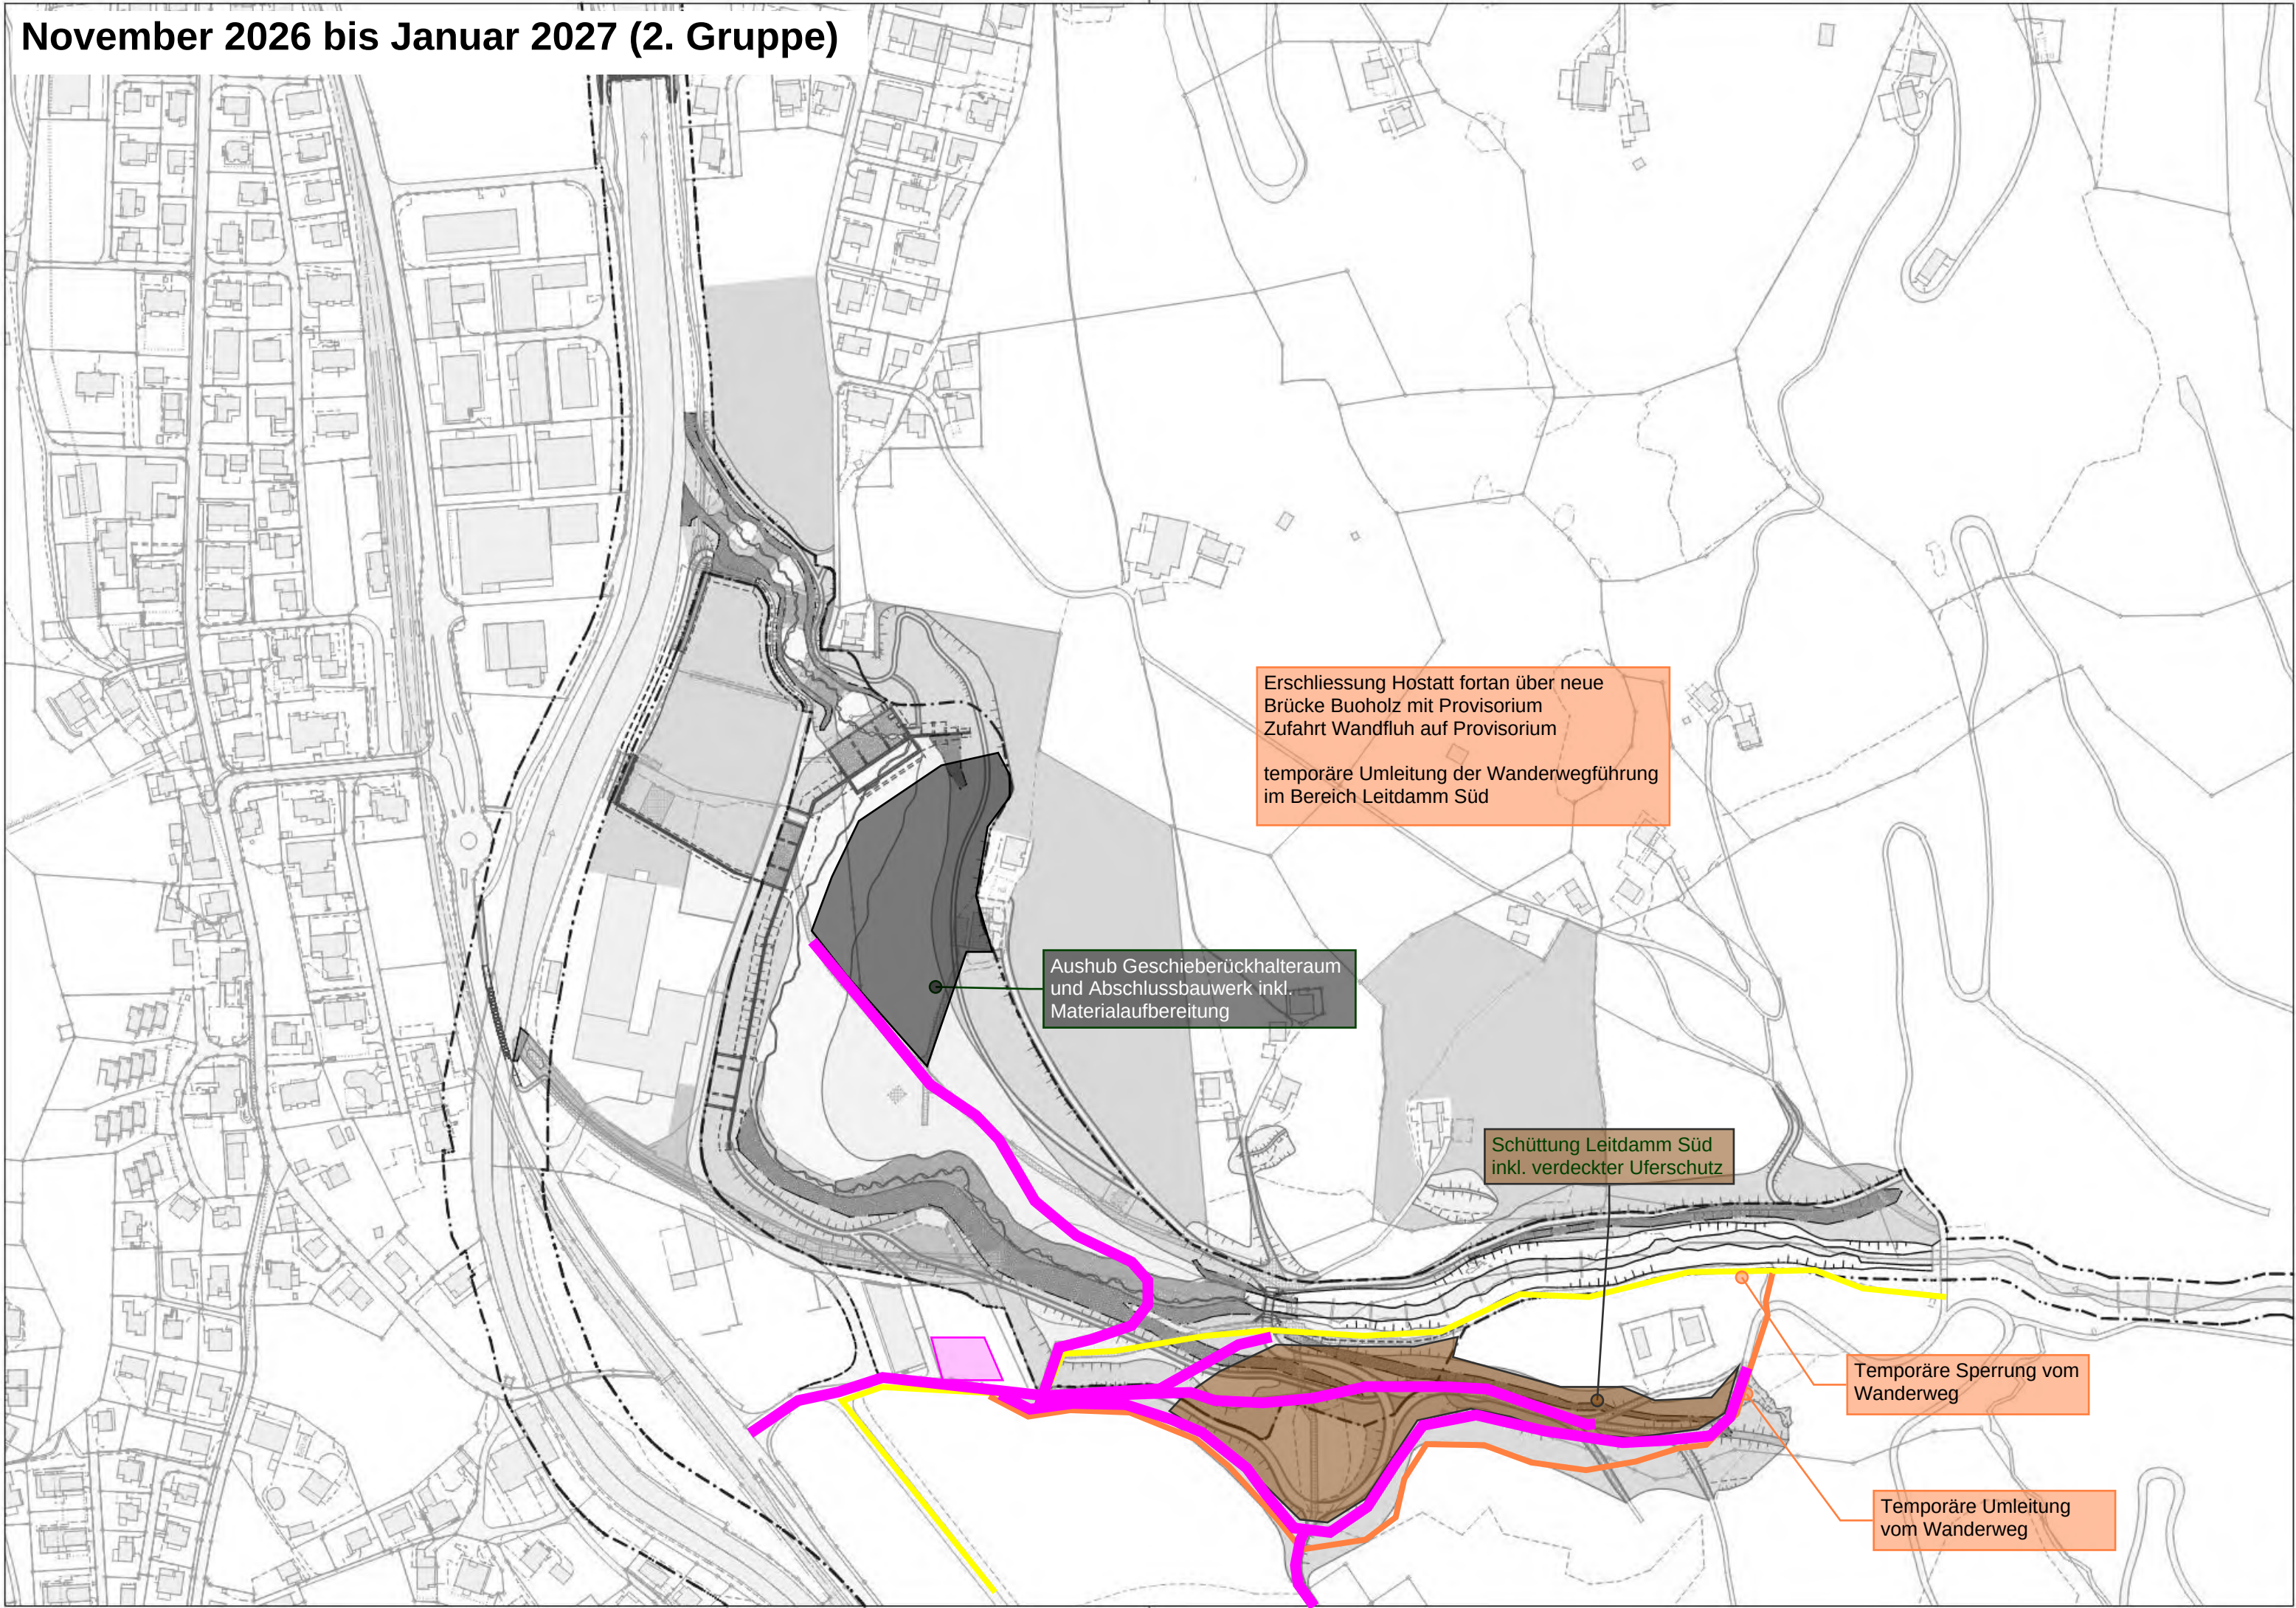

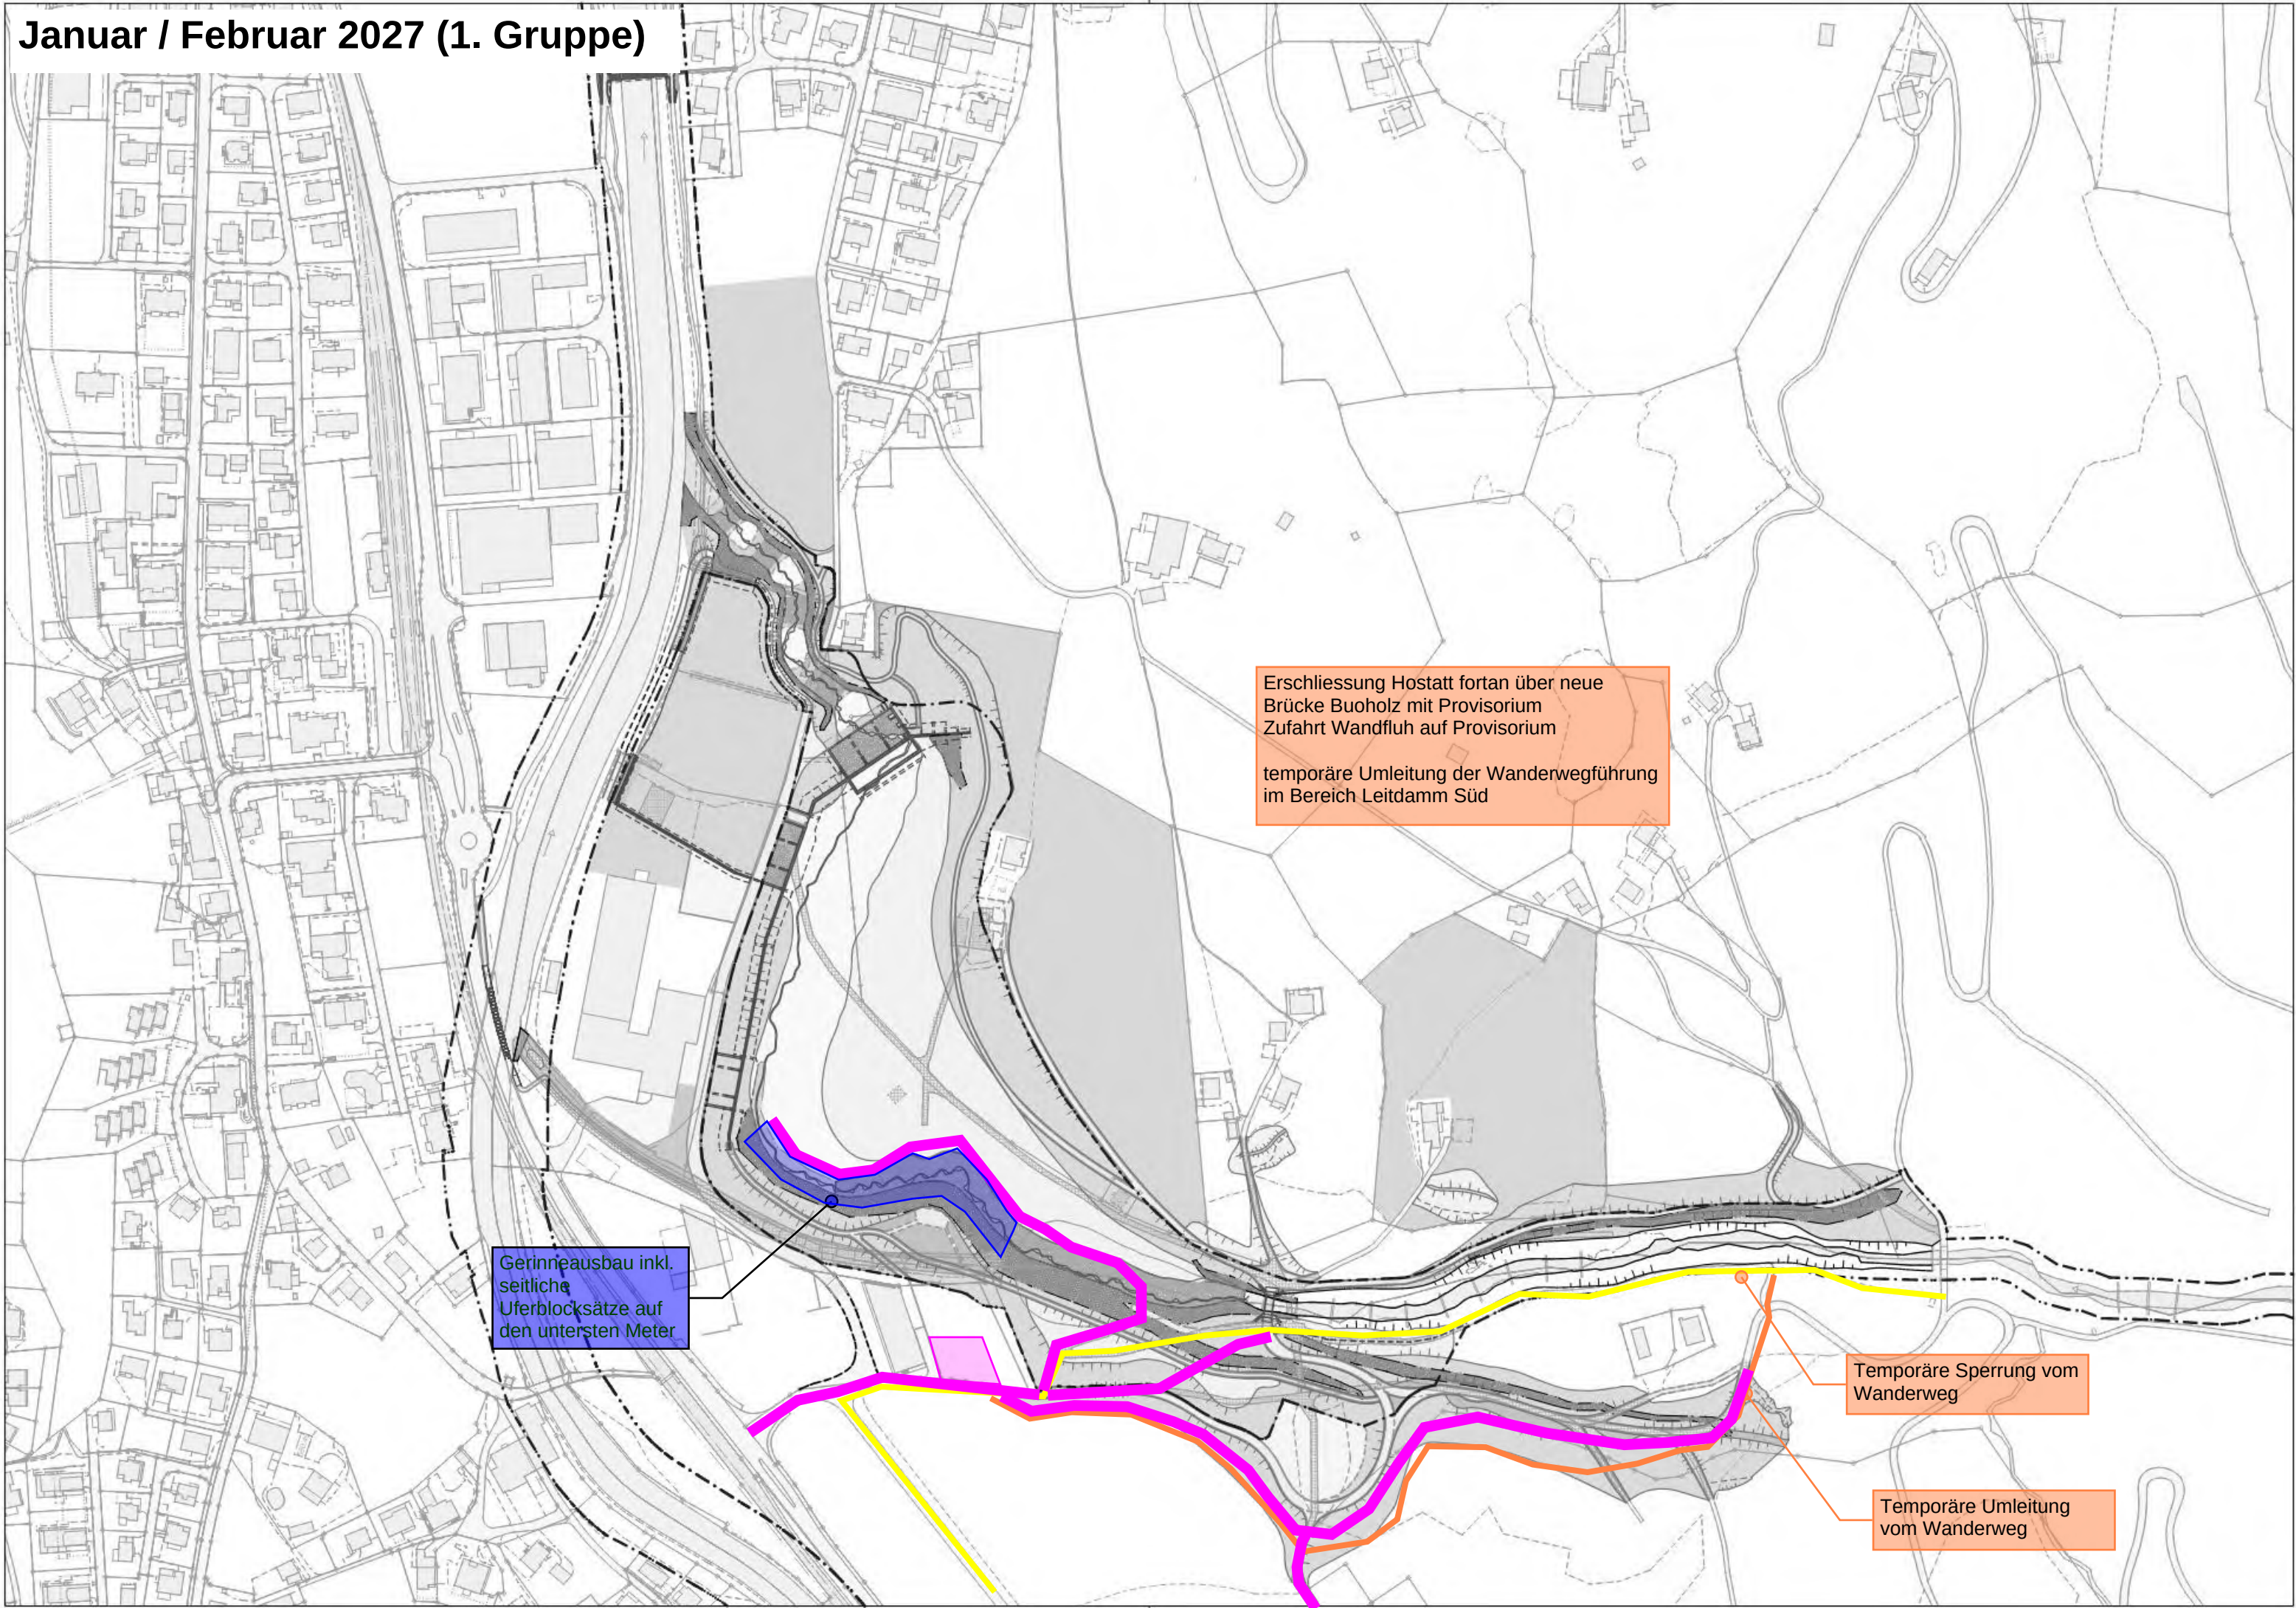


Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buoholz mit Provisorium
Zufahrt Wandfluh auf Provisorium


temporäre Umleitung der Wanderwegführung
im Bereich Leitdamm Süd

Gerinneausbau inkl.
seitliche
Uferblocksätze auf
den untersten Meter


Temporäre Sperrung vom
Wanderweg


Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

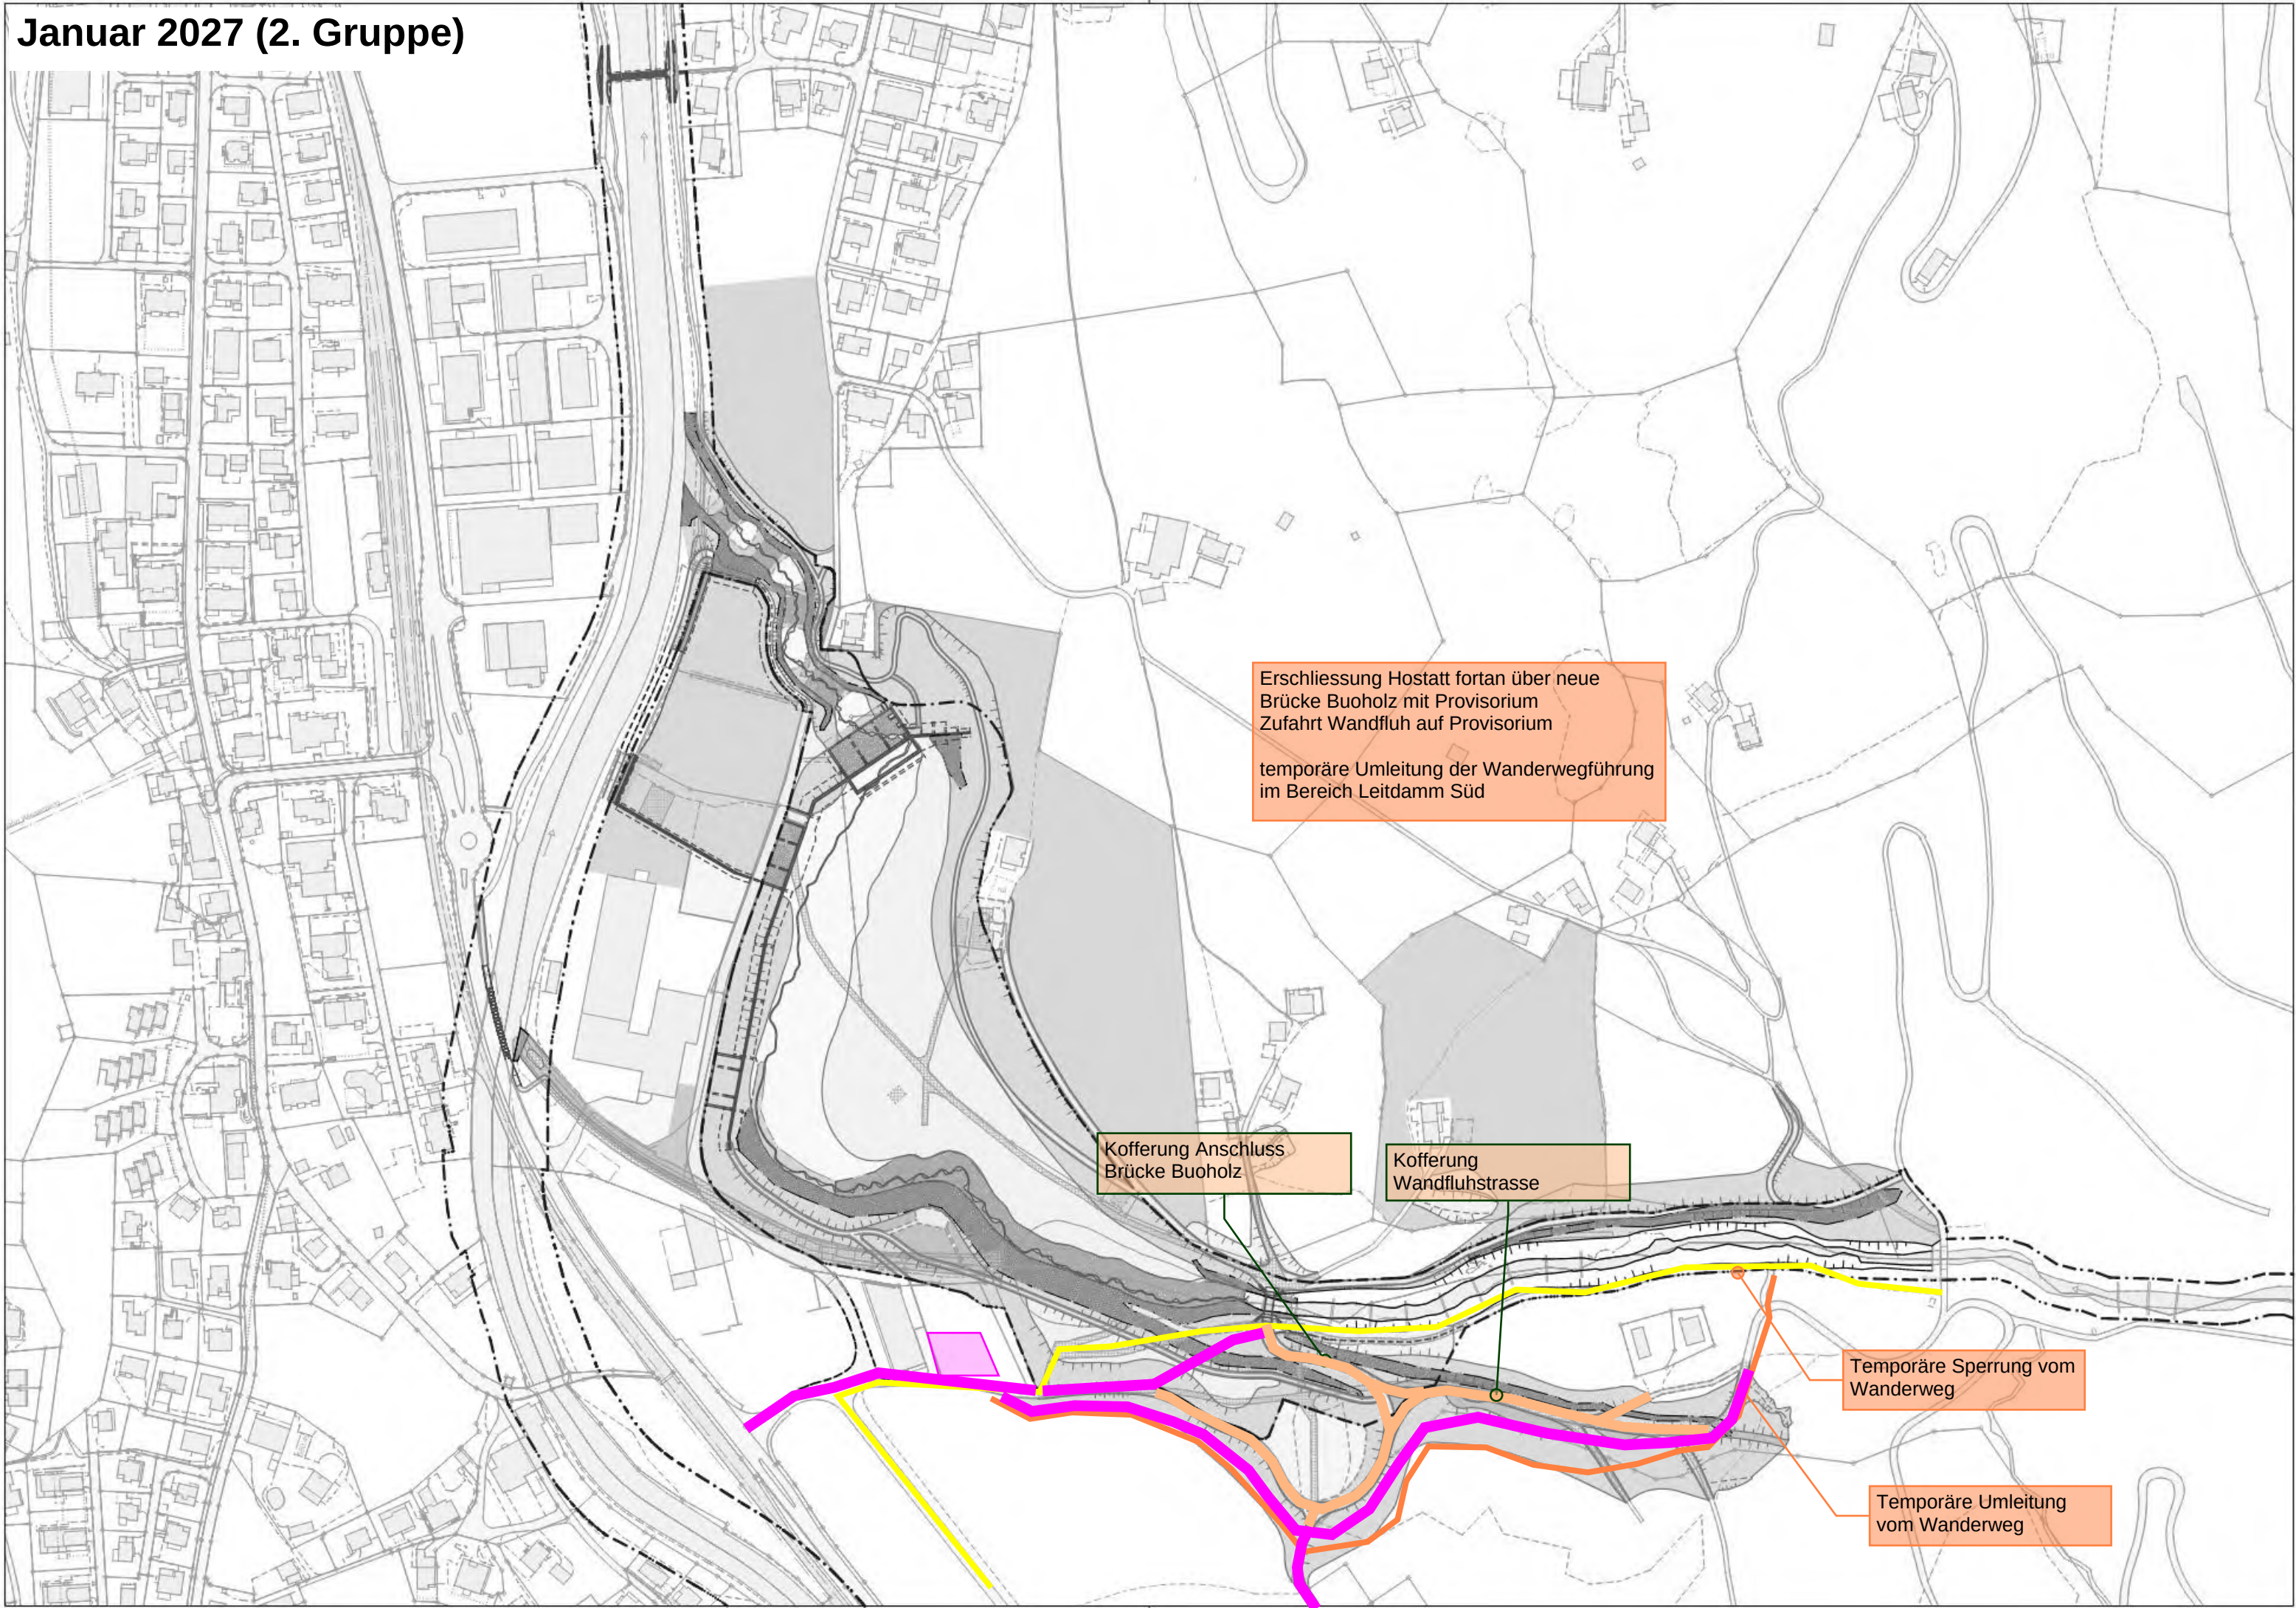

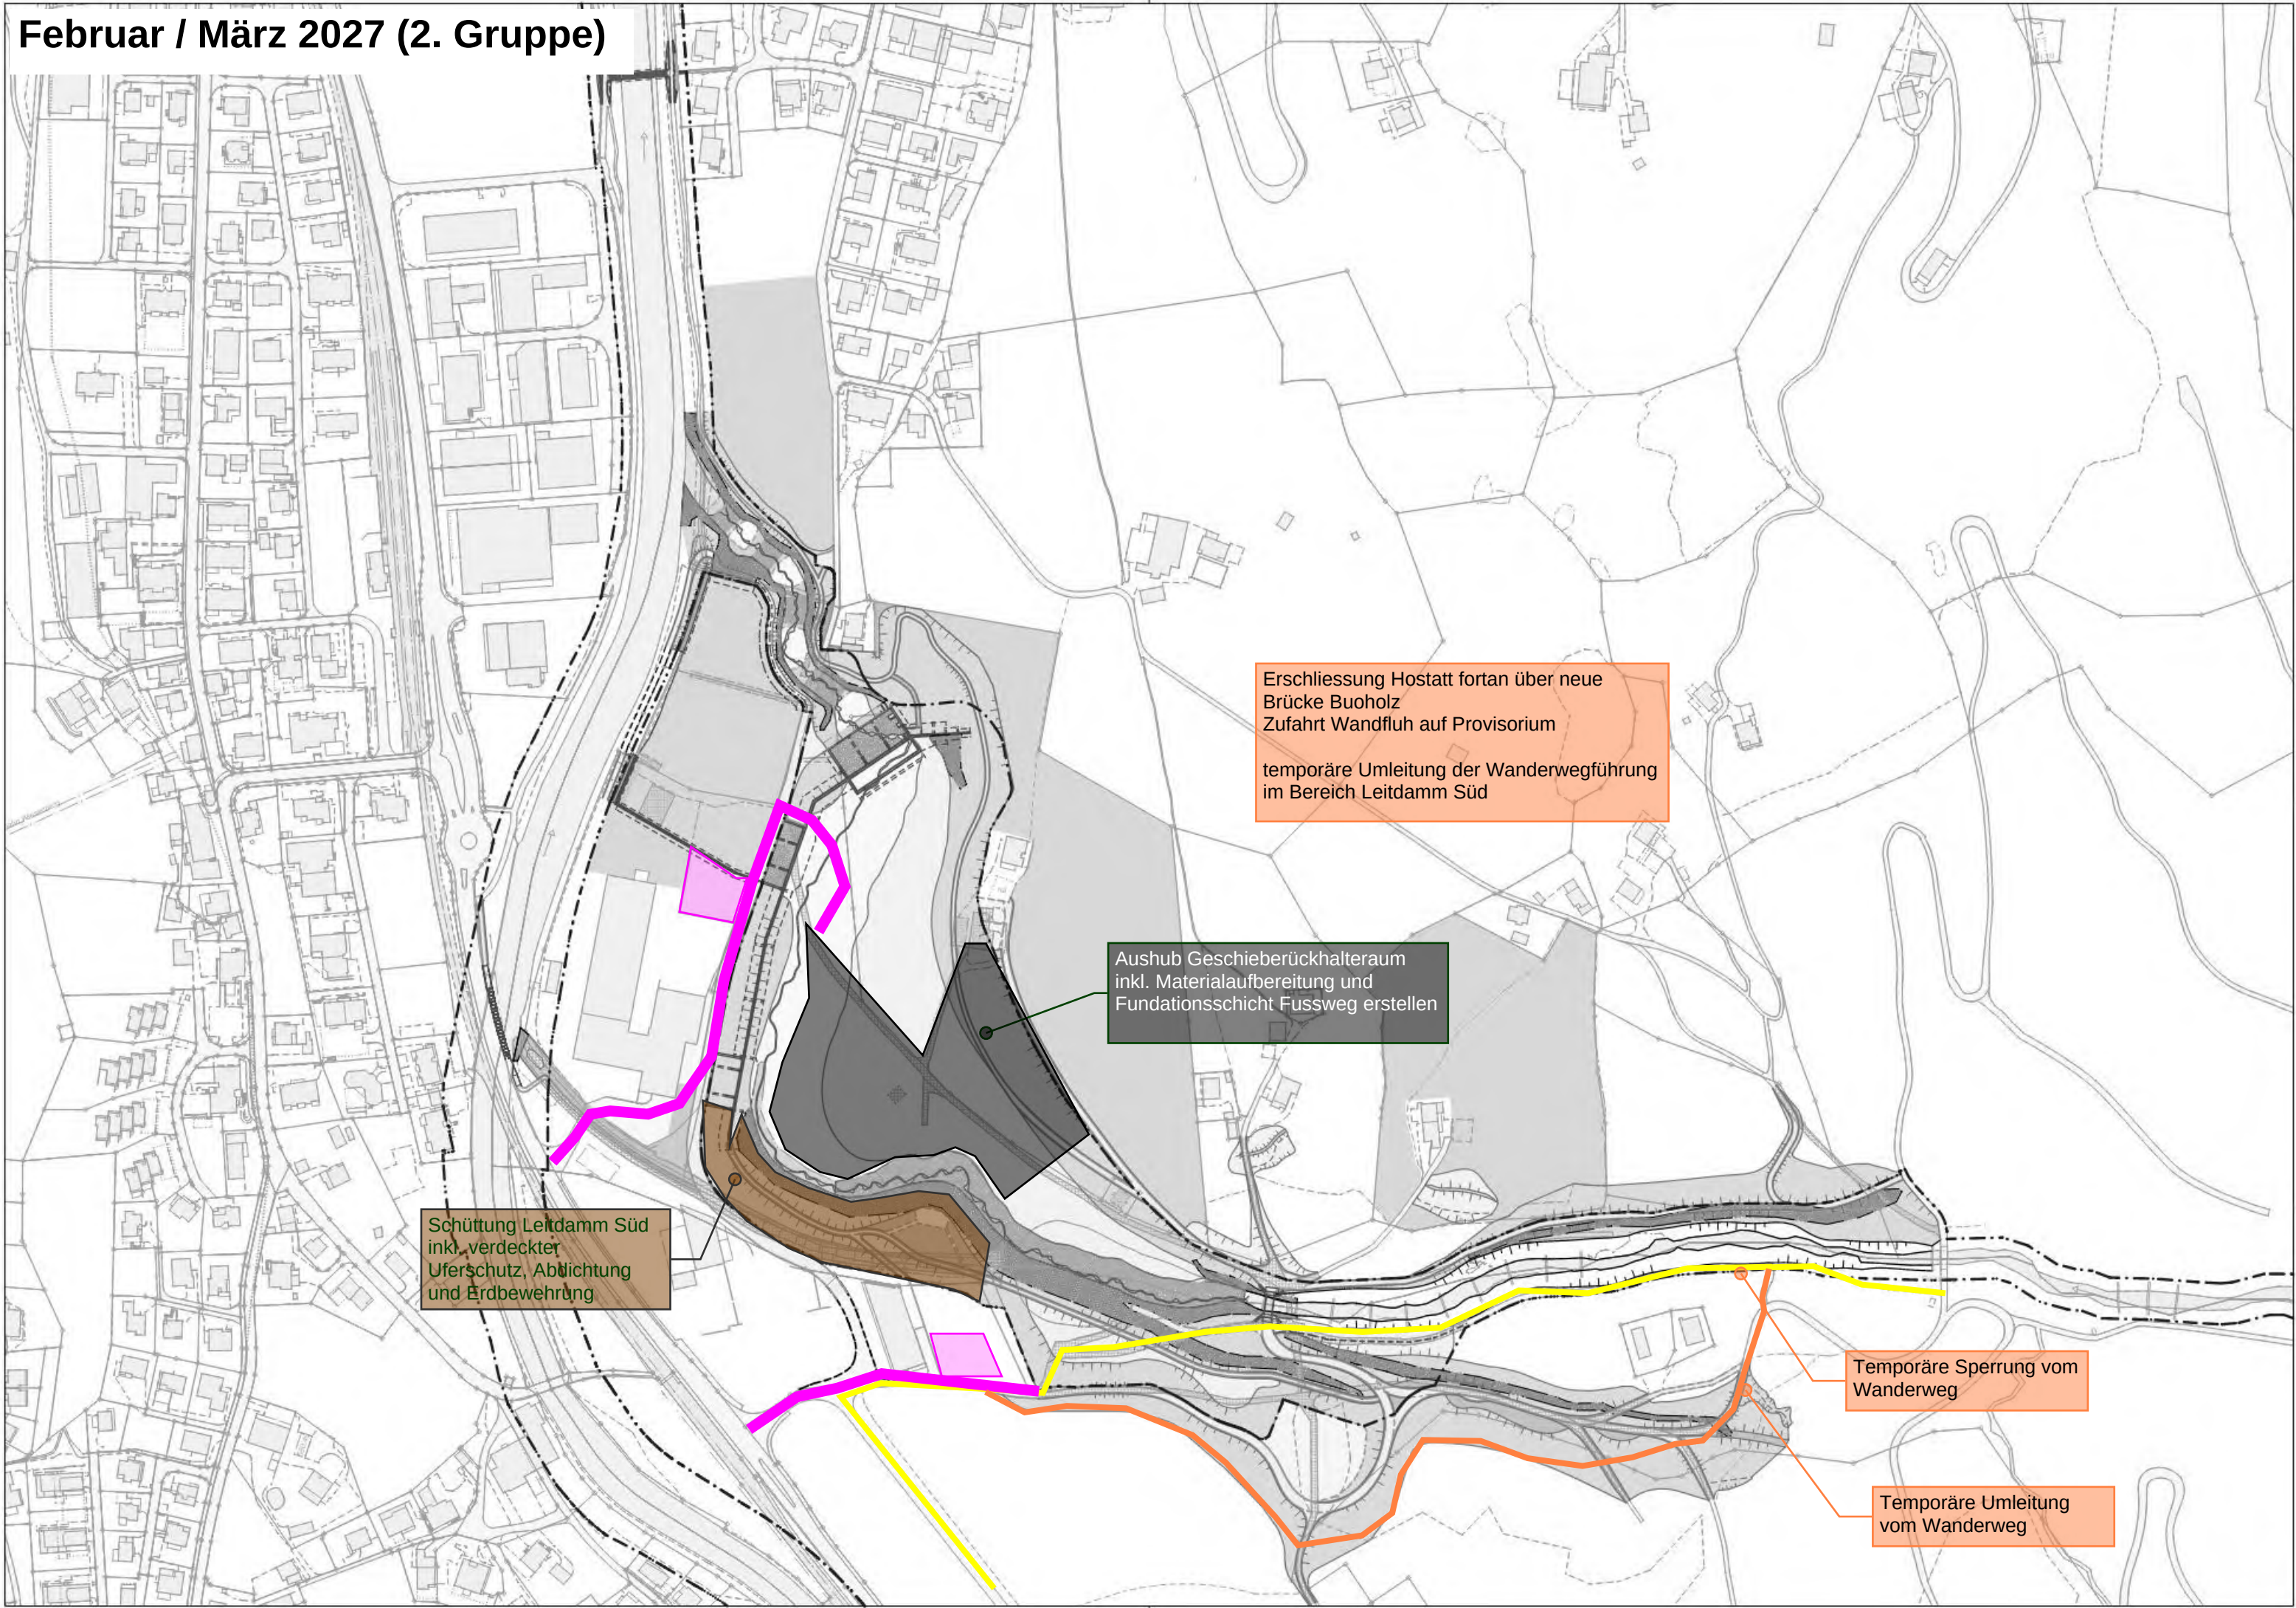

März / April 2027 (1. Gruppe)

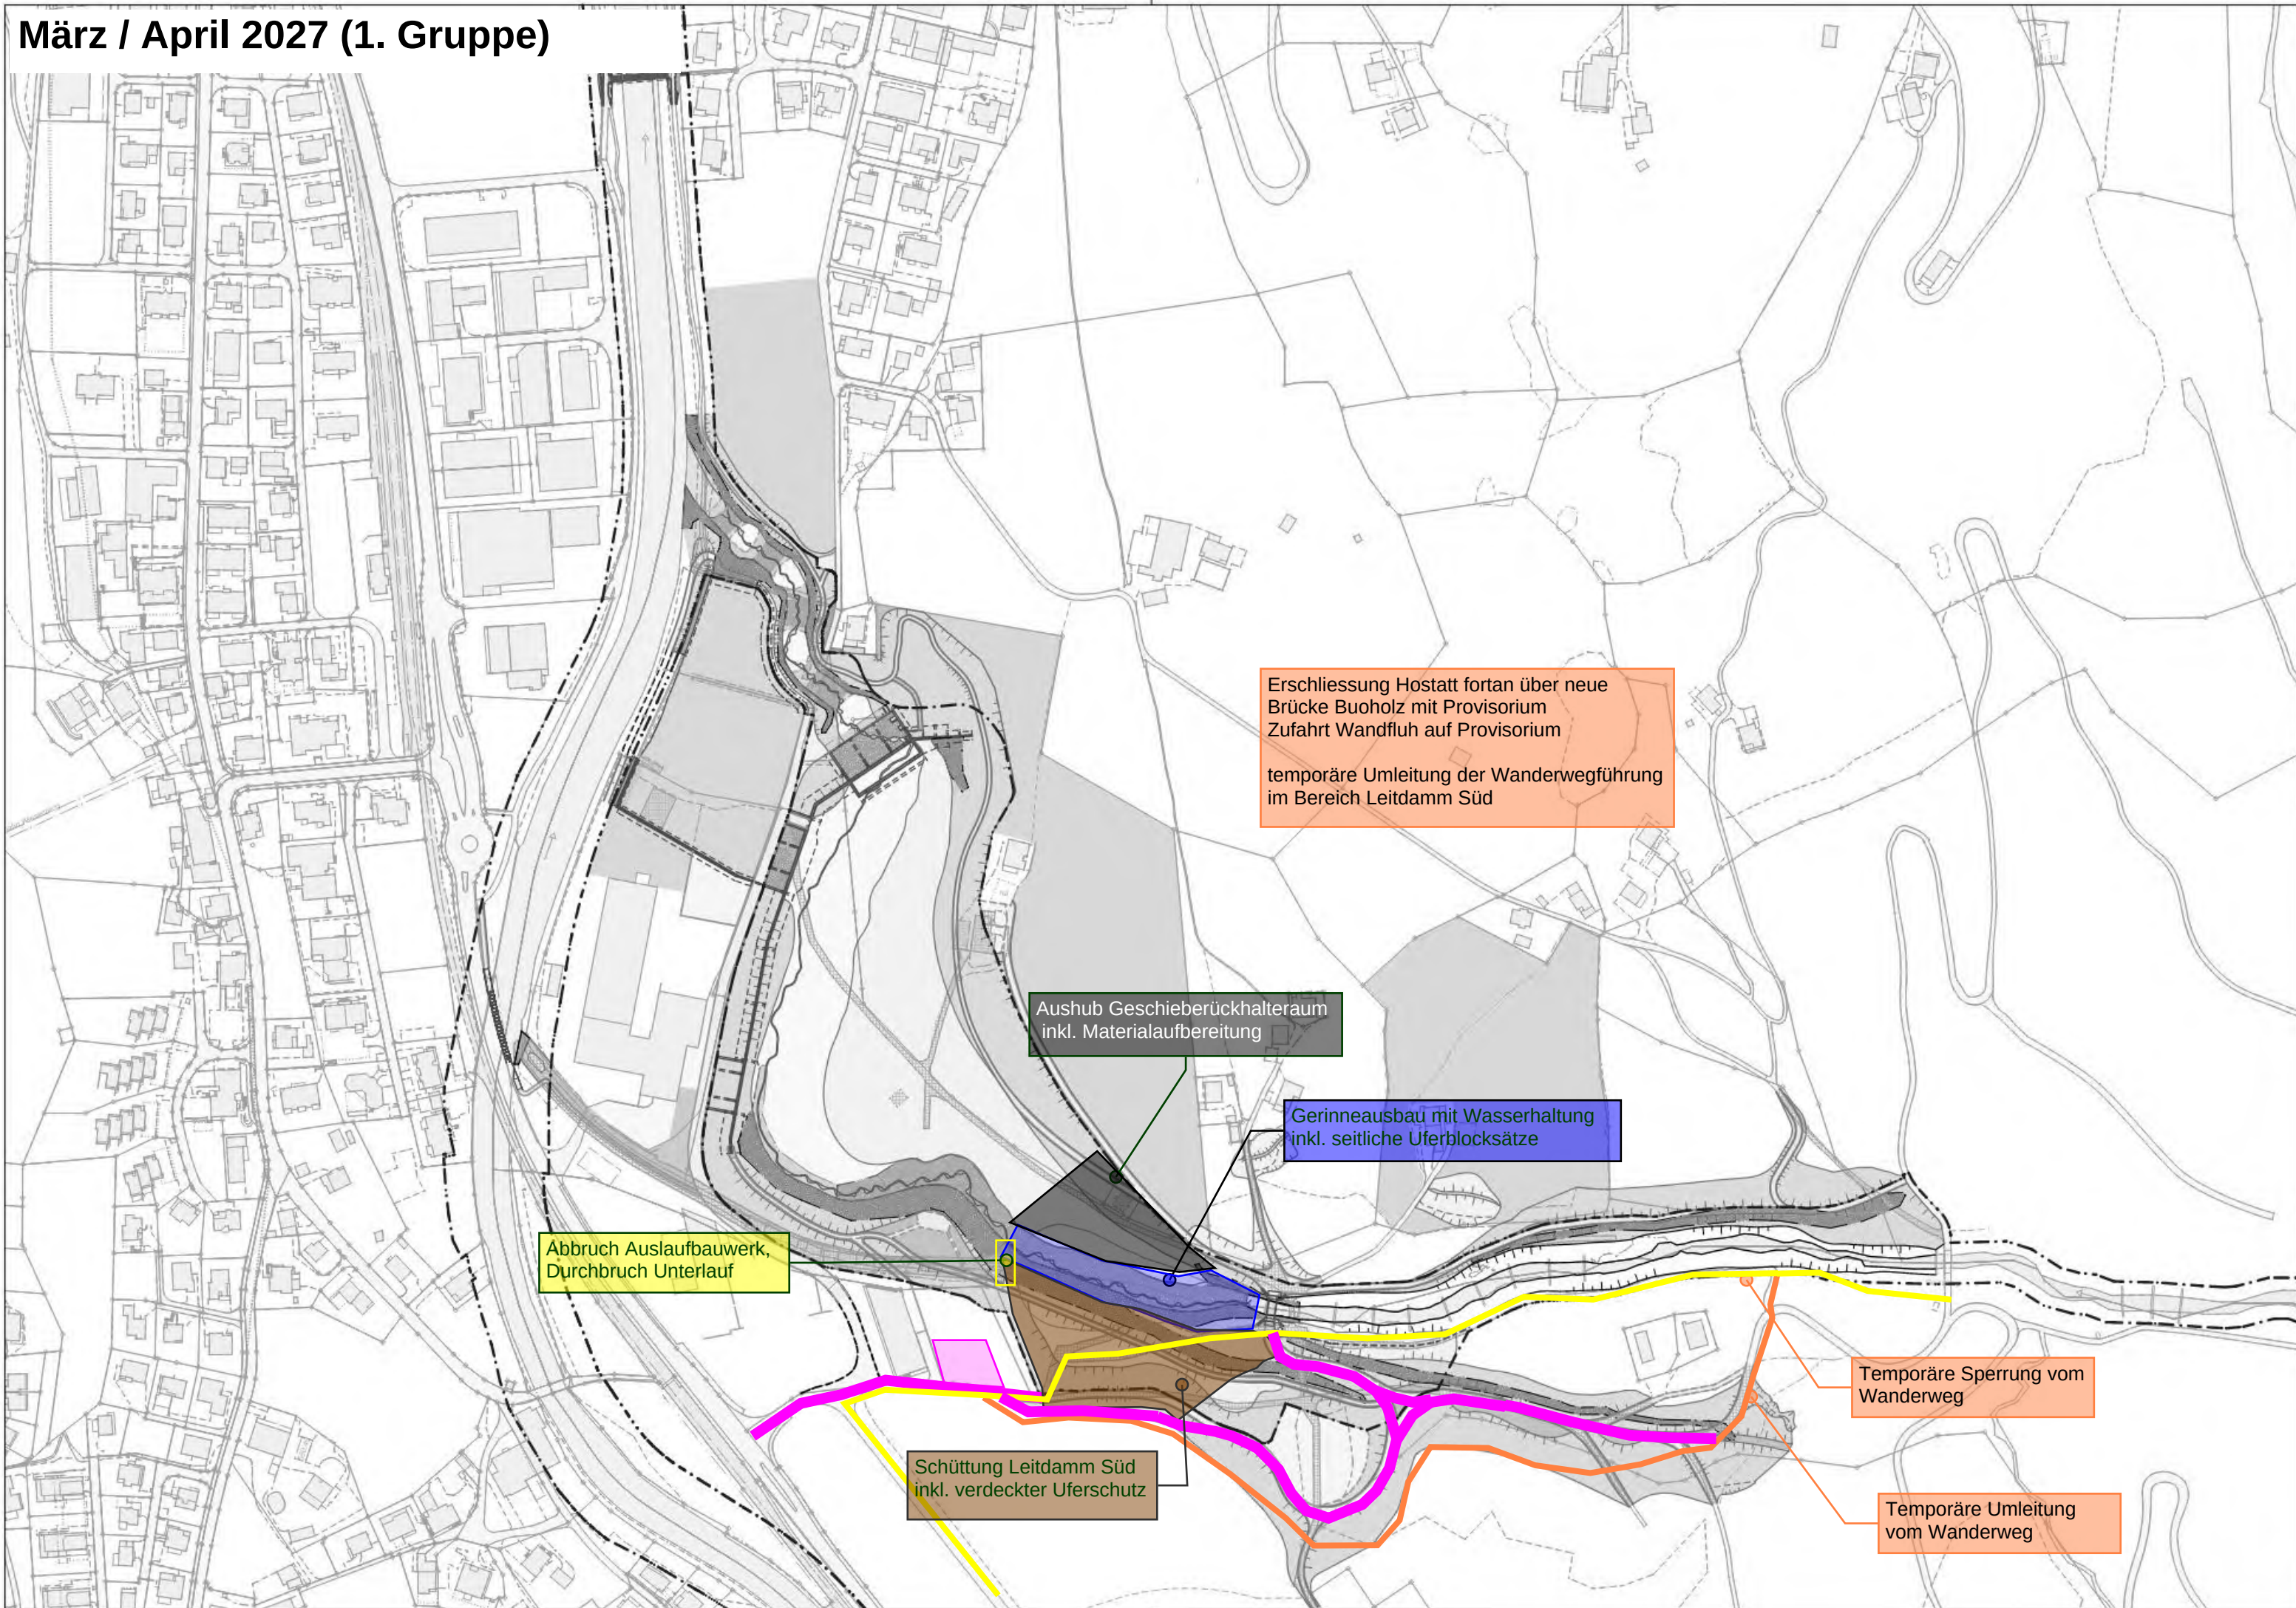

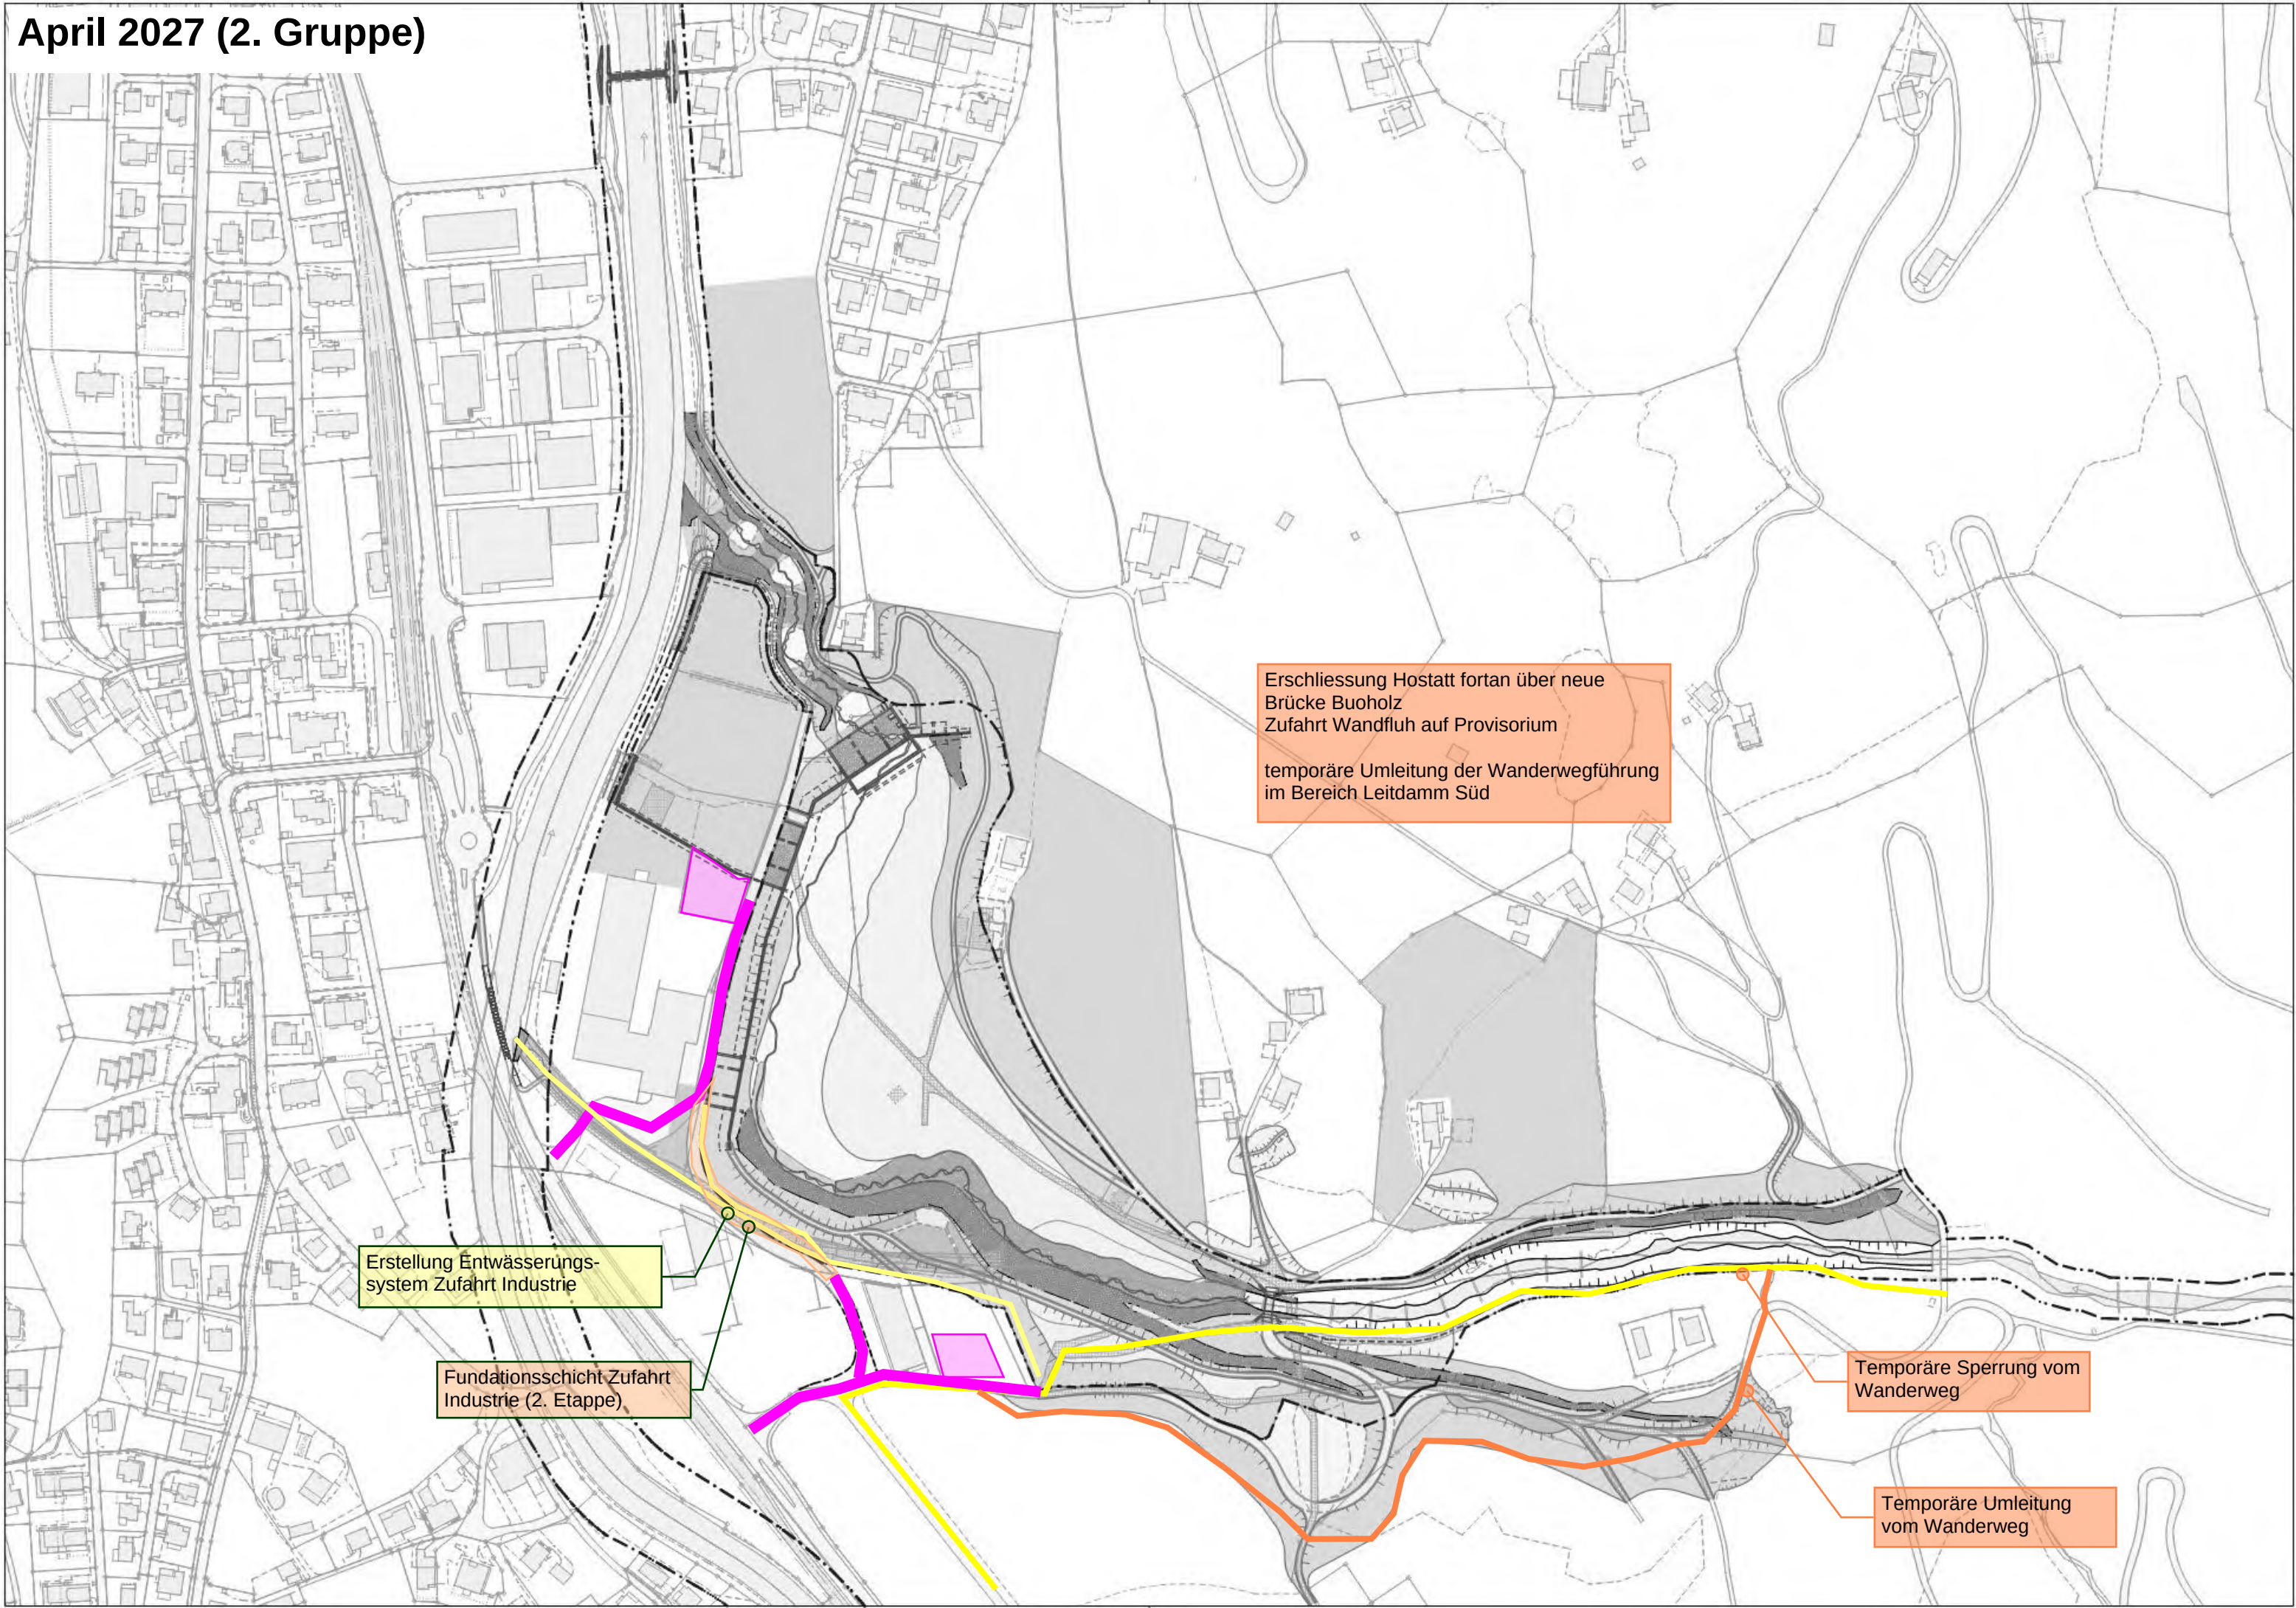

Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buoholz
Zufahrt Wandfluh auf Provisorium

temporäre Umleitung der Wanderwegführung
im Bereich Leitdamm Süd

Erstellung Entwässerungs-
system Zufahrt Industrie

Foundationsschicht Zufahrt
Industrie (2. Etappe)

Temporäre Sperrung vom
Wanderweg

Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

April / Mai 2027 (Belagsgruppe)

Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buholz


temporäre Umleitung der Wanderwegführung
im Bereich Leitdamm Süd

Belagsarbeiten Zufahrt Hofwald (2. Etappe)

Belagsarbeiten Wandfluhstrasse,
Zufahrt Brücke Buholz

Temporäre Sperrung vom Wanderweg

Temporäre Umleitung vom Wanderweg

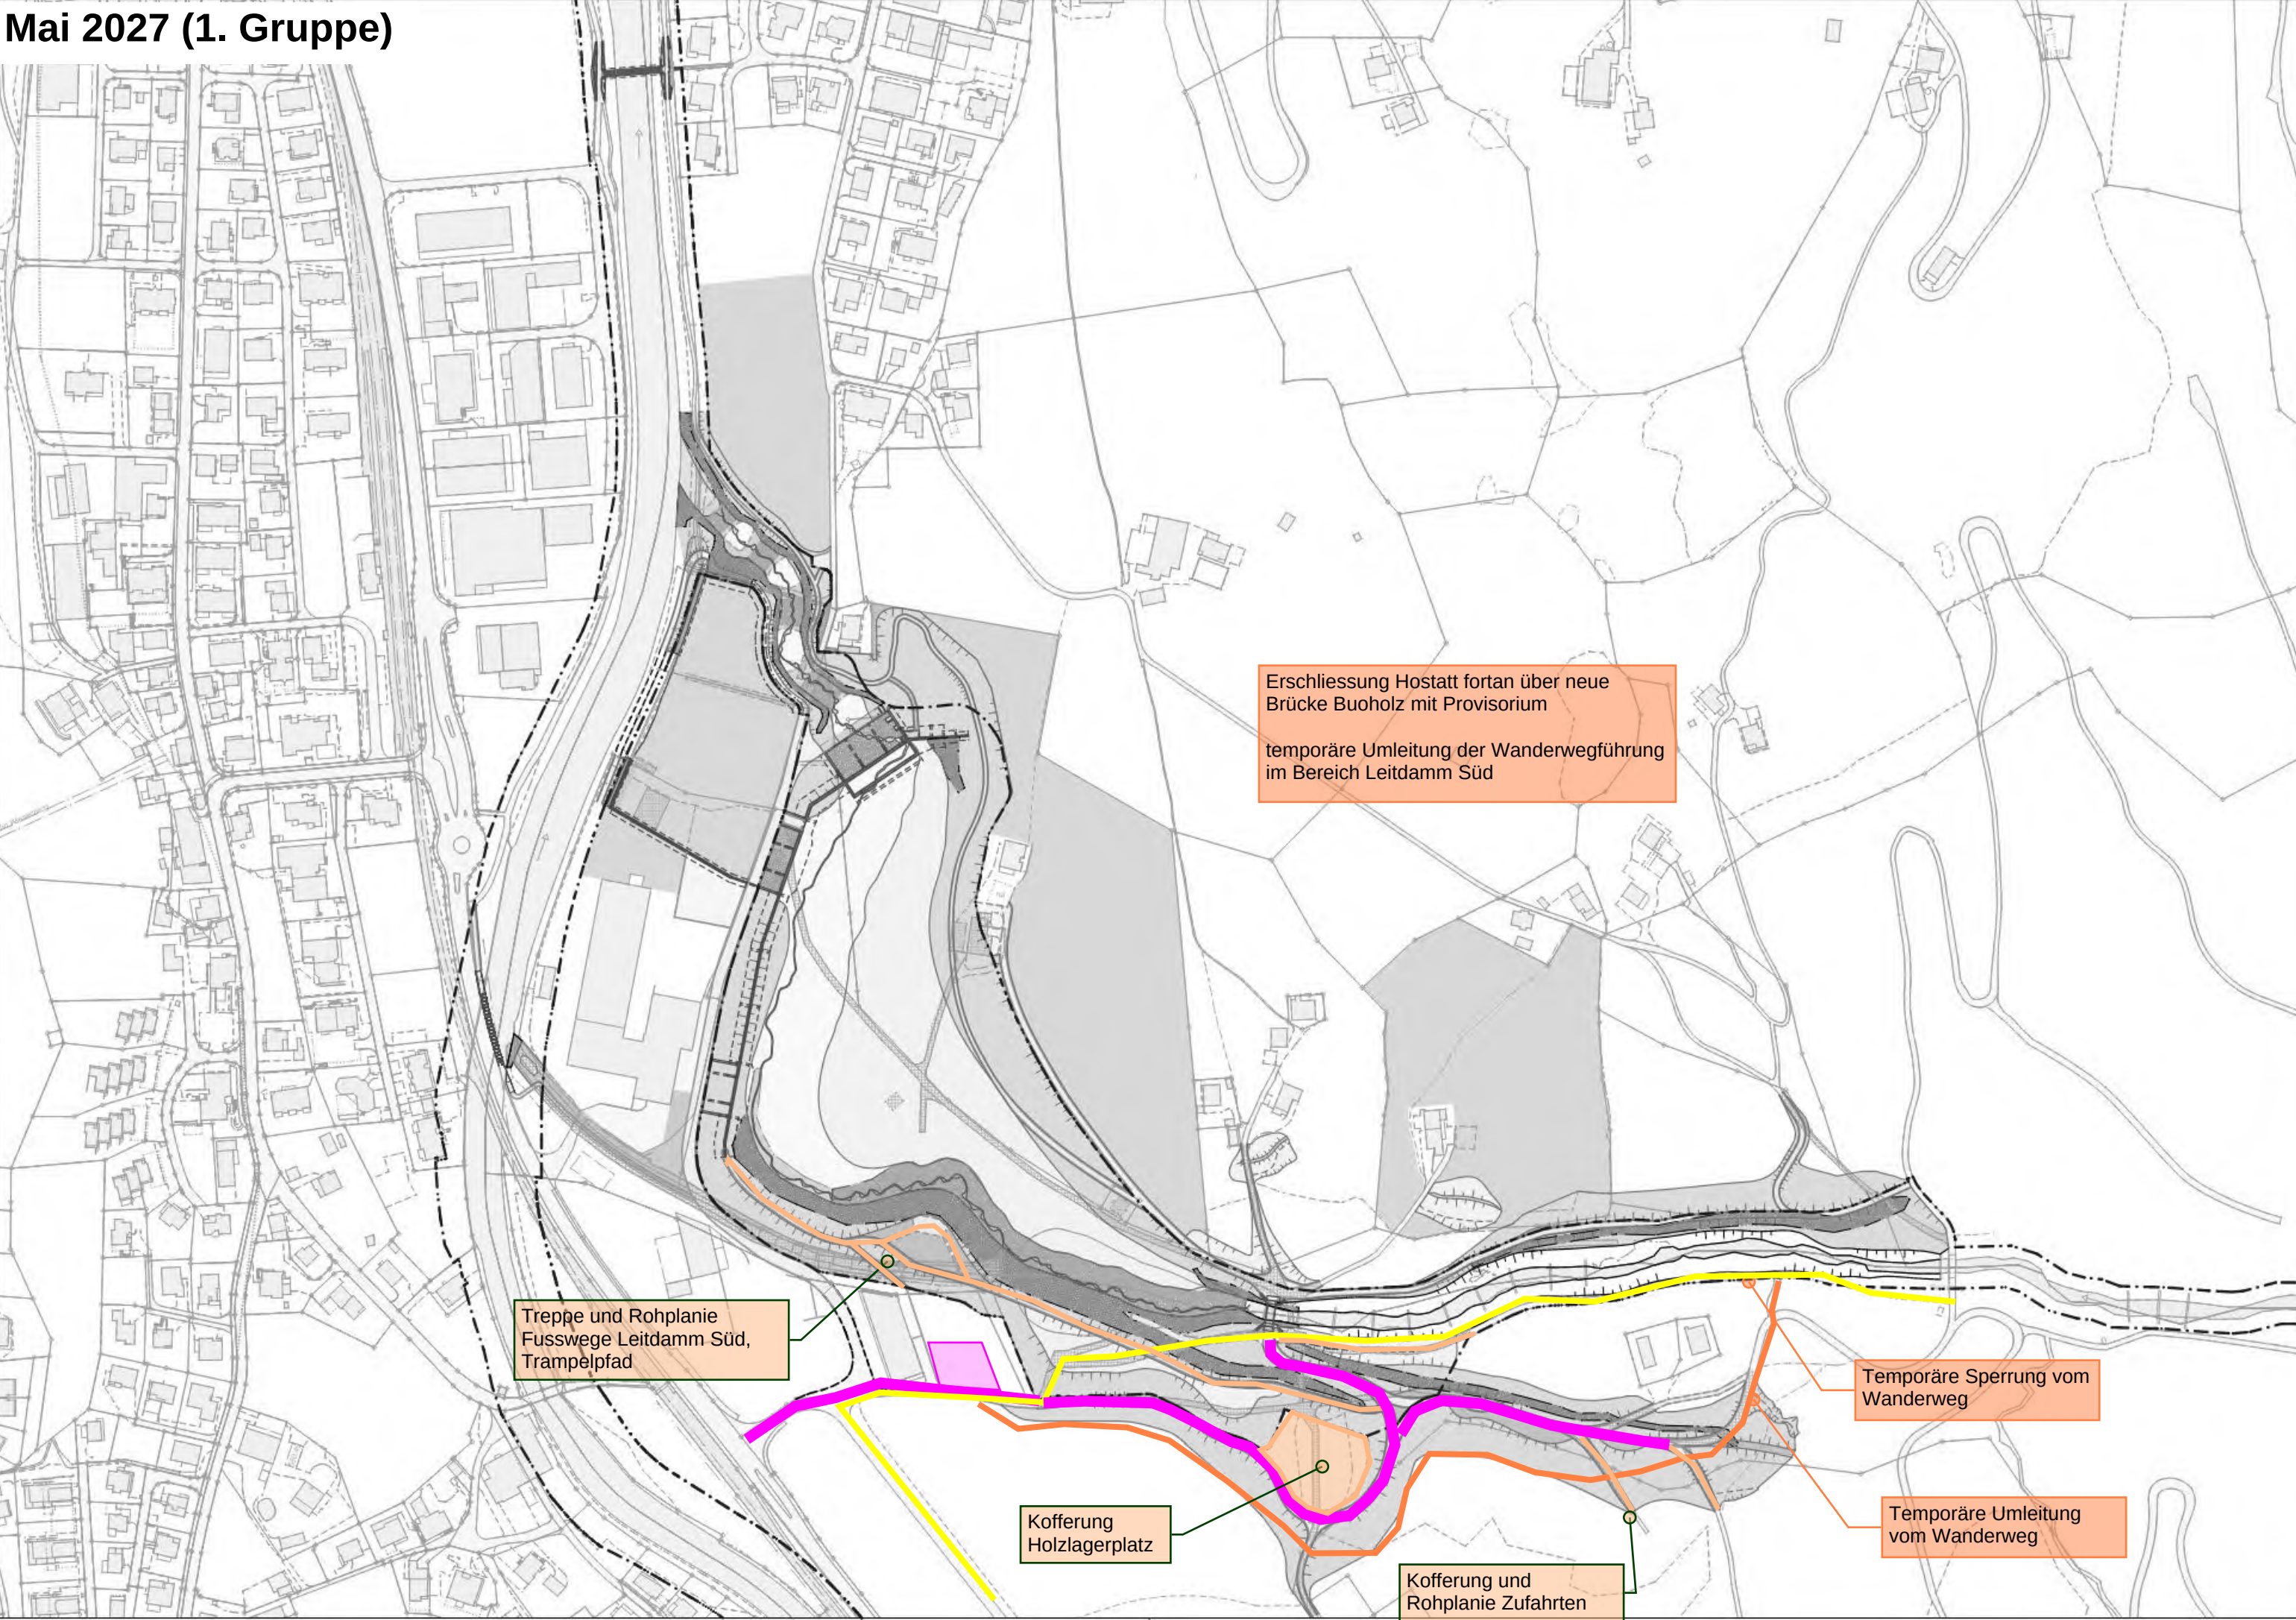

Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buoholz mit Provisorium
temporäre Umleitung der Wanderwegführung
im Bereich Leitdamm Süd


Treppe und Rohplanie
Fusswege Leitdamm Süd,
Trampelpfad

Kofferung
Holzlagerplatz

Kofferung und
Rohplanie Zufahrten

Temporäre Sperrung vom
Wanderweg

Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

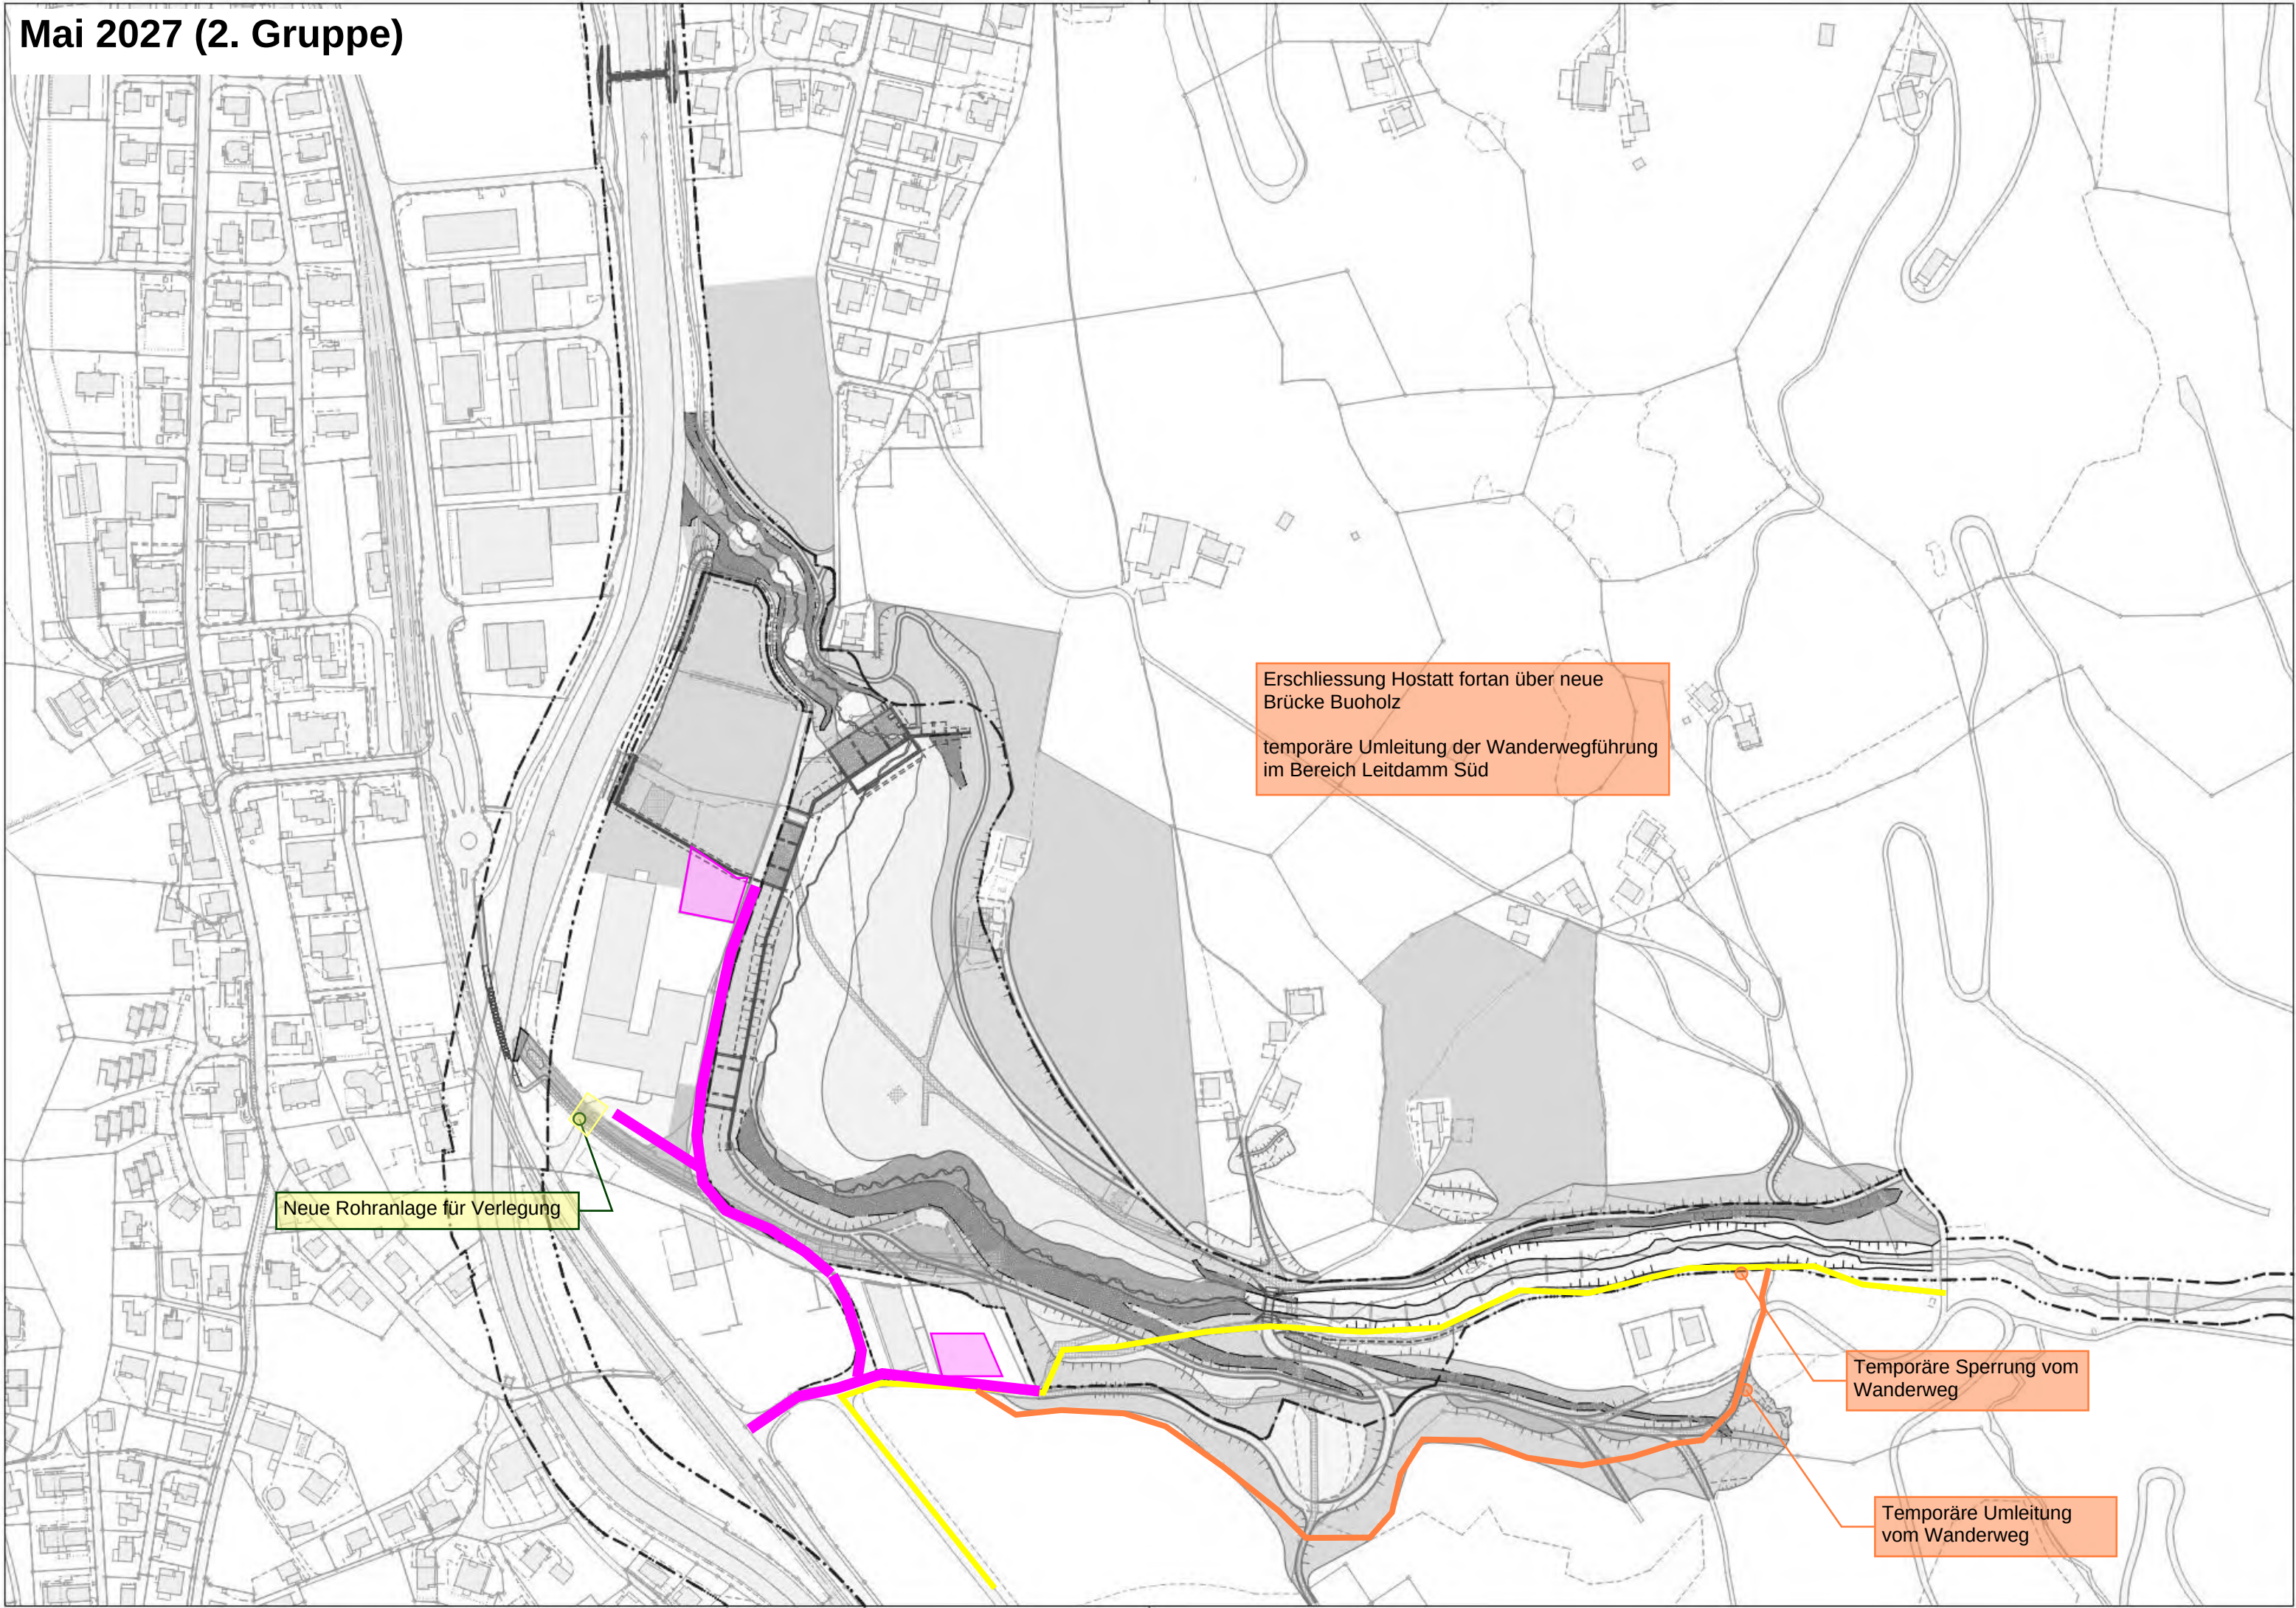


Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buoholz


temporäre Umleitung der Wanderwegführung
im Bereich Leitdamm Süd

Neue Rohranlage für Verlegung

Temporäre Sperrung vom
Wanderweg

Temporäre Umleitung
vom Wanderweg

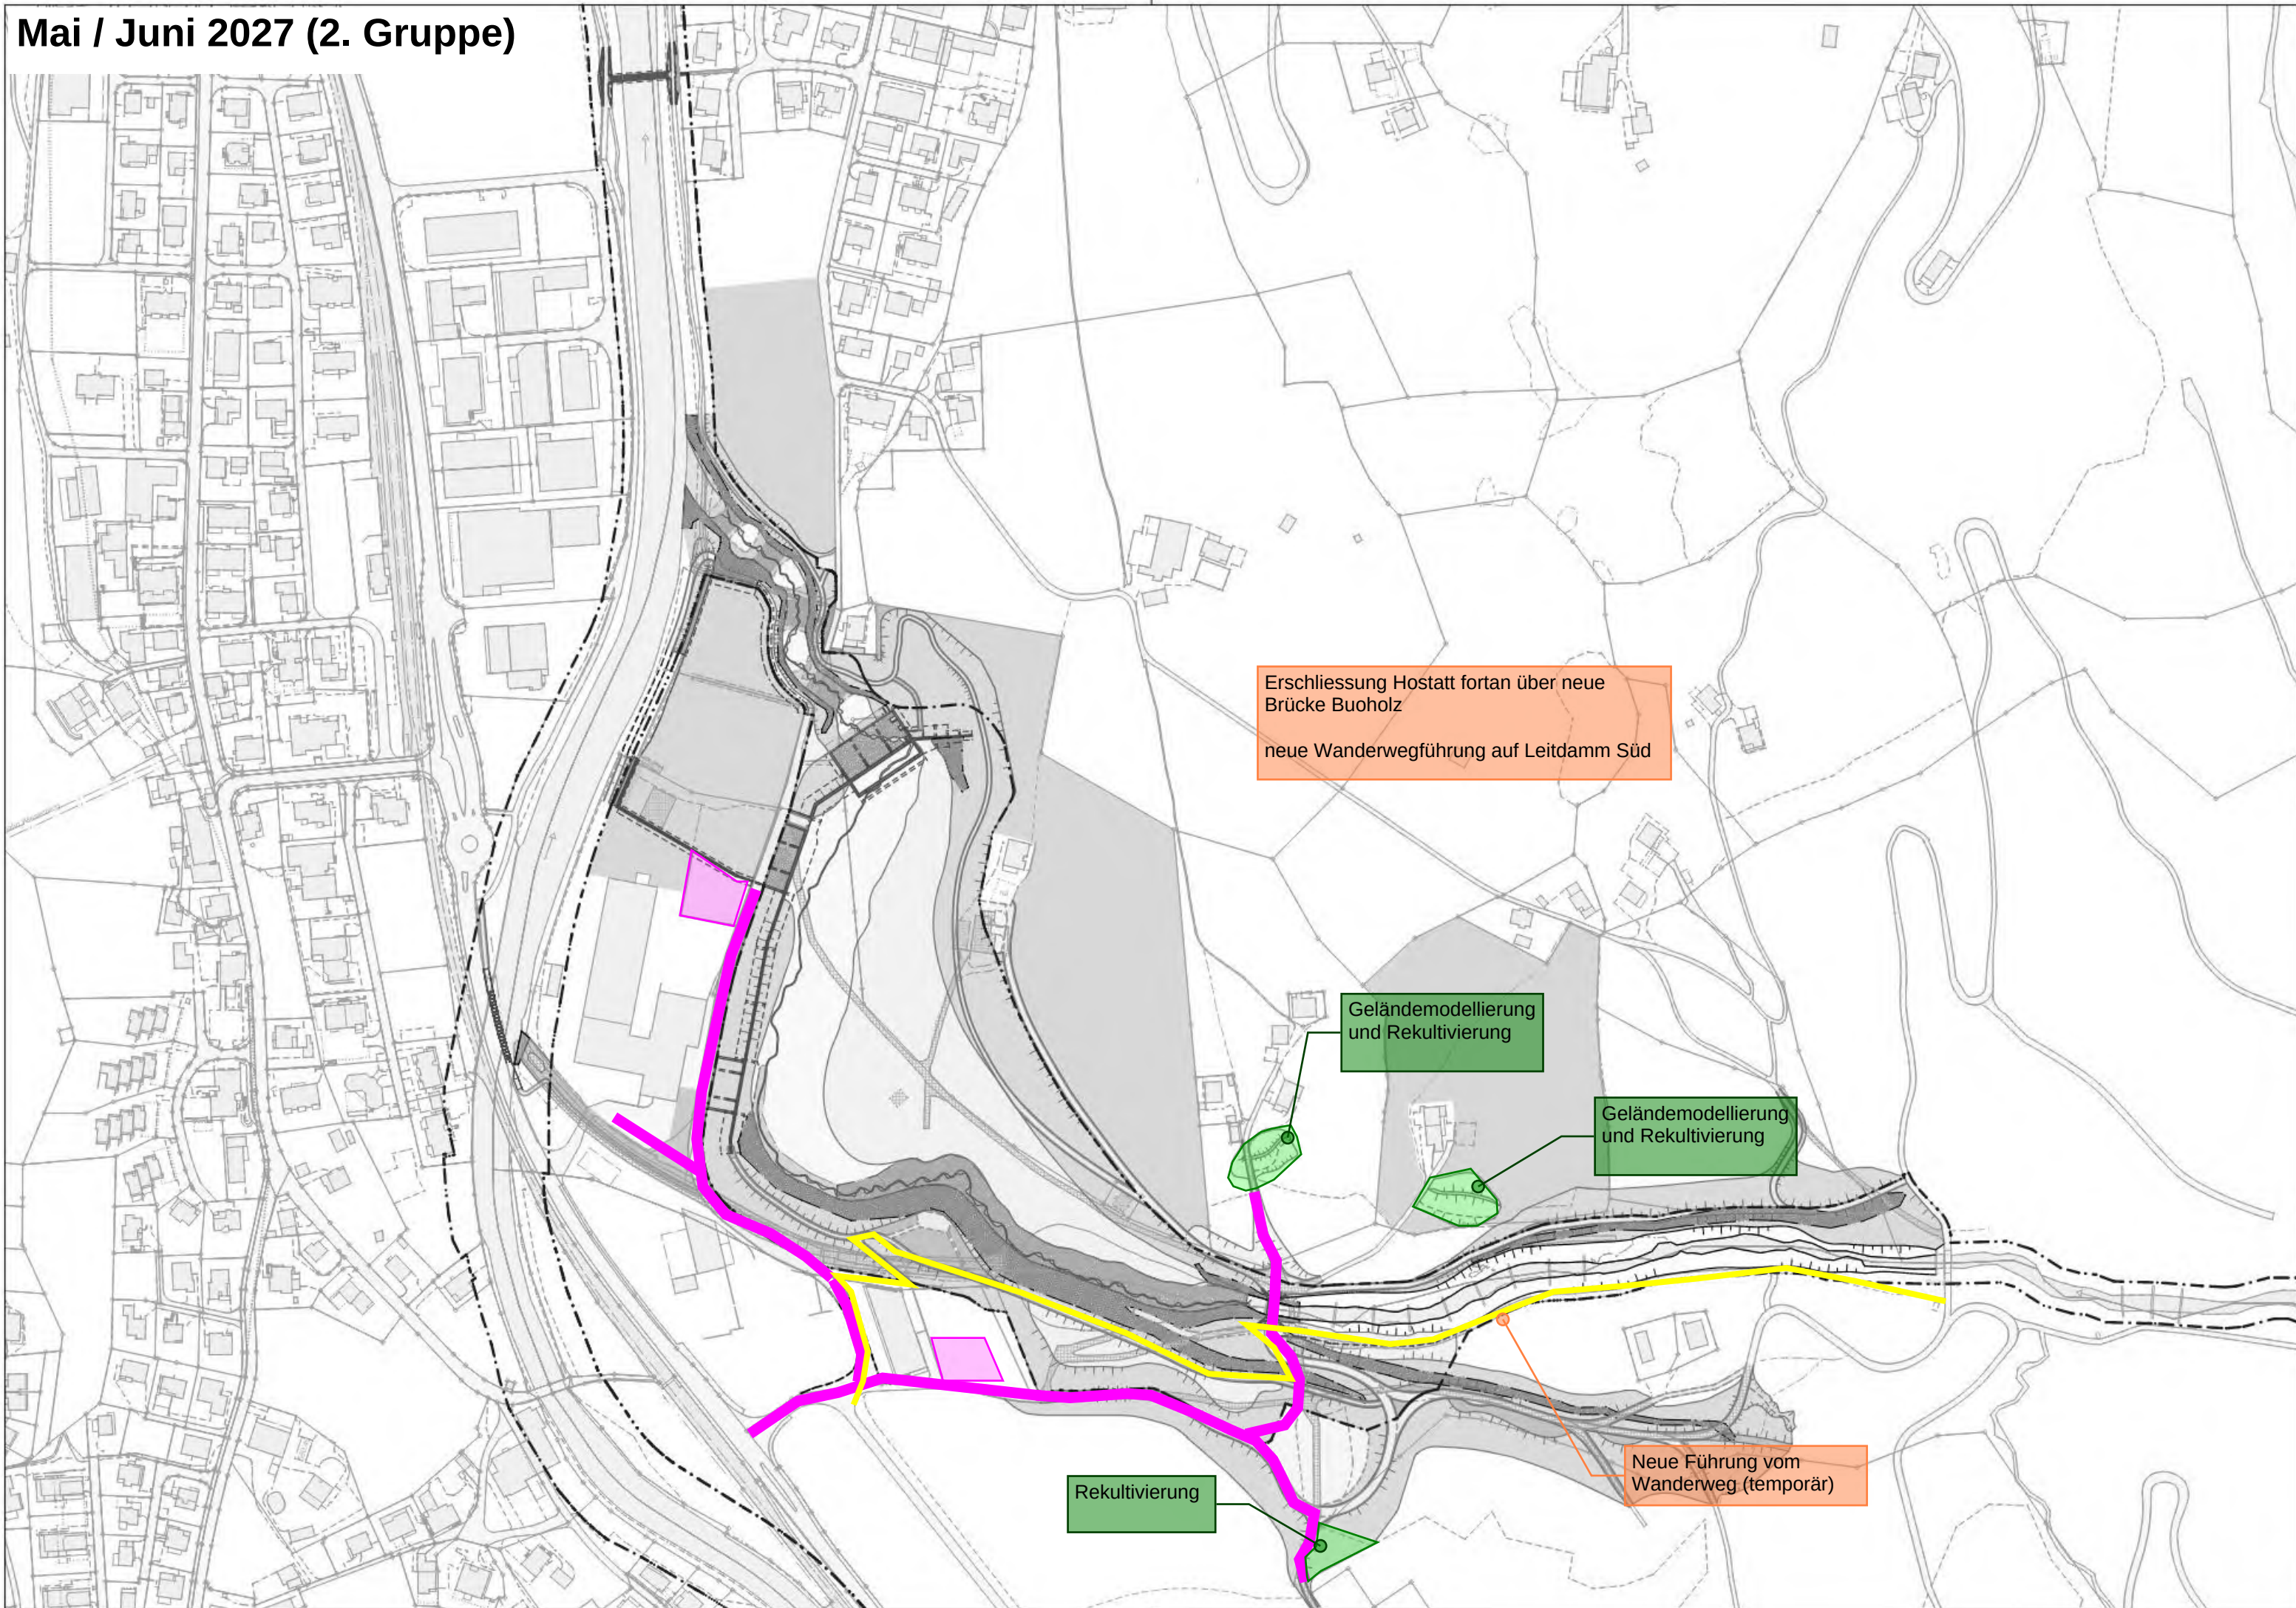

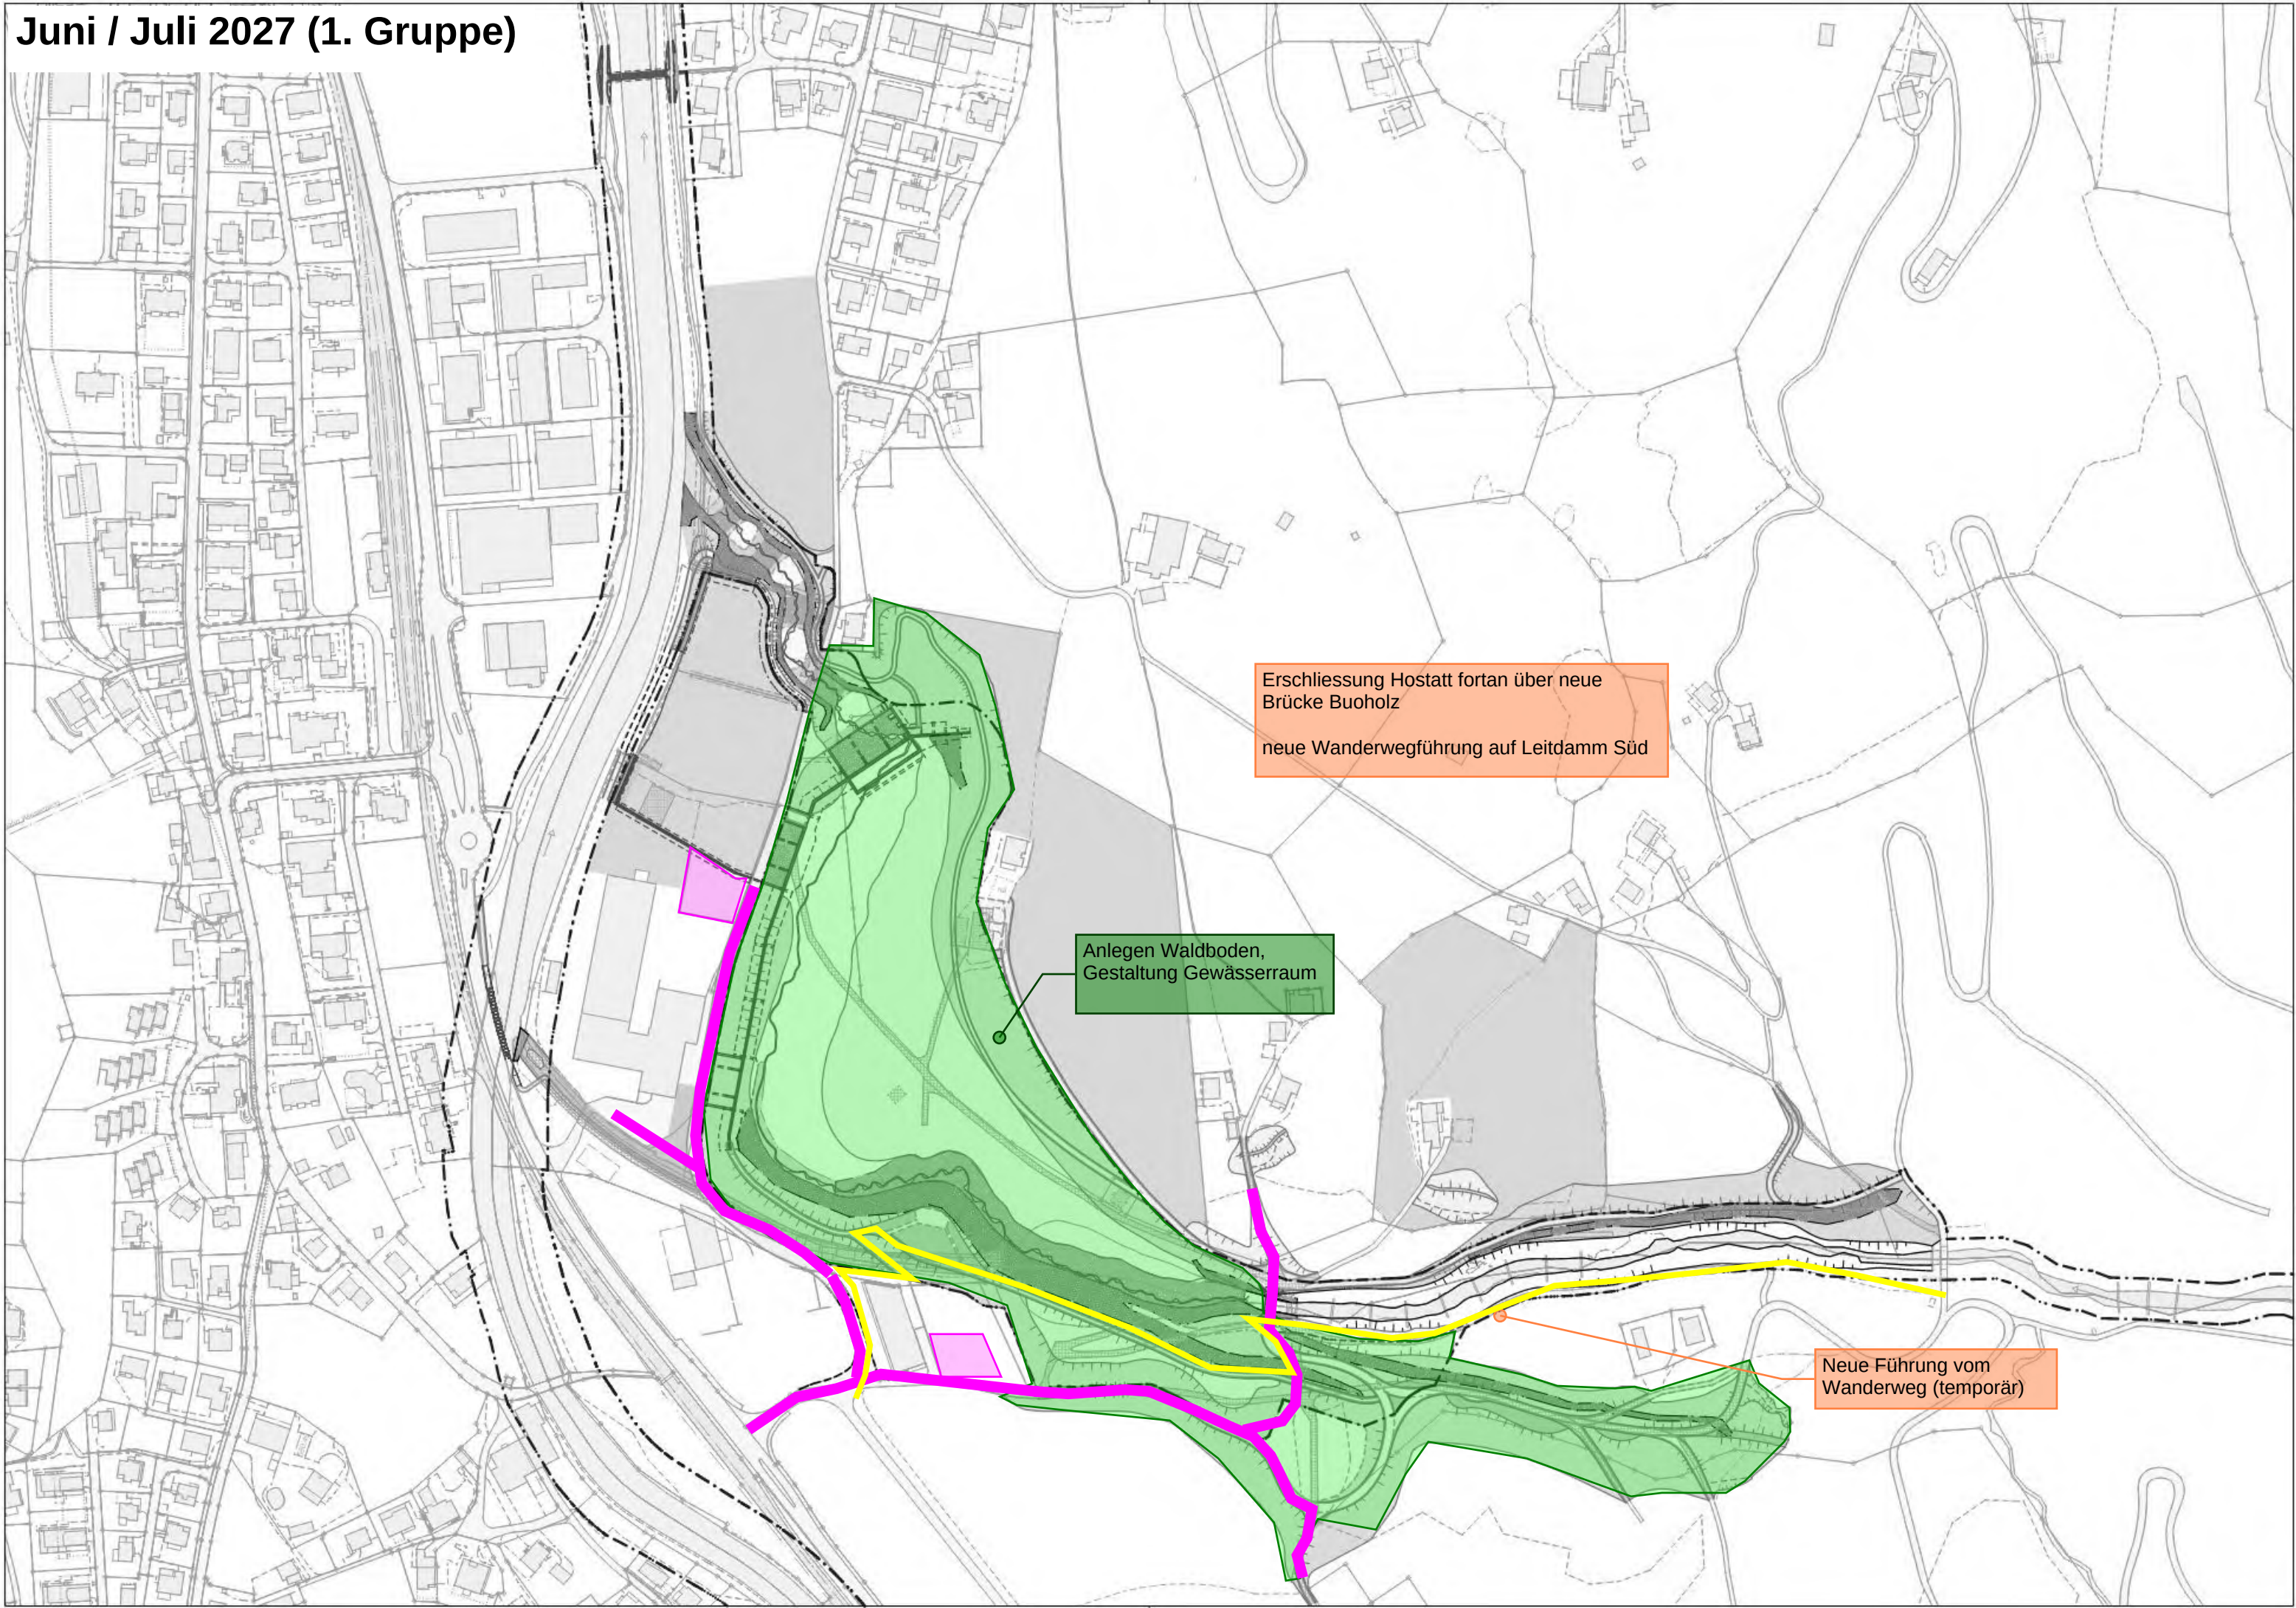


Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buoholz
neue Wanderwegführung auf Leitdamm Süd


Anlegen Waldboden,
Gestaltung Gewässerraum

Neue Führung vom
Wanderweg (temporär)


Juni / Juli 2027 (2. Gruppe, Unternehmer Fussgängersteg Kantonsstrasse)

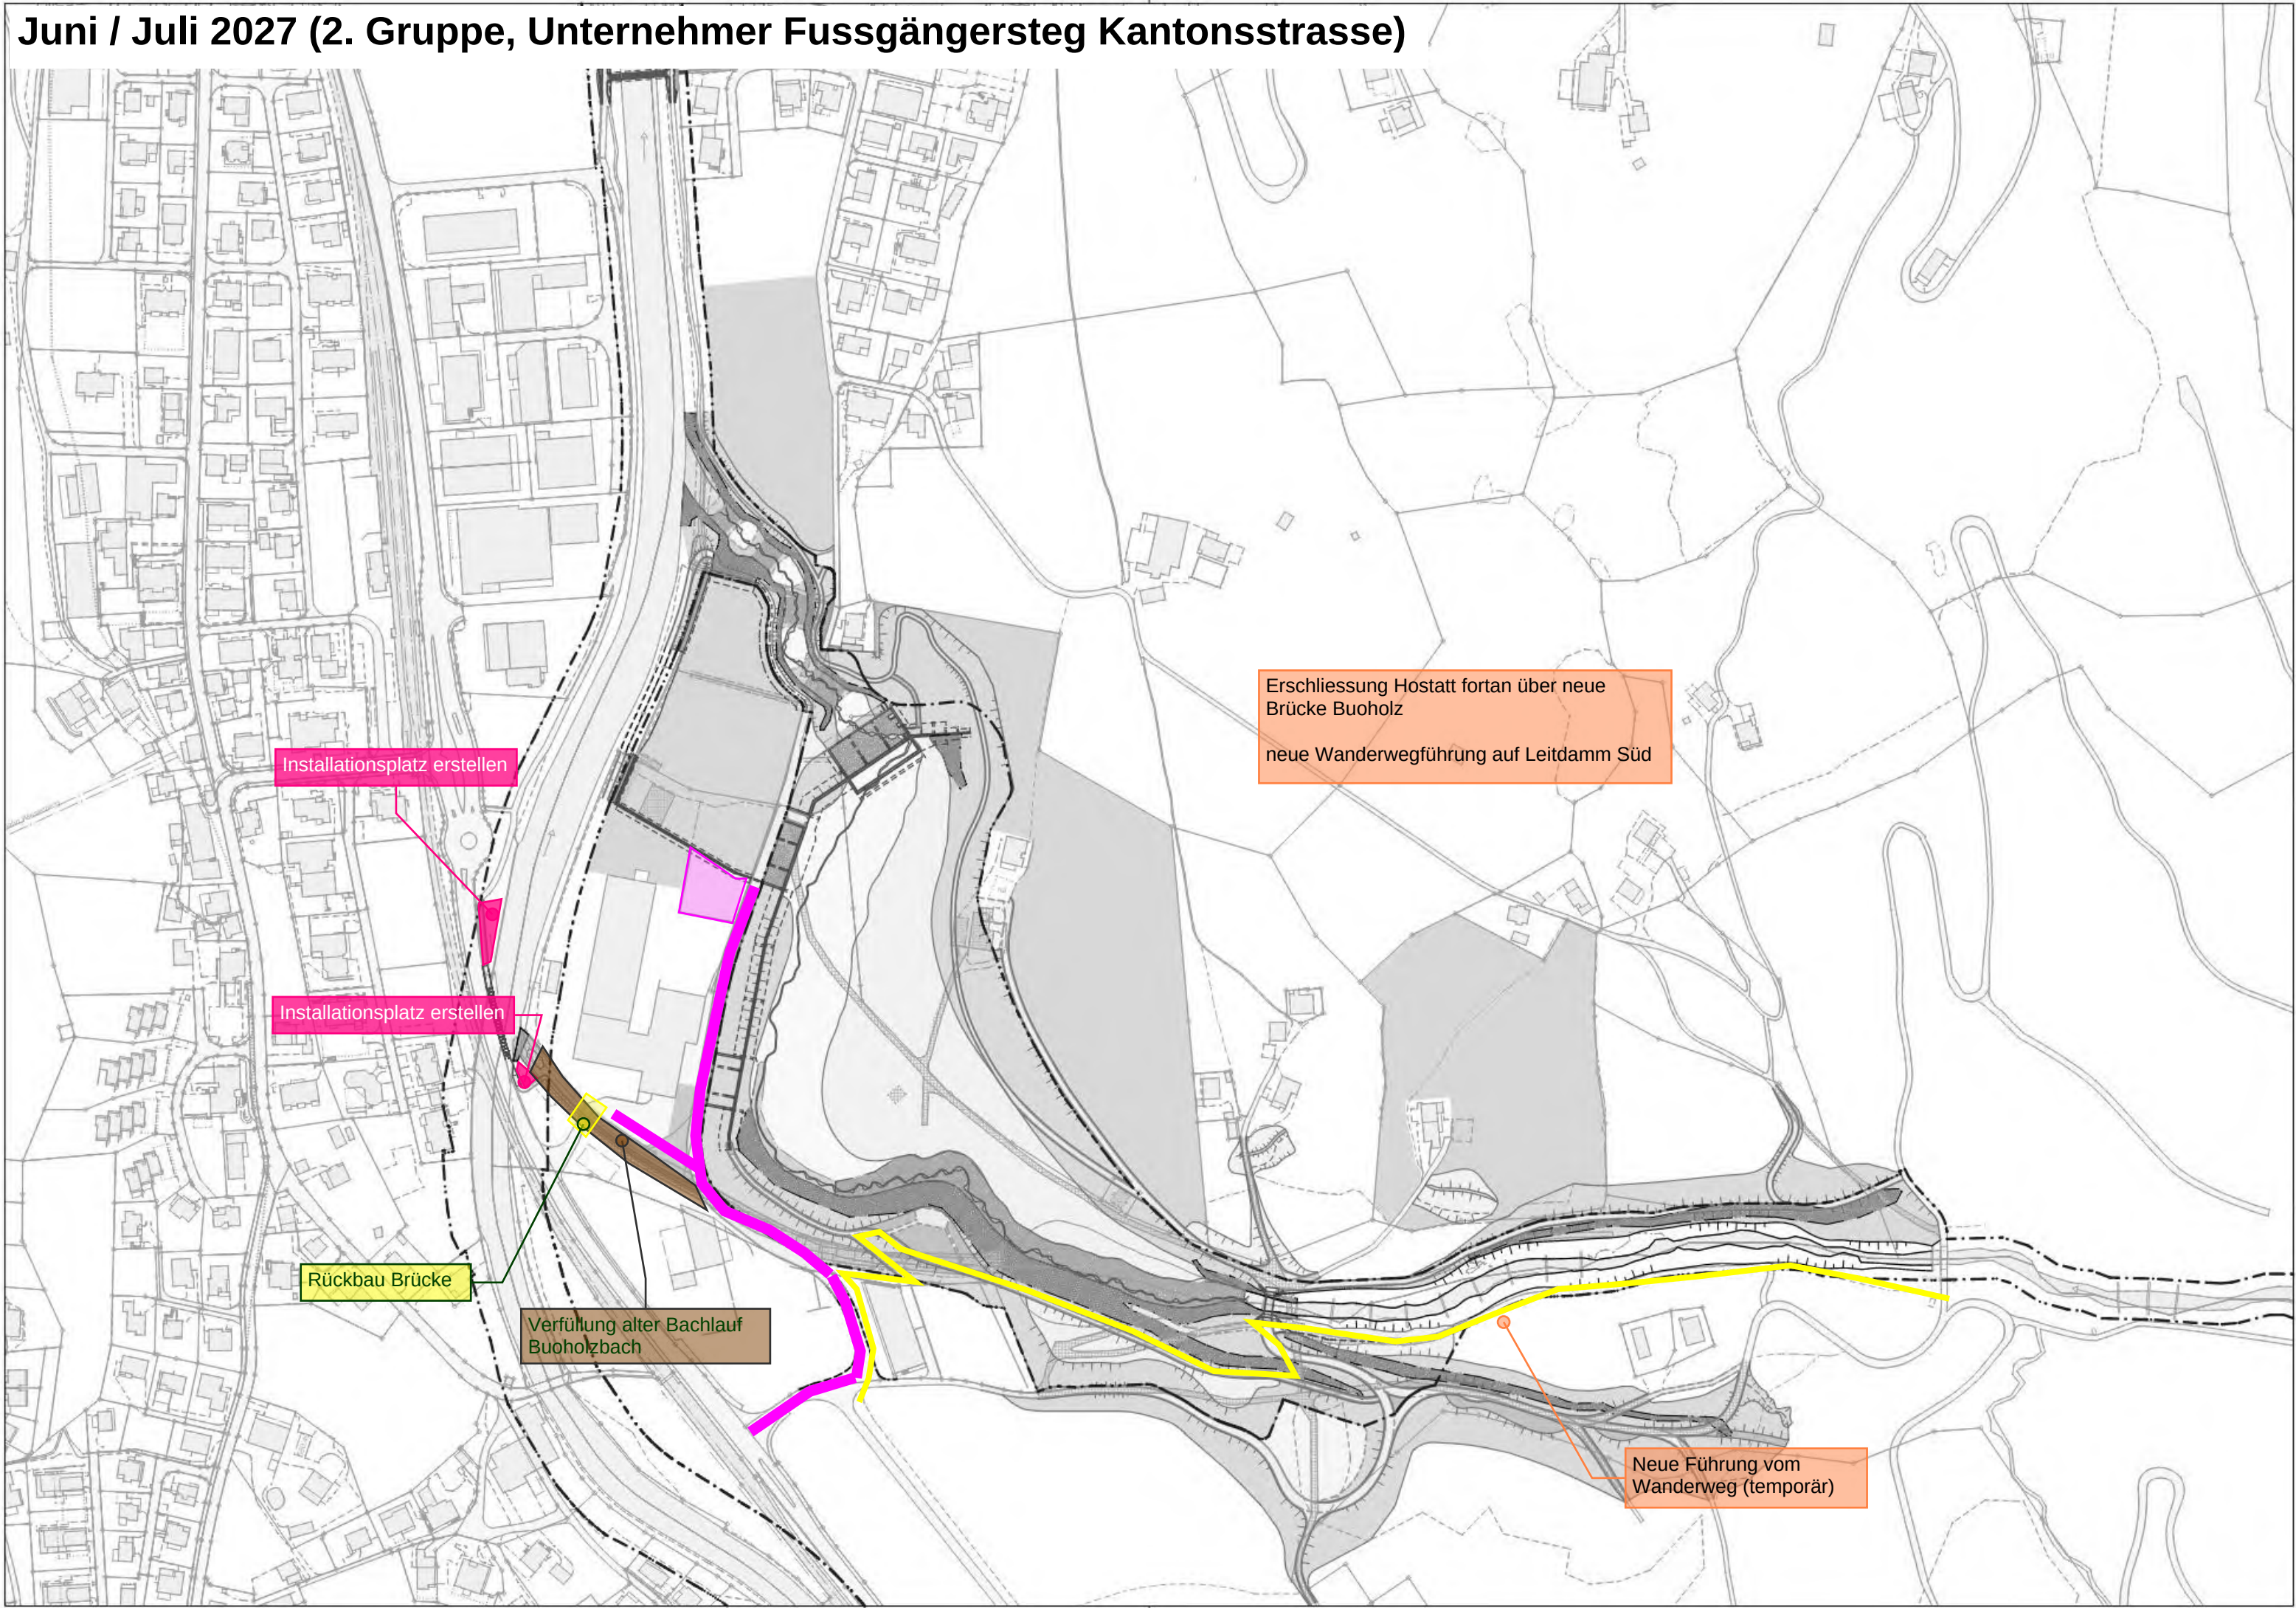

Juli 2027 (Belagsgruppe)

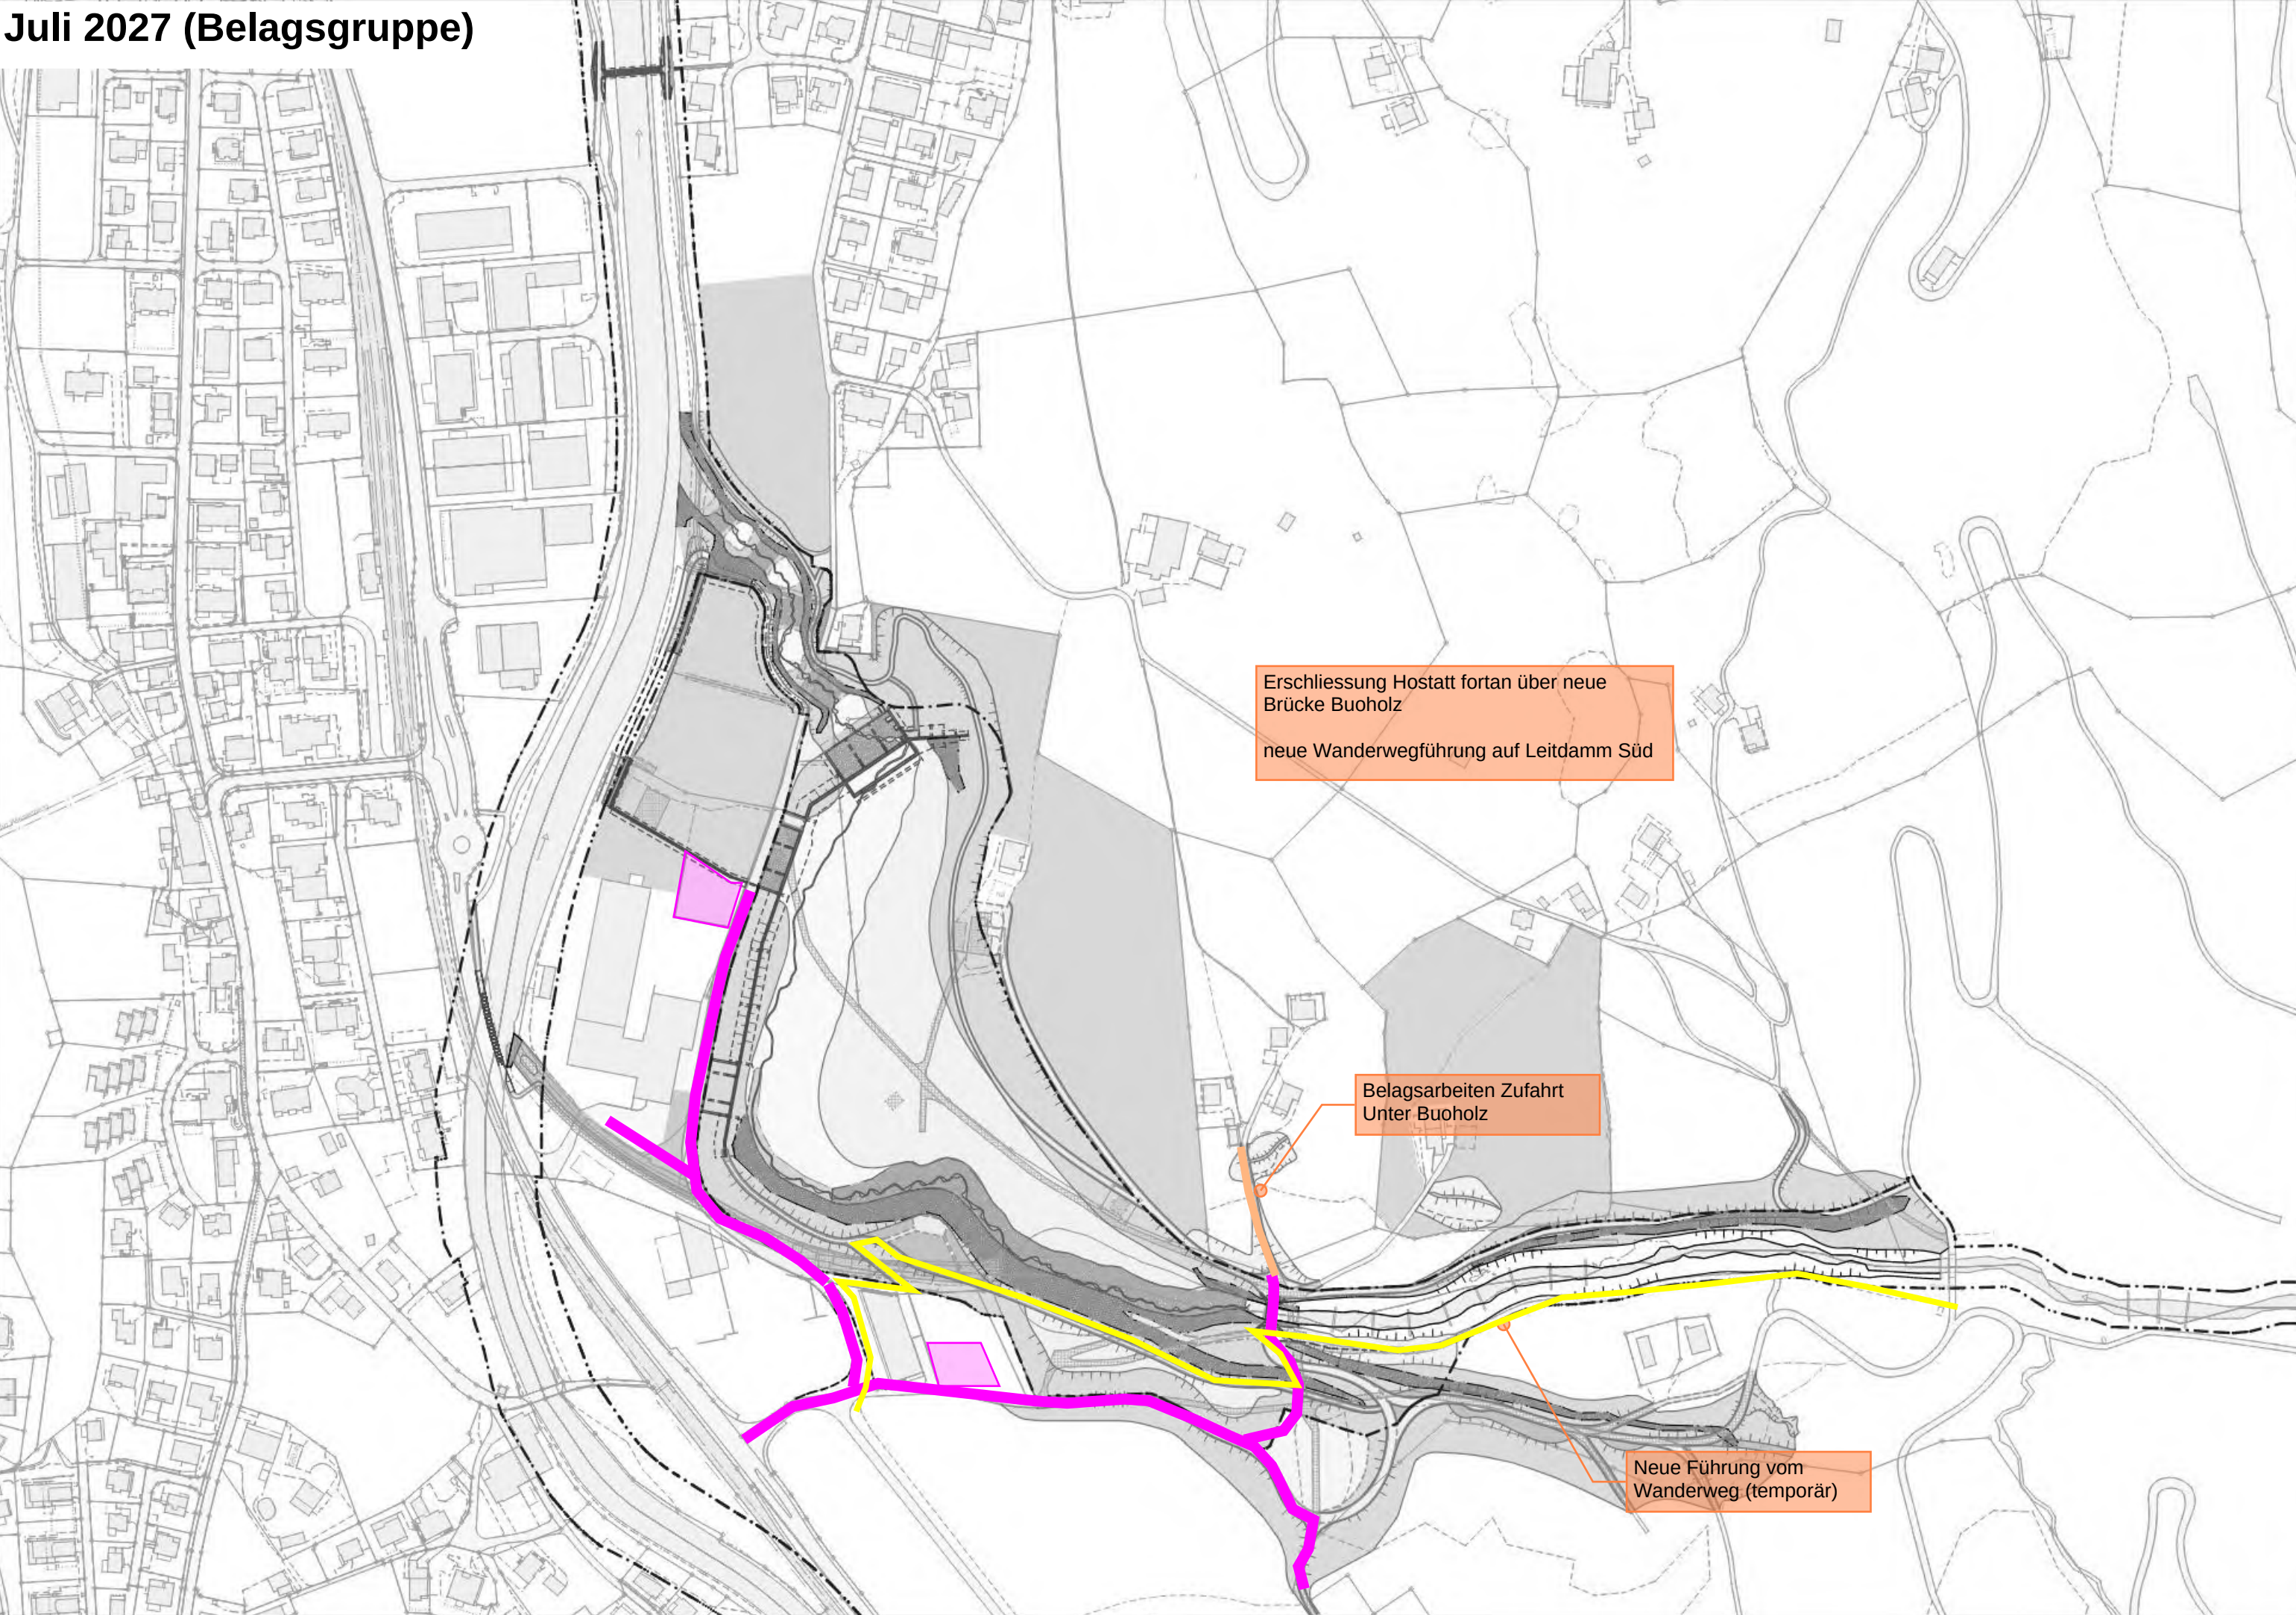

August / September 2027 (Unternehmer Fussgängersteg Kantonsstrasse)

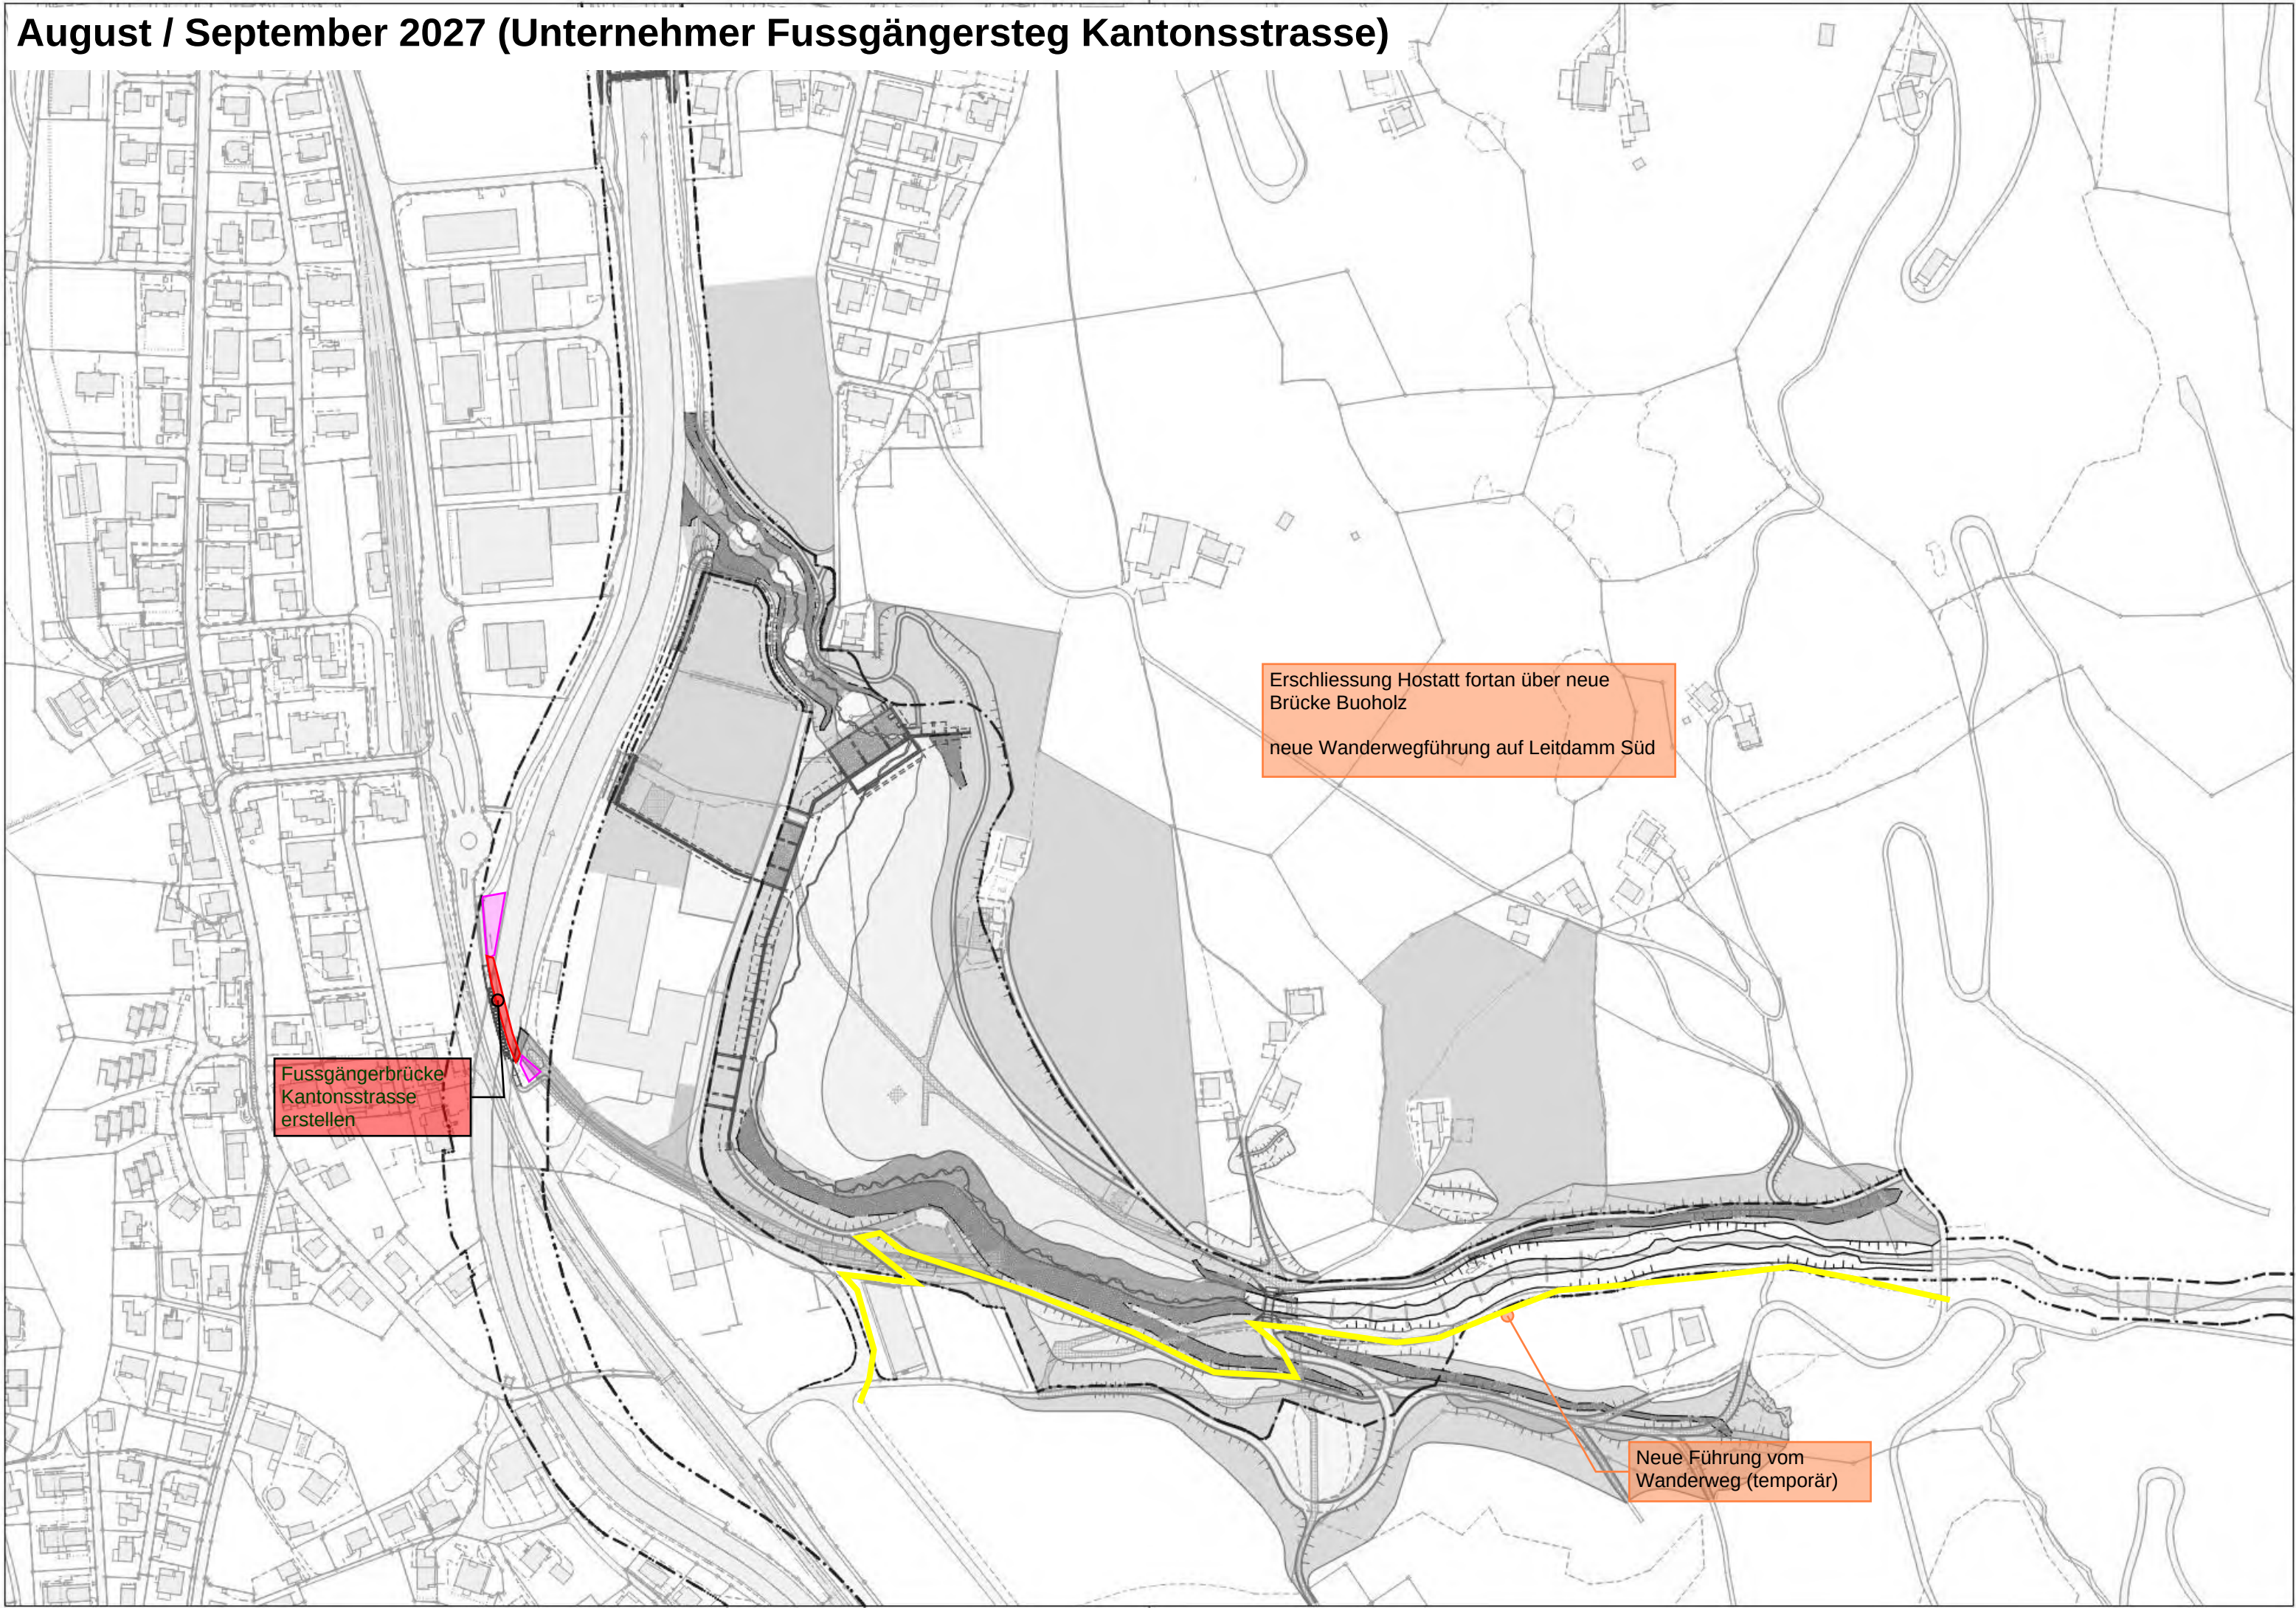


Fussgängerbrücke
Kantonsstrasse
erstellen

Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buoholz

neue Wanderwegführung auf Leitdamm Süd

Neue Führung vom
Wanderweg (temporär)

September / Oktober 2027 (Unternehmer Fussgängersteg Kantonsstrasse)

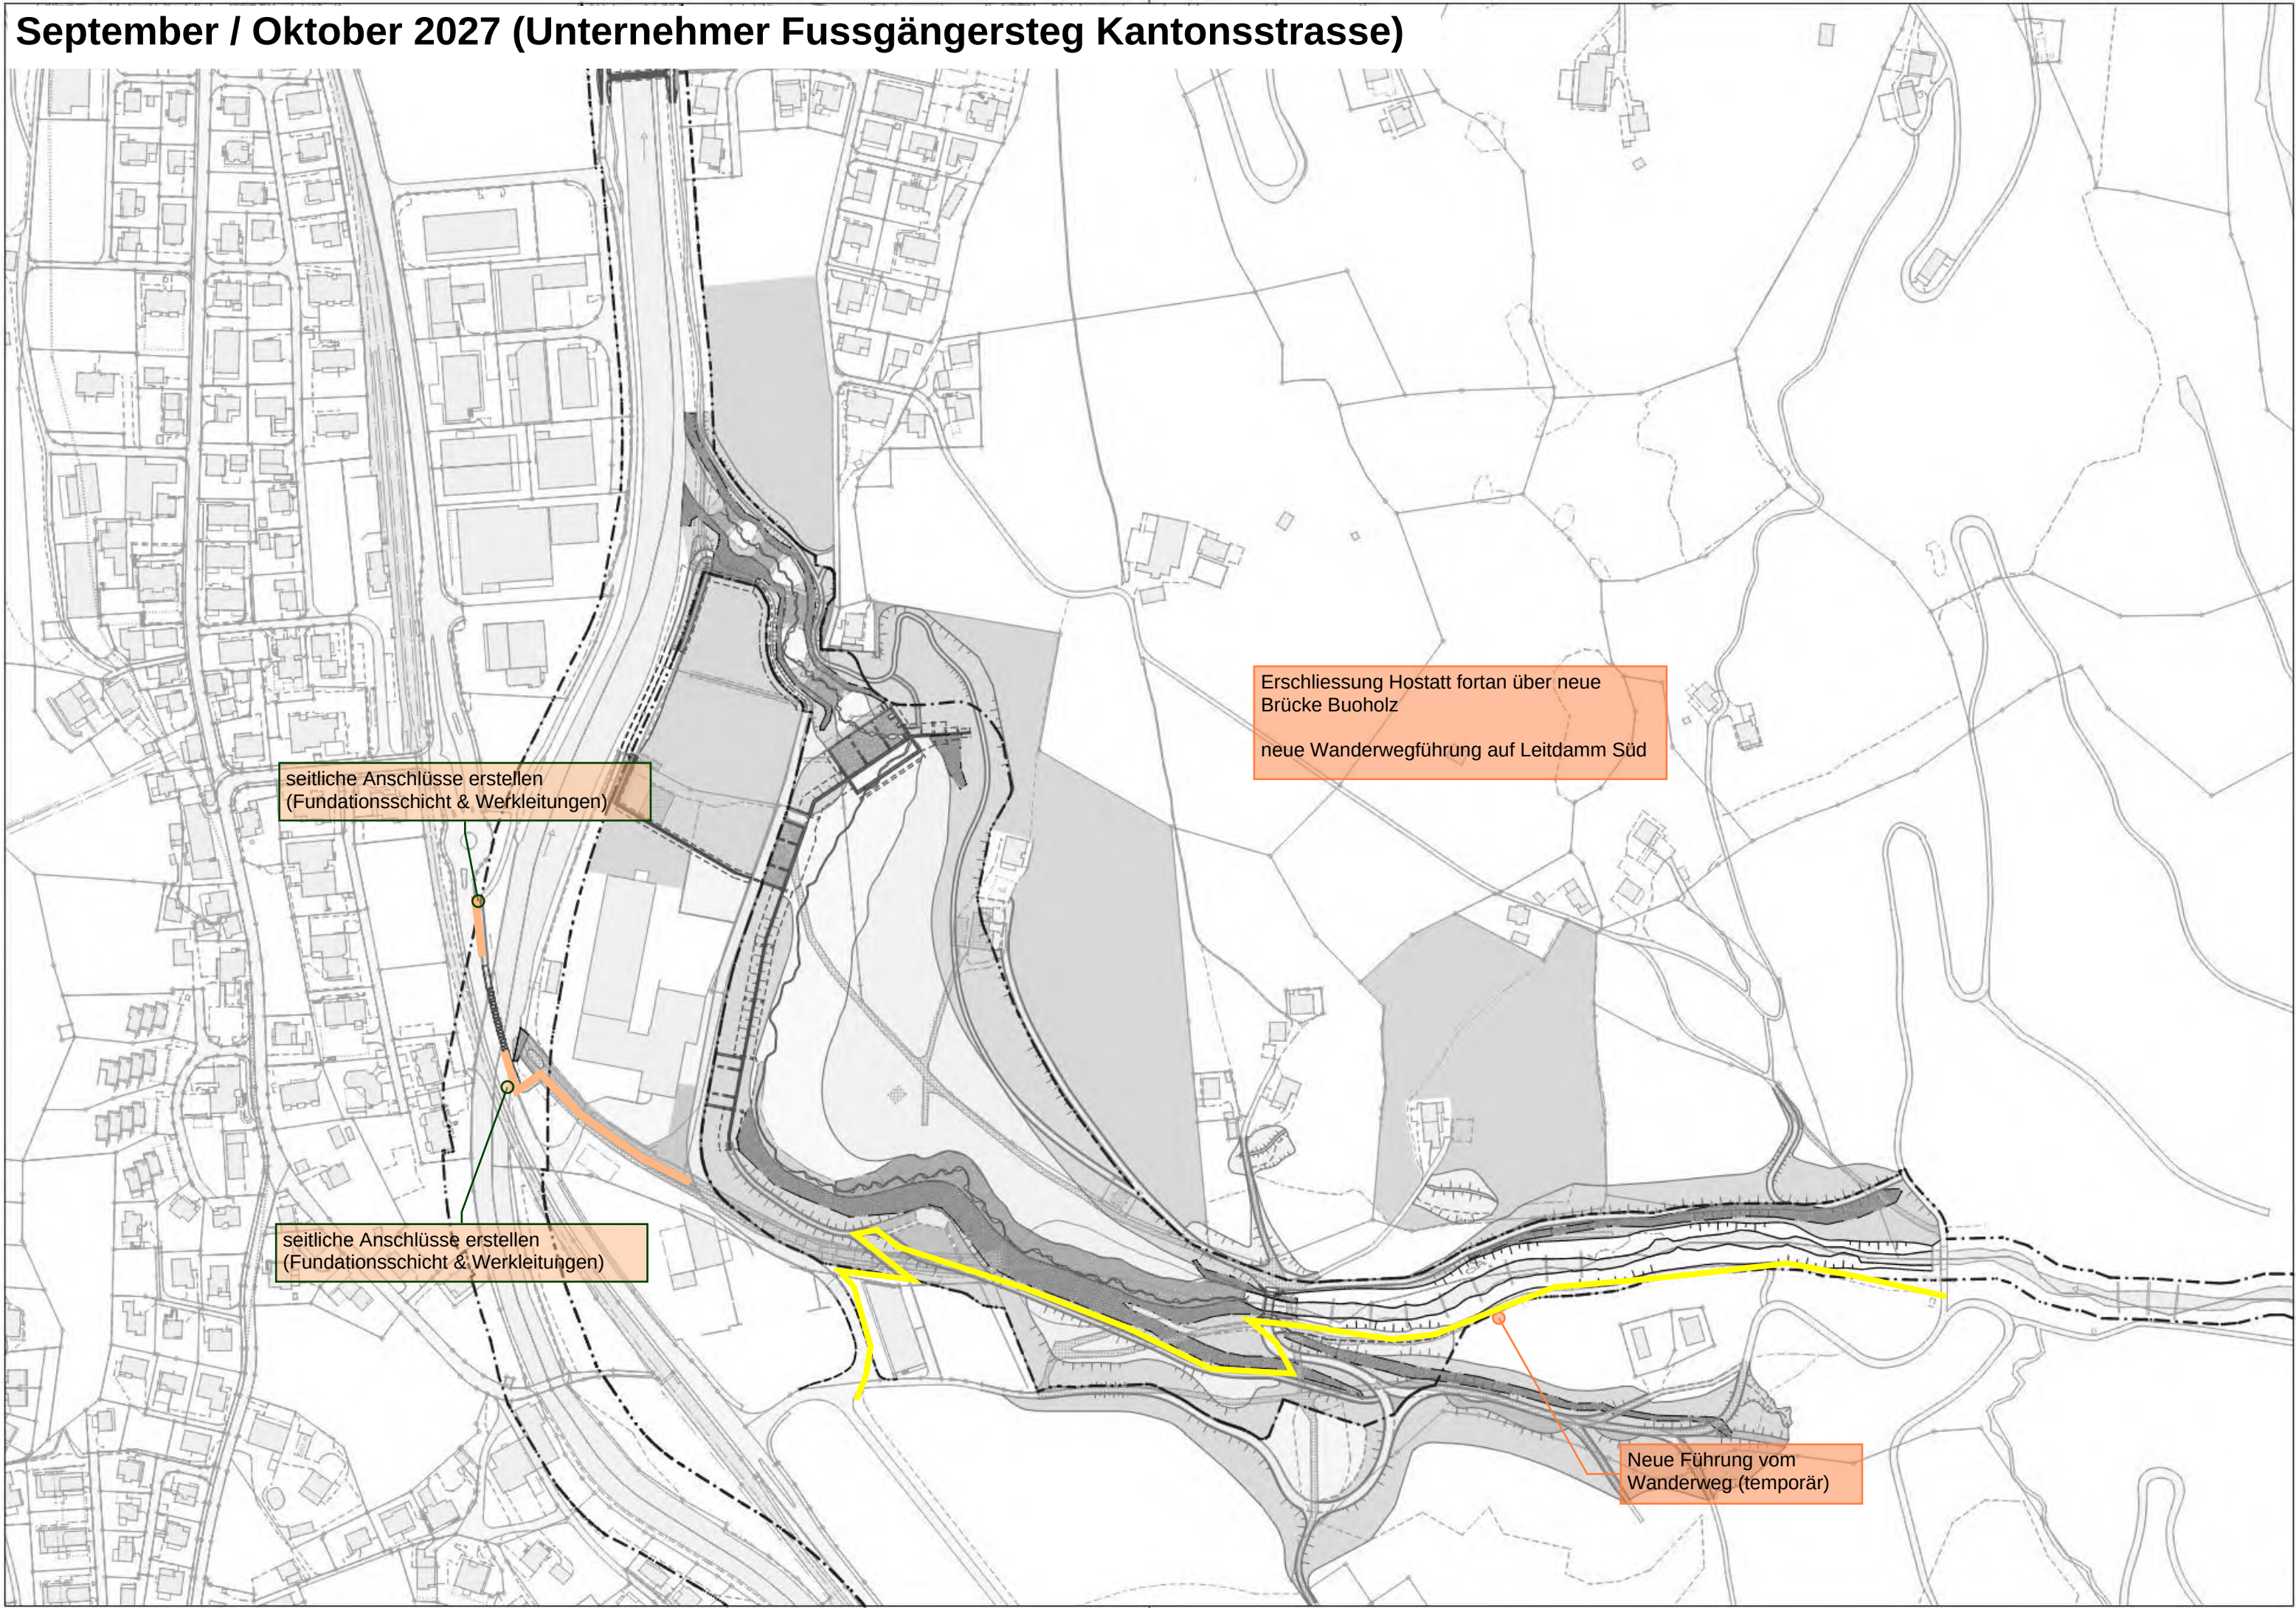

seitliche Anschlüsse erstellen
(Fundationsschicht & Werkleitungen)


seitliche Anschlüsse erstellen
(Fundationsschicht & Werkleitungen)

Erschliessung Hostatt fortan über neue
Brücke Buoholz

neue Wanderwegführung auf Leitdamm Süd

Neue Führung vom
Wanderweg (temporär)

Oktober 2027 (Forst)

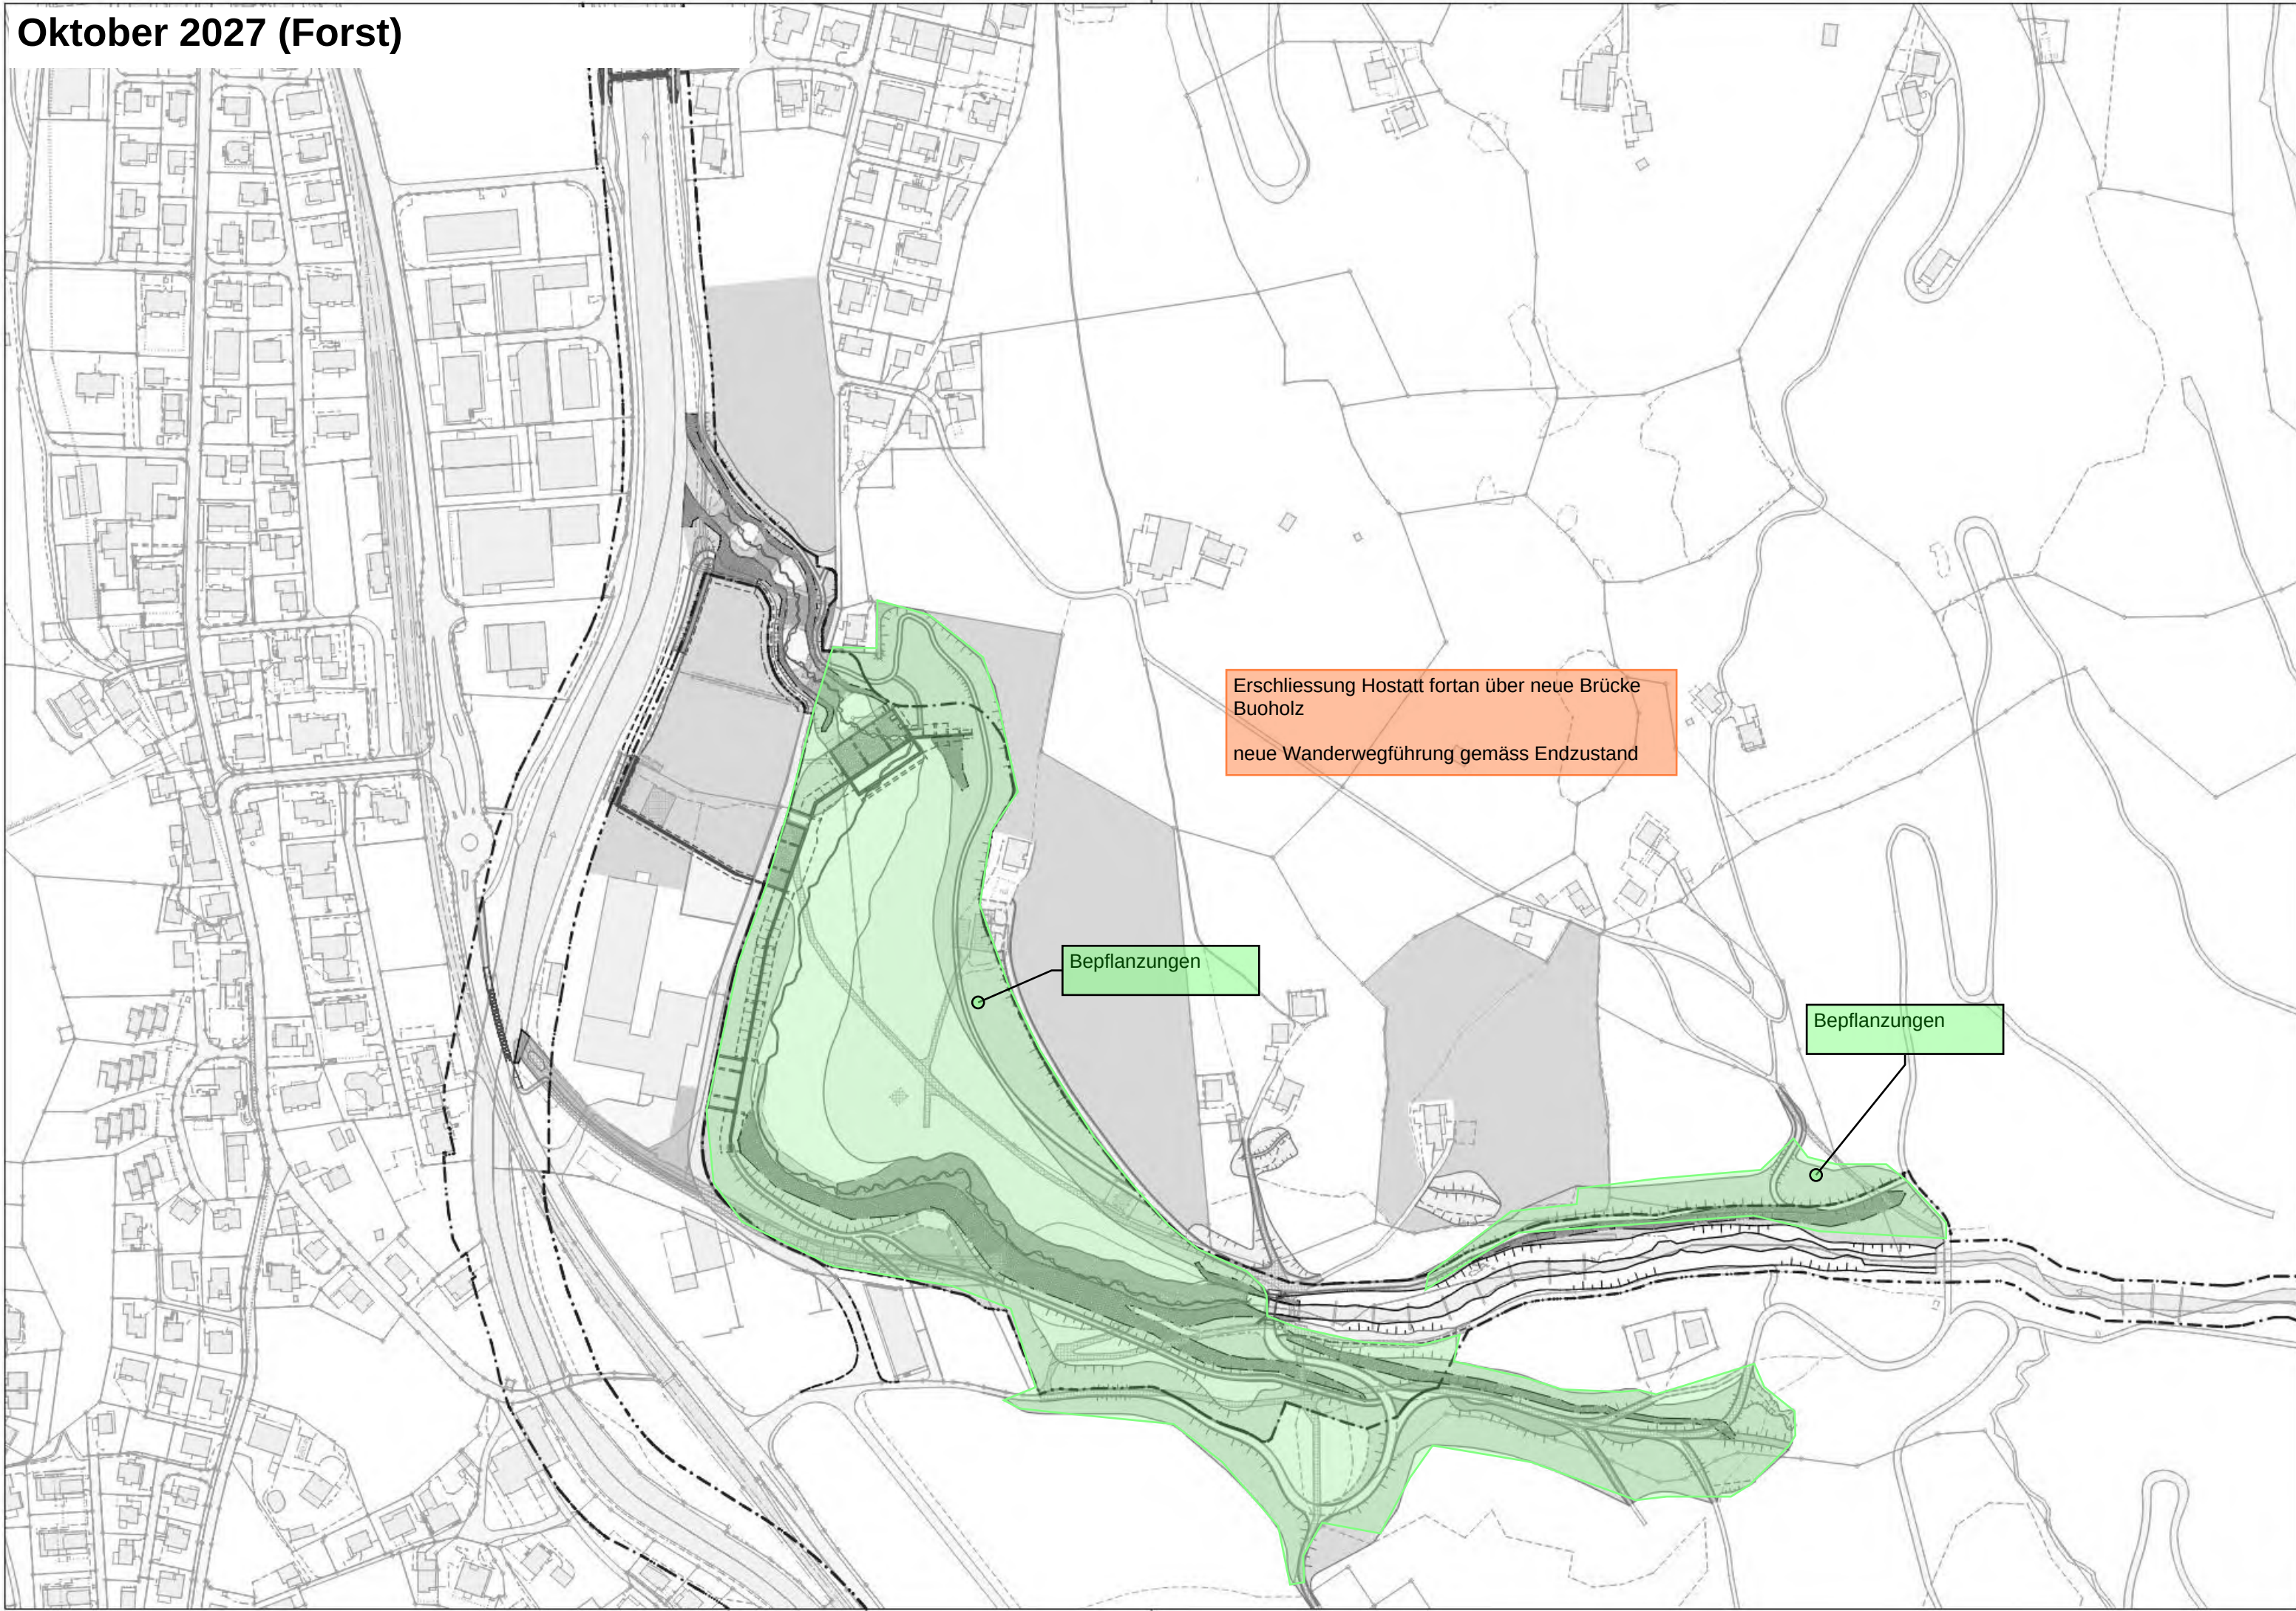


Erschliessung Hostatt fortan über neue Brücke
Buholz
neue Wanderwegführung gemäss Endzustand


Bepflanzungen

Bepflanzungen


Oktober 2027 (Belagsgruppe)

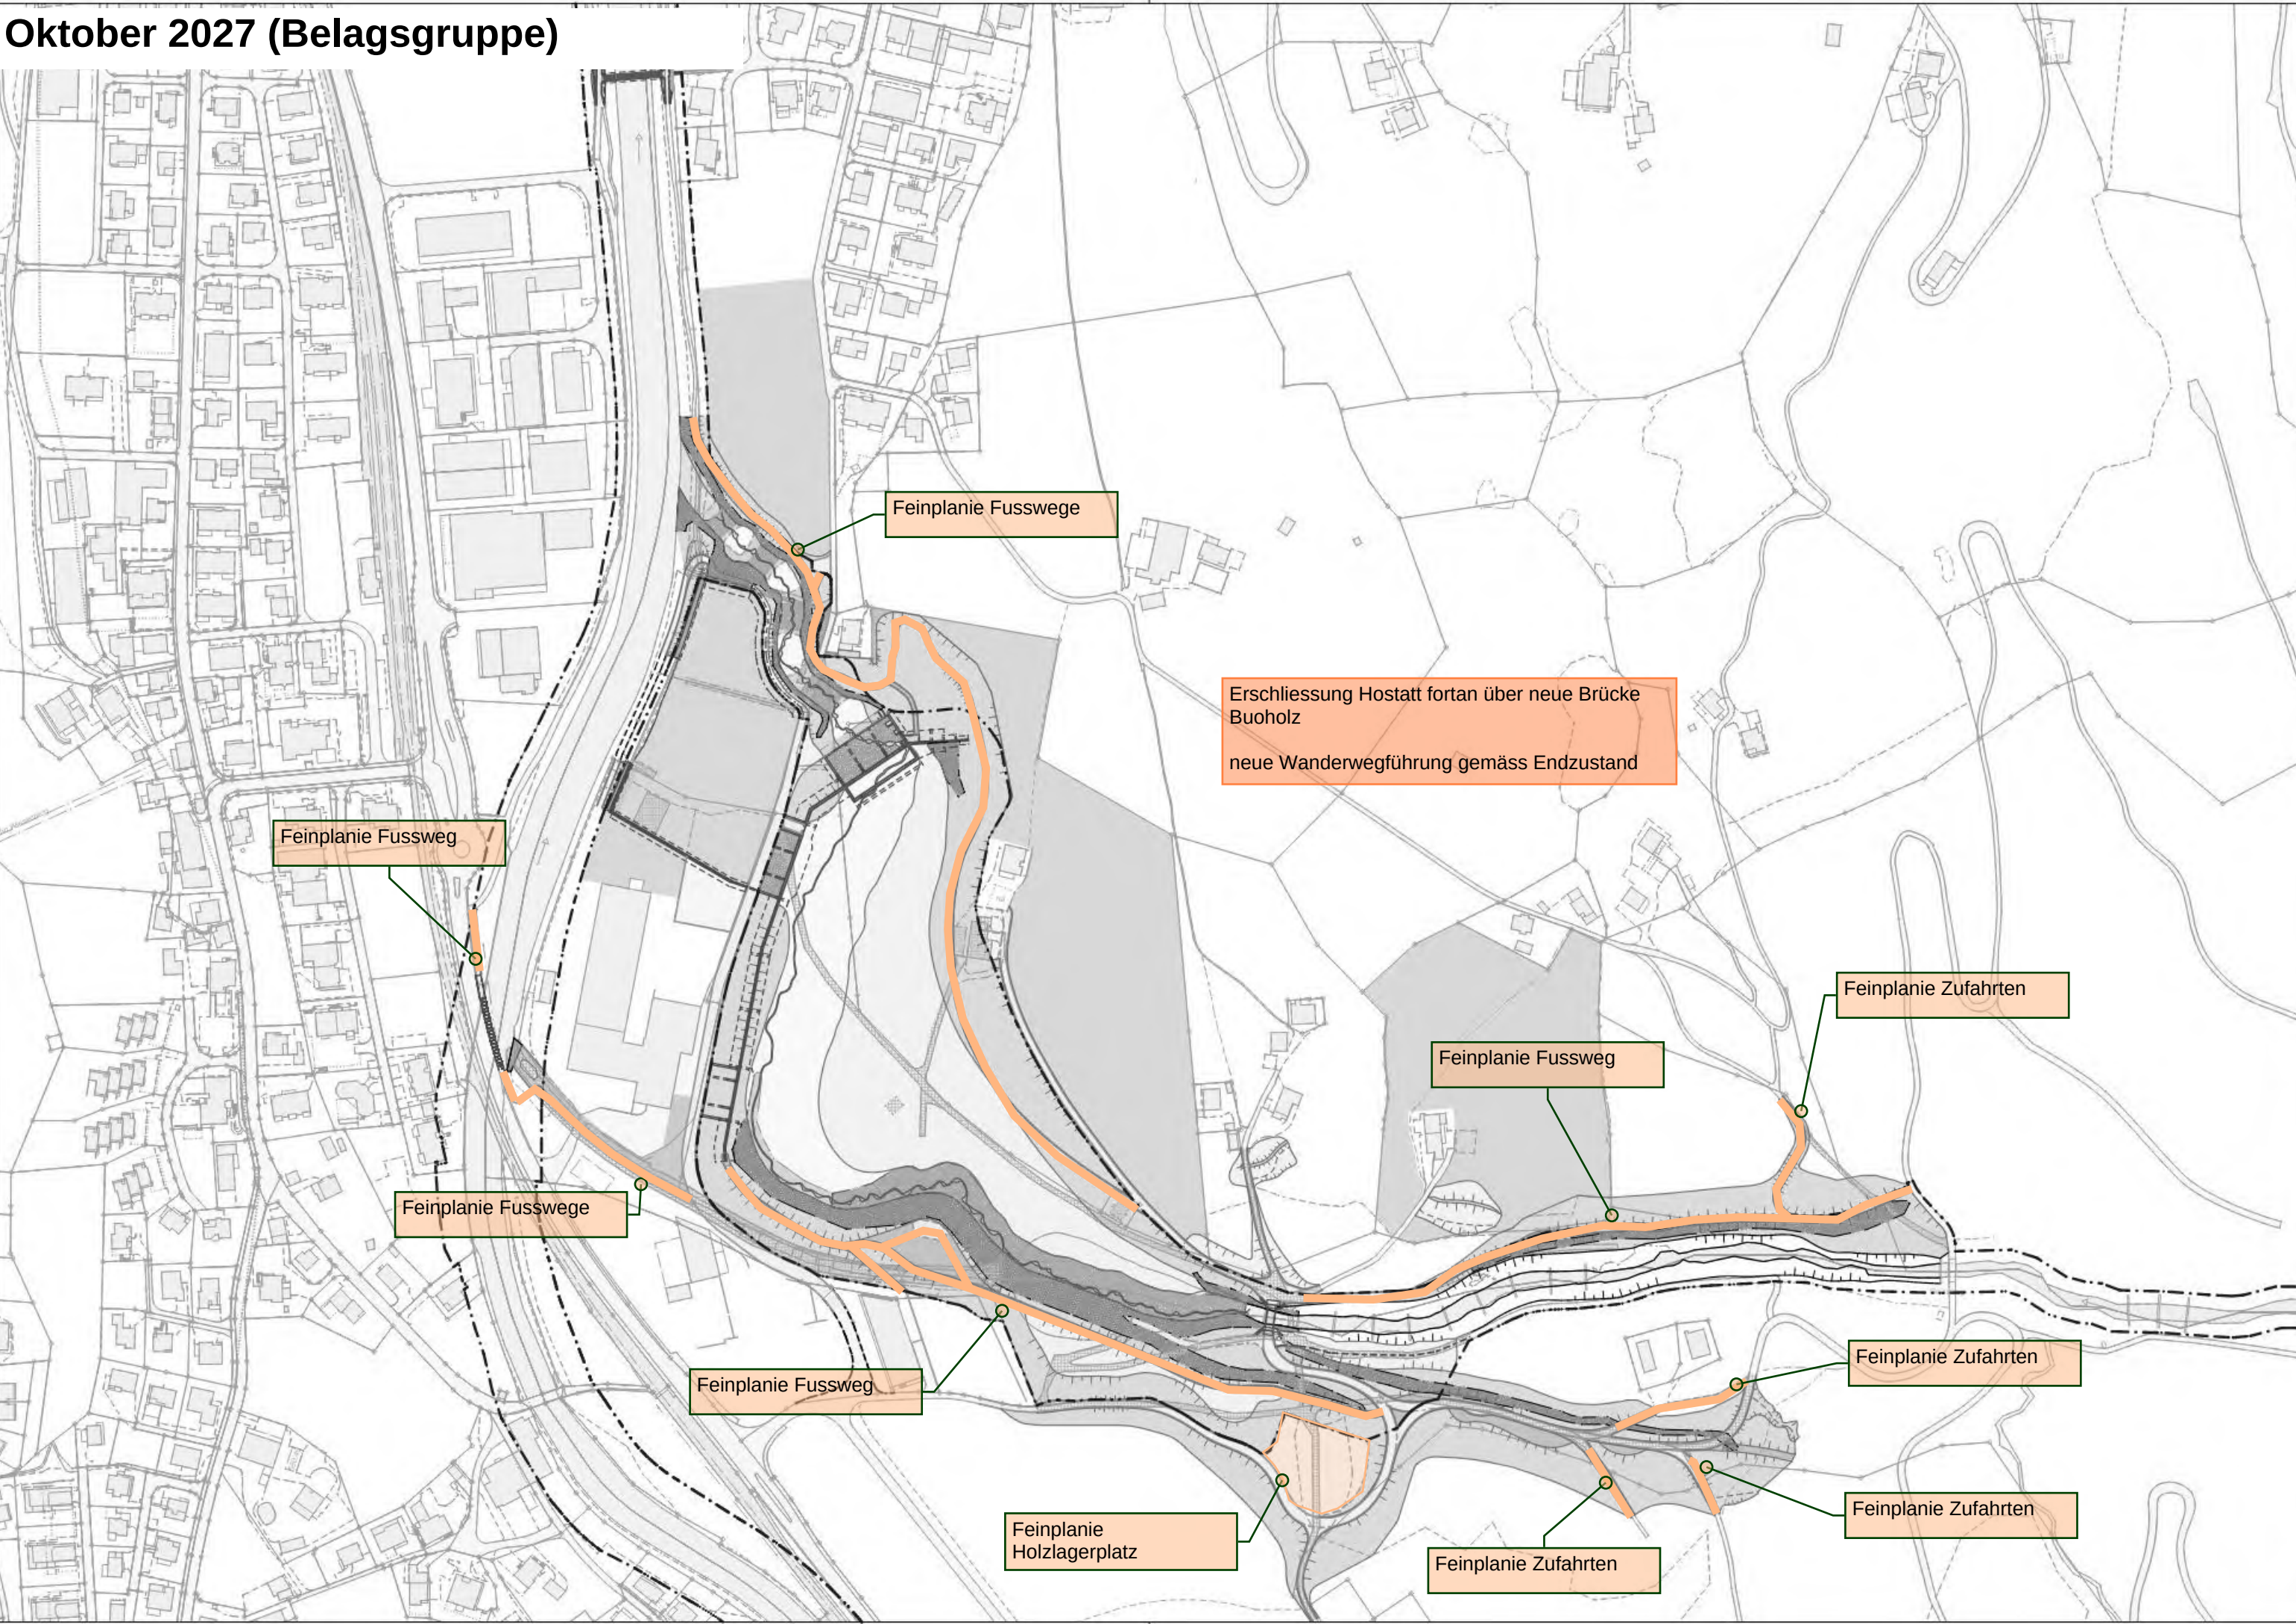


Oktober 2027 - Januar 2028 (1. Gruppe)

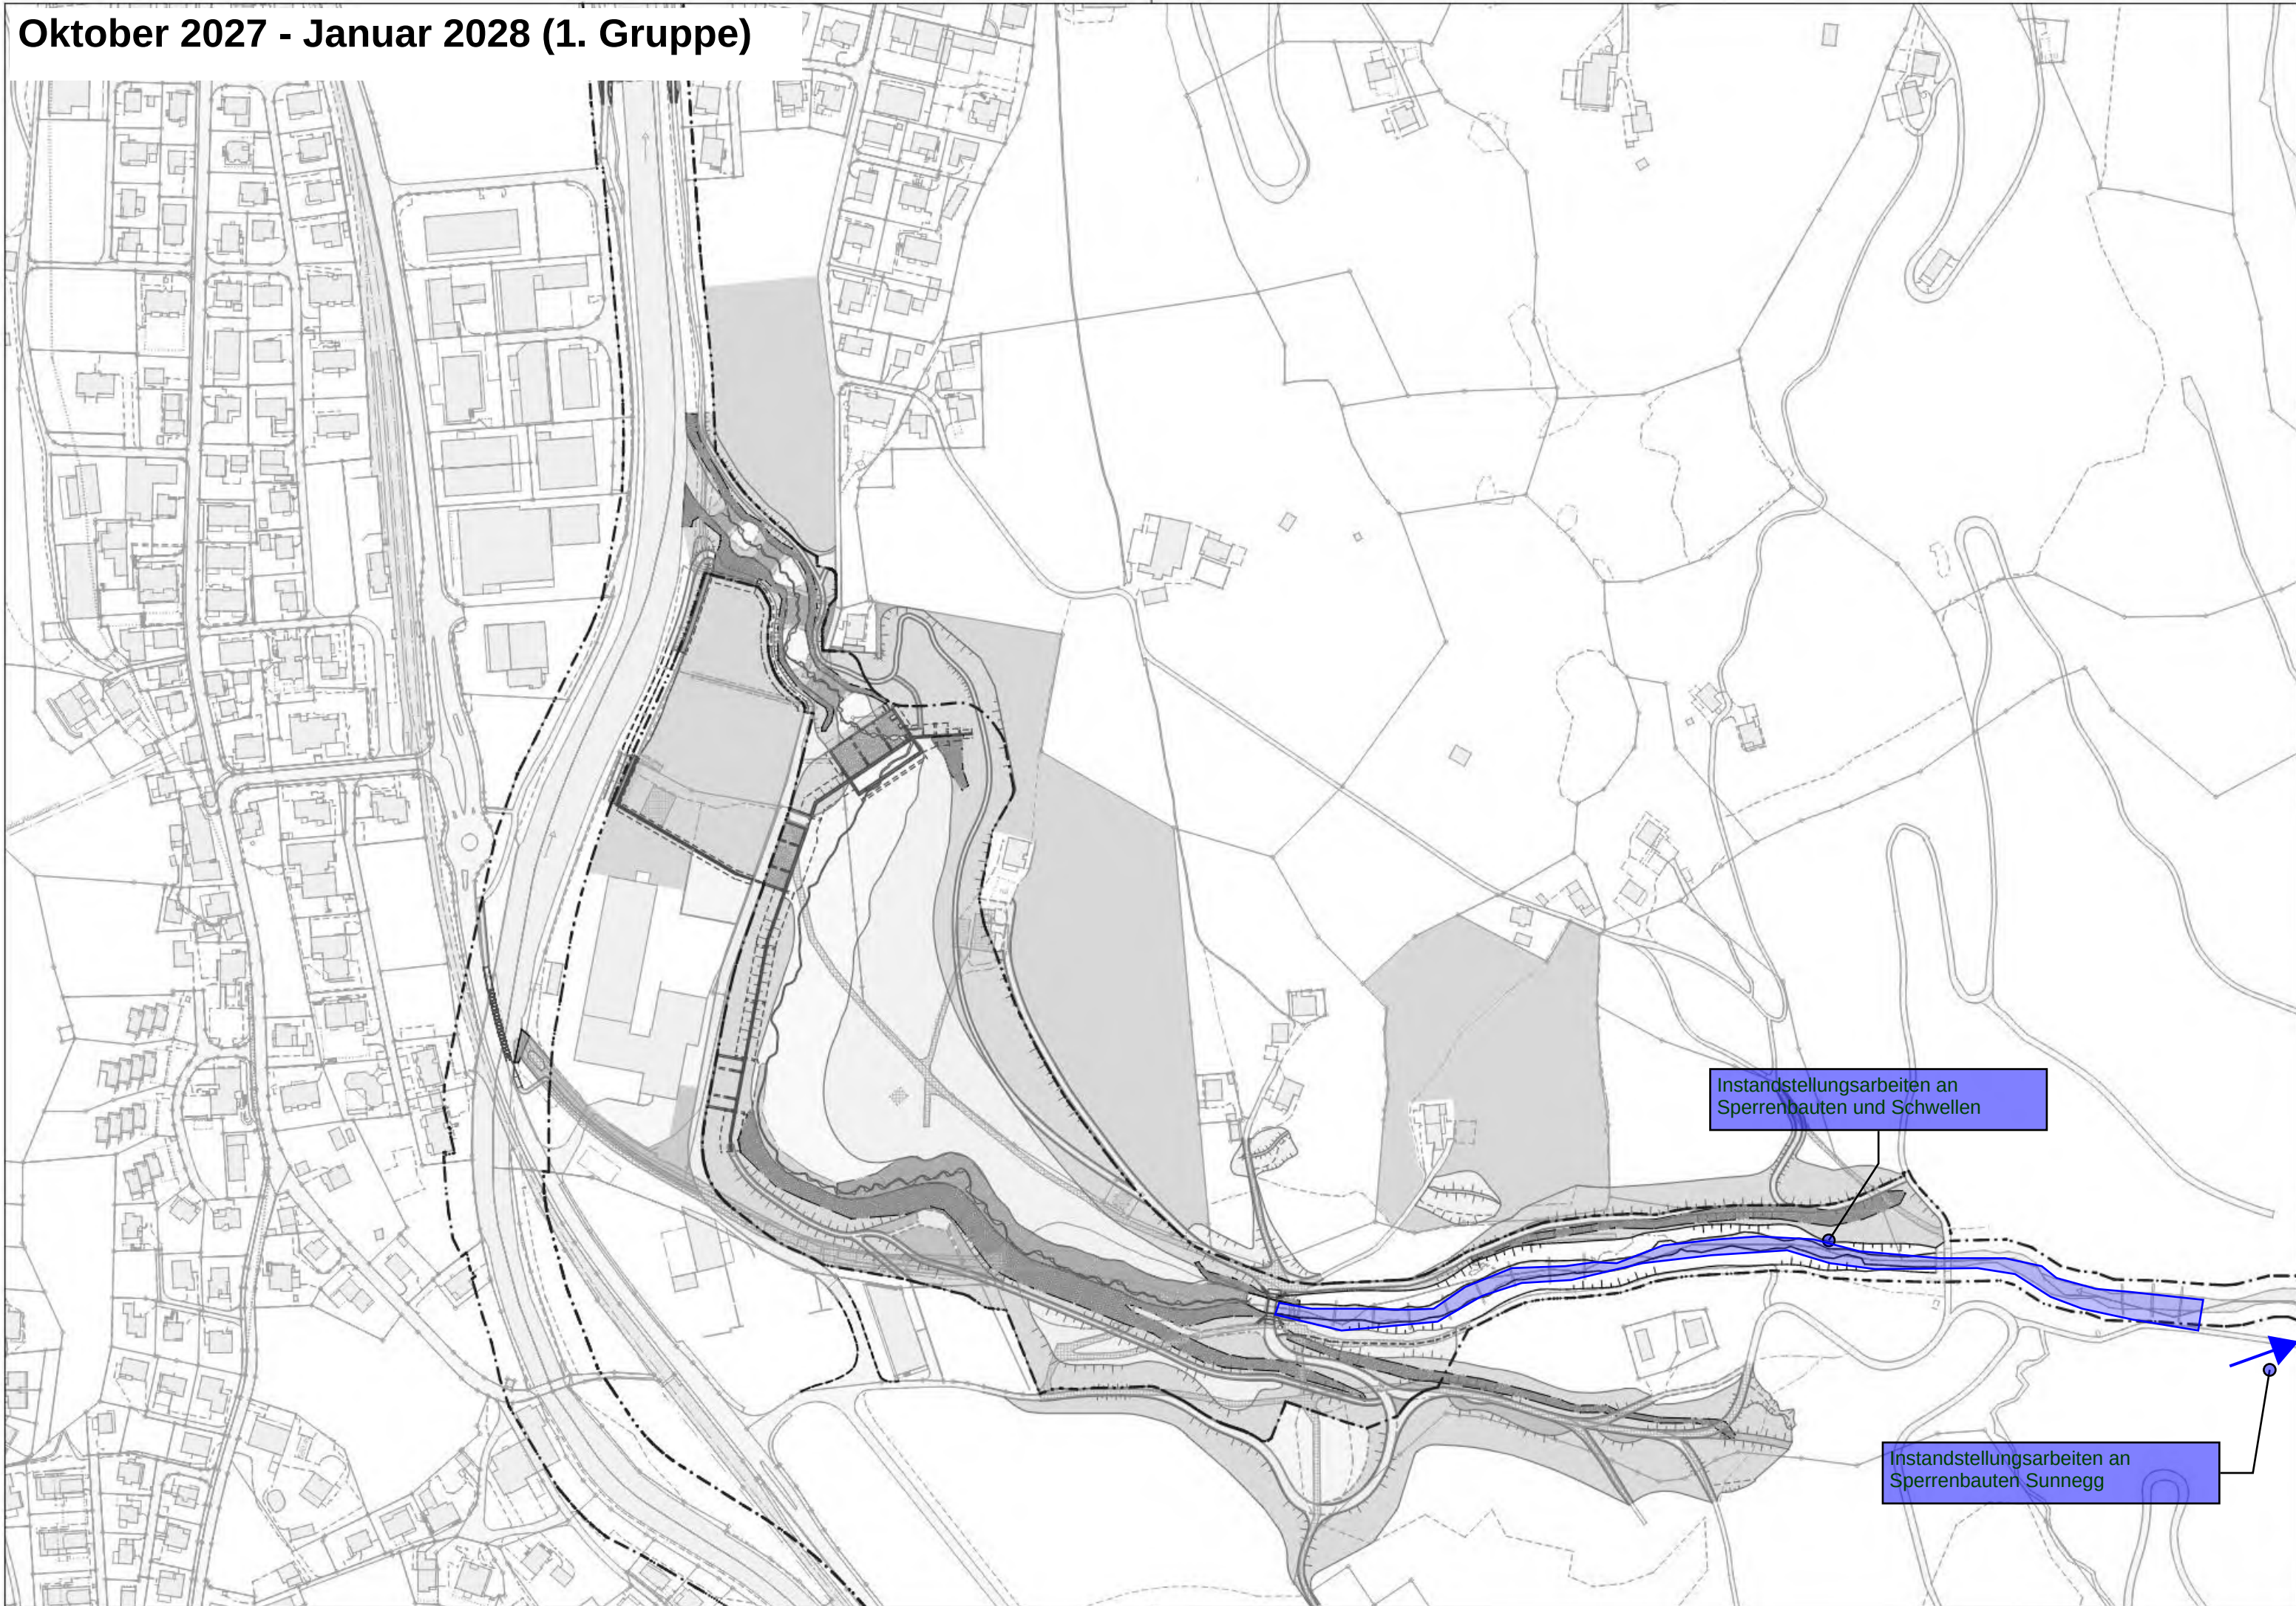


November 2027 (Forst)

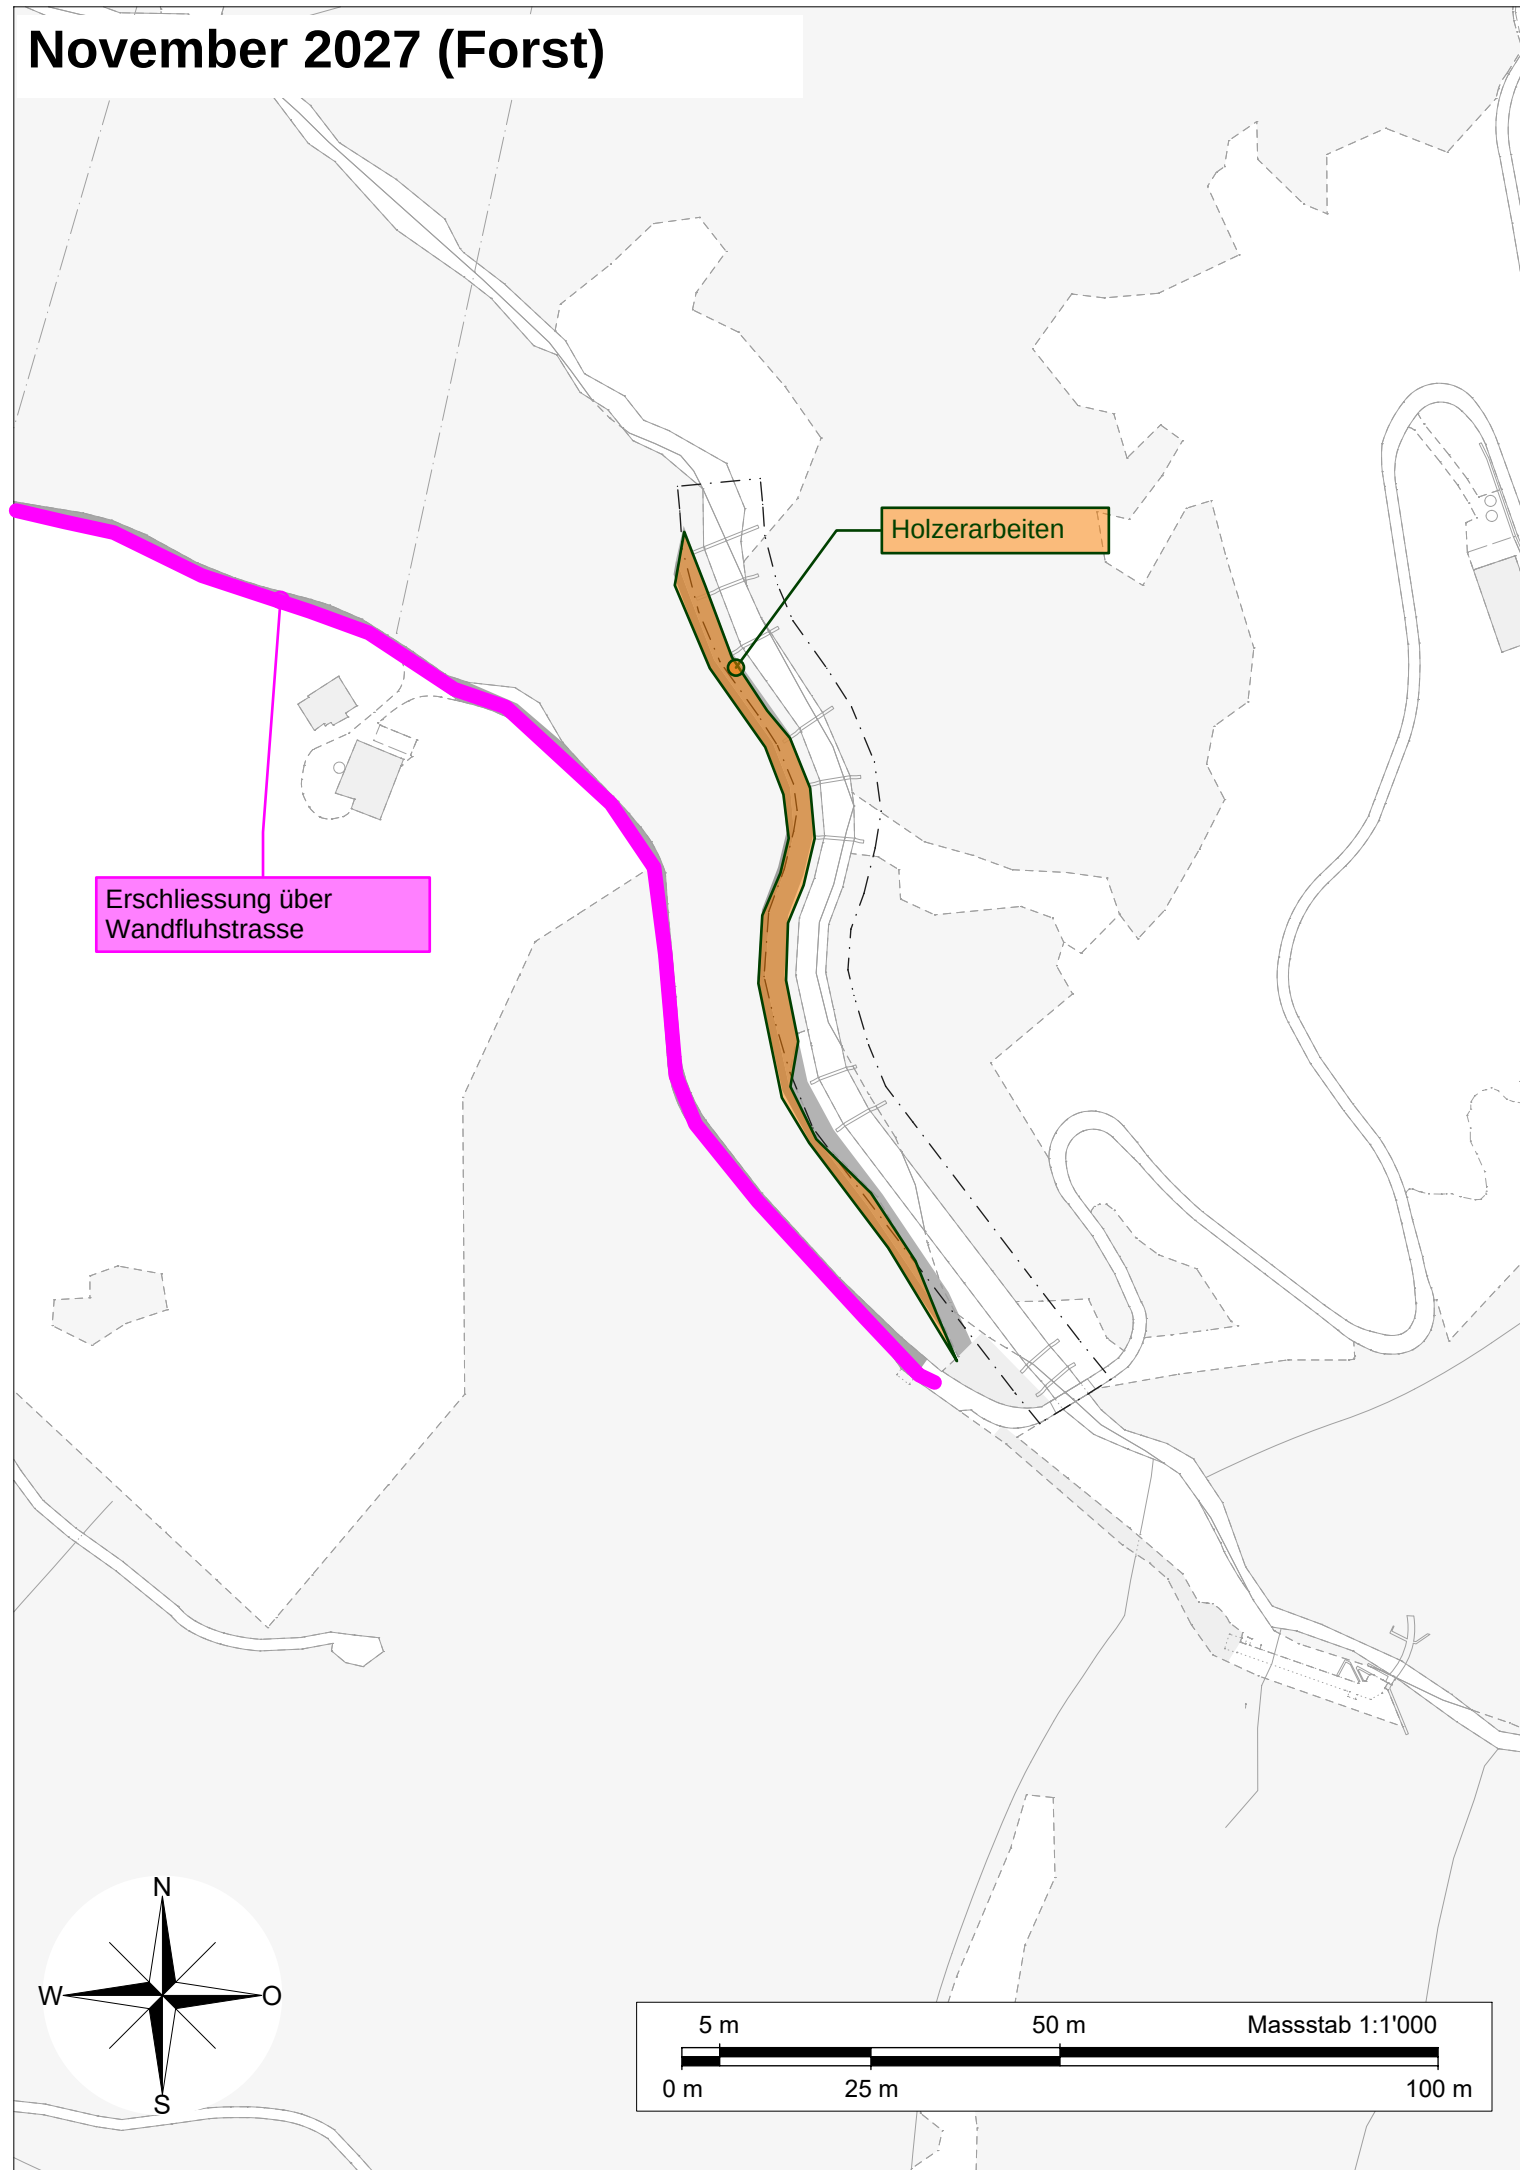


Februar - April 2028 (1. Gruppe)

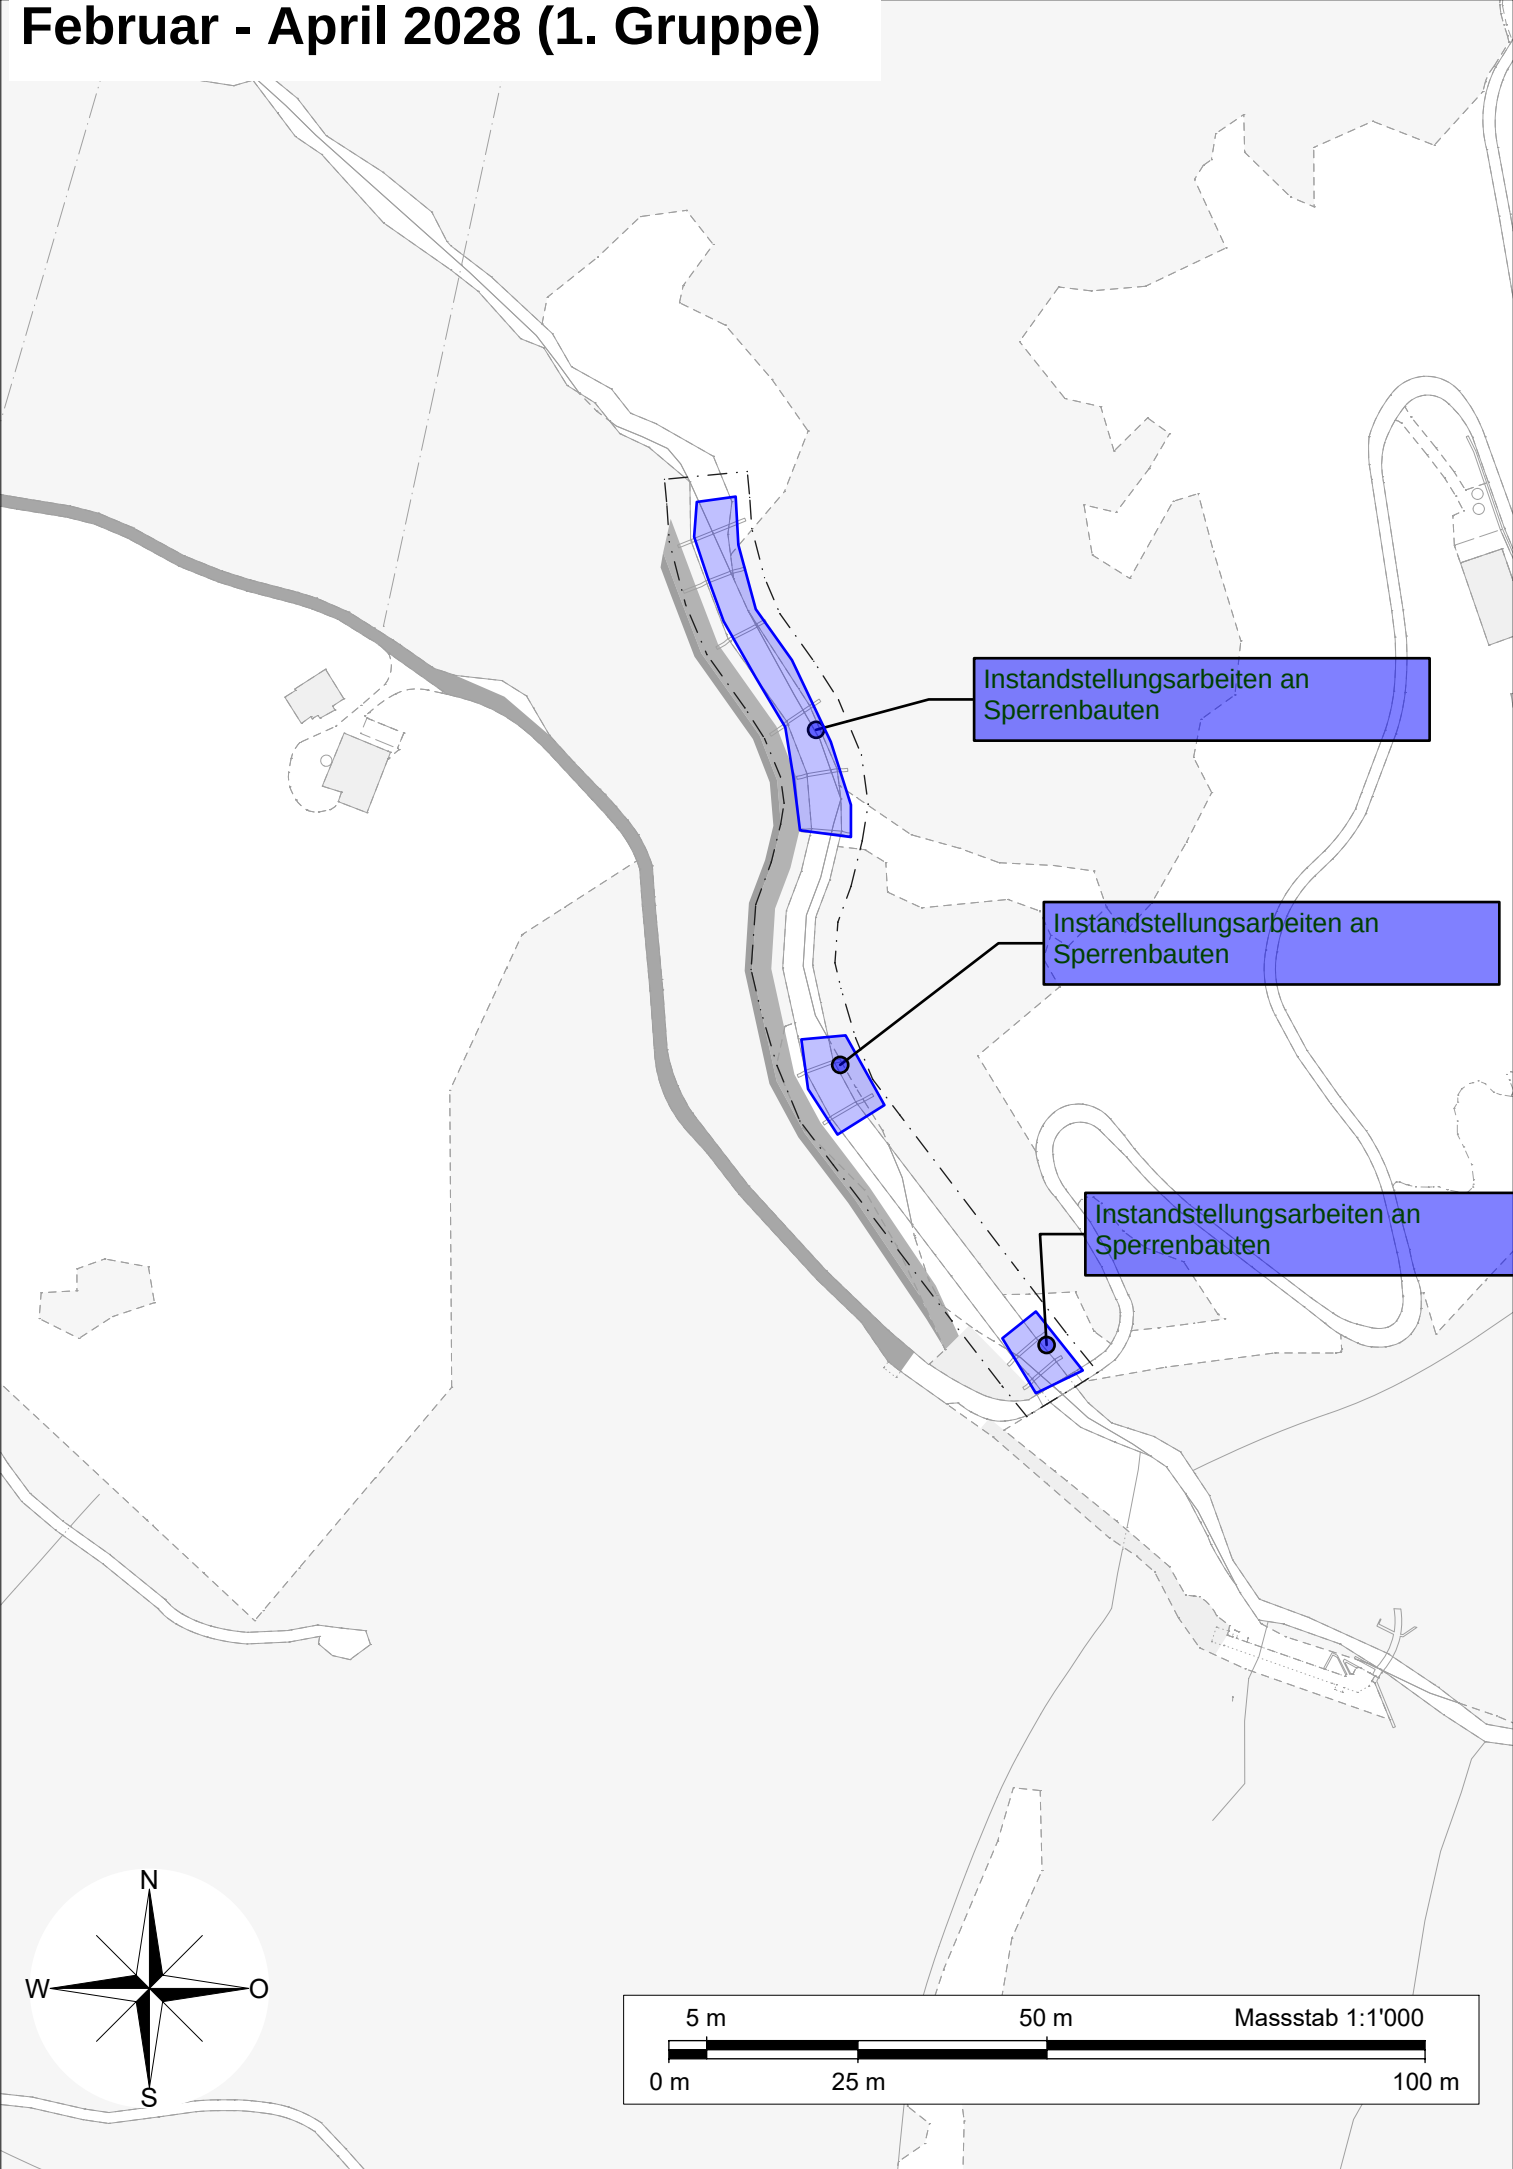

Mai 2028 (Forst)

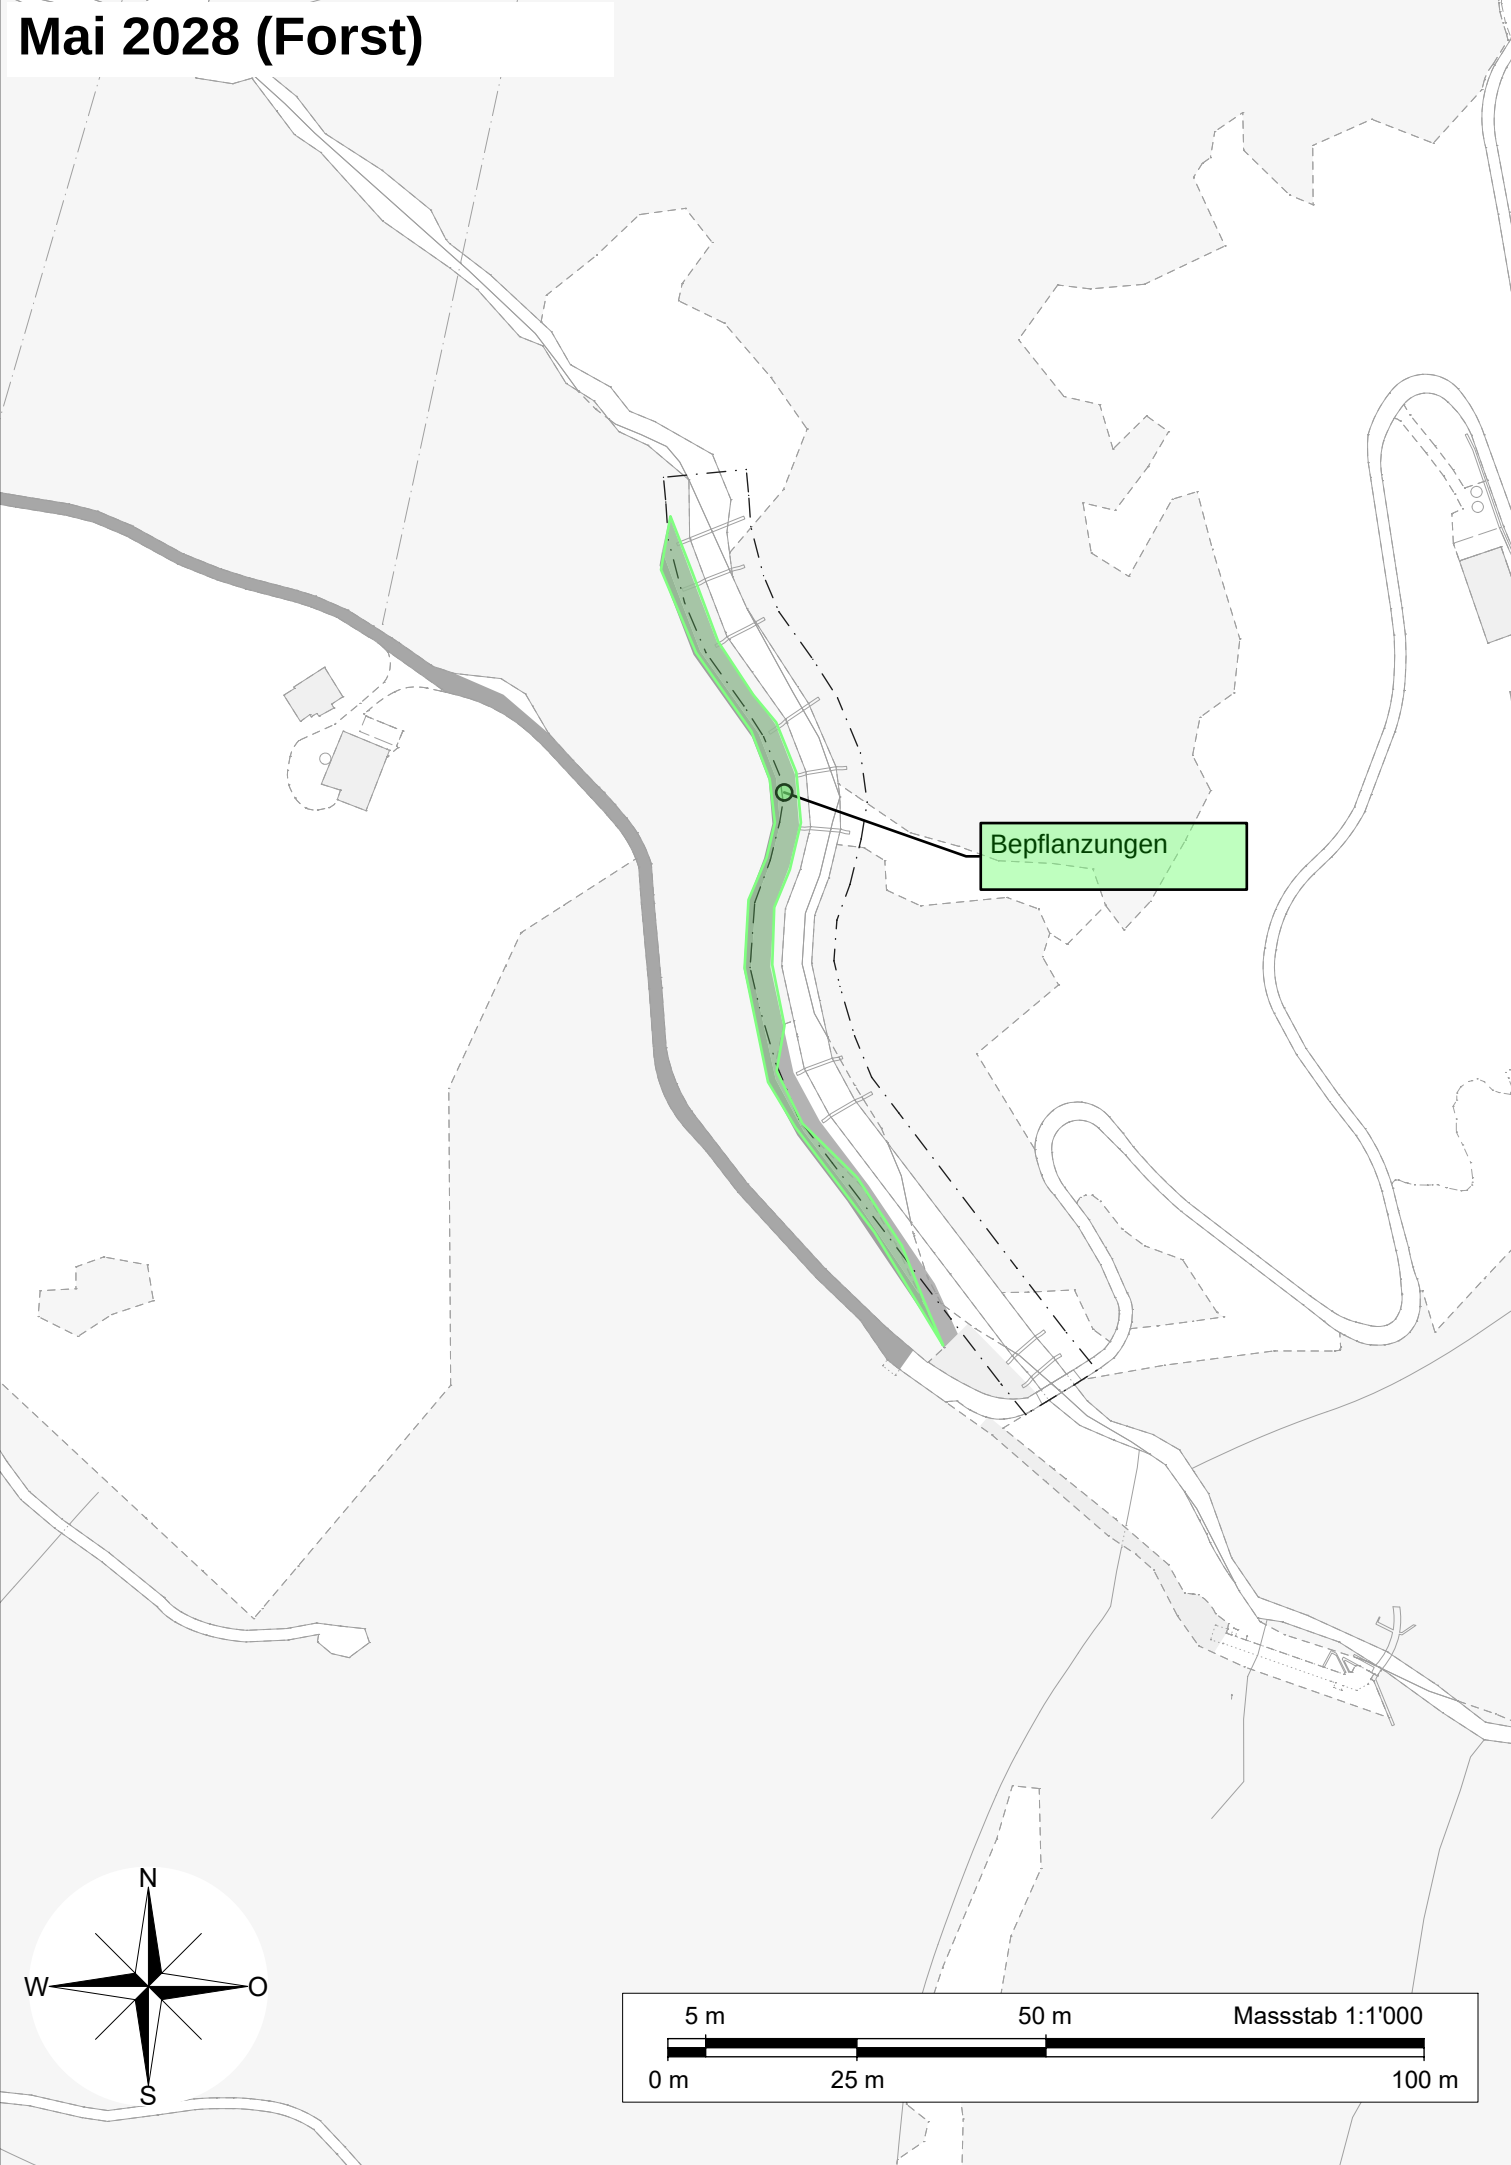

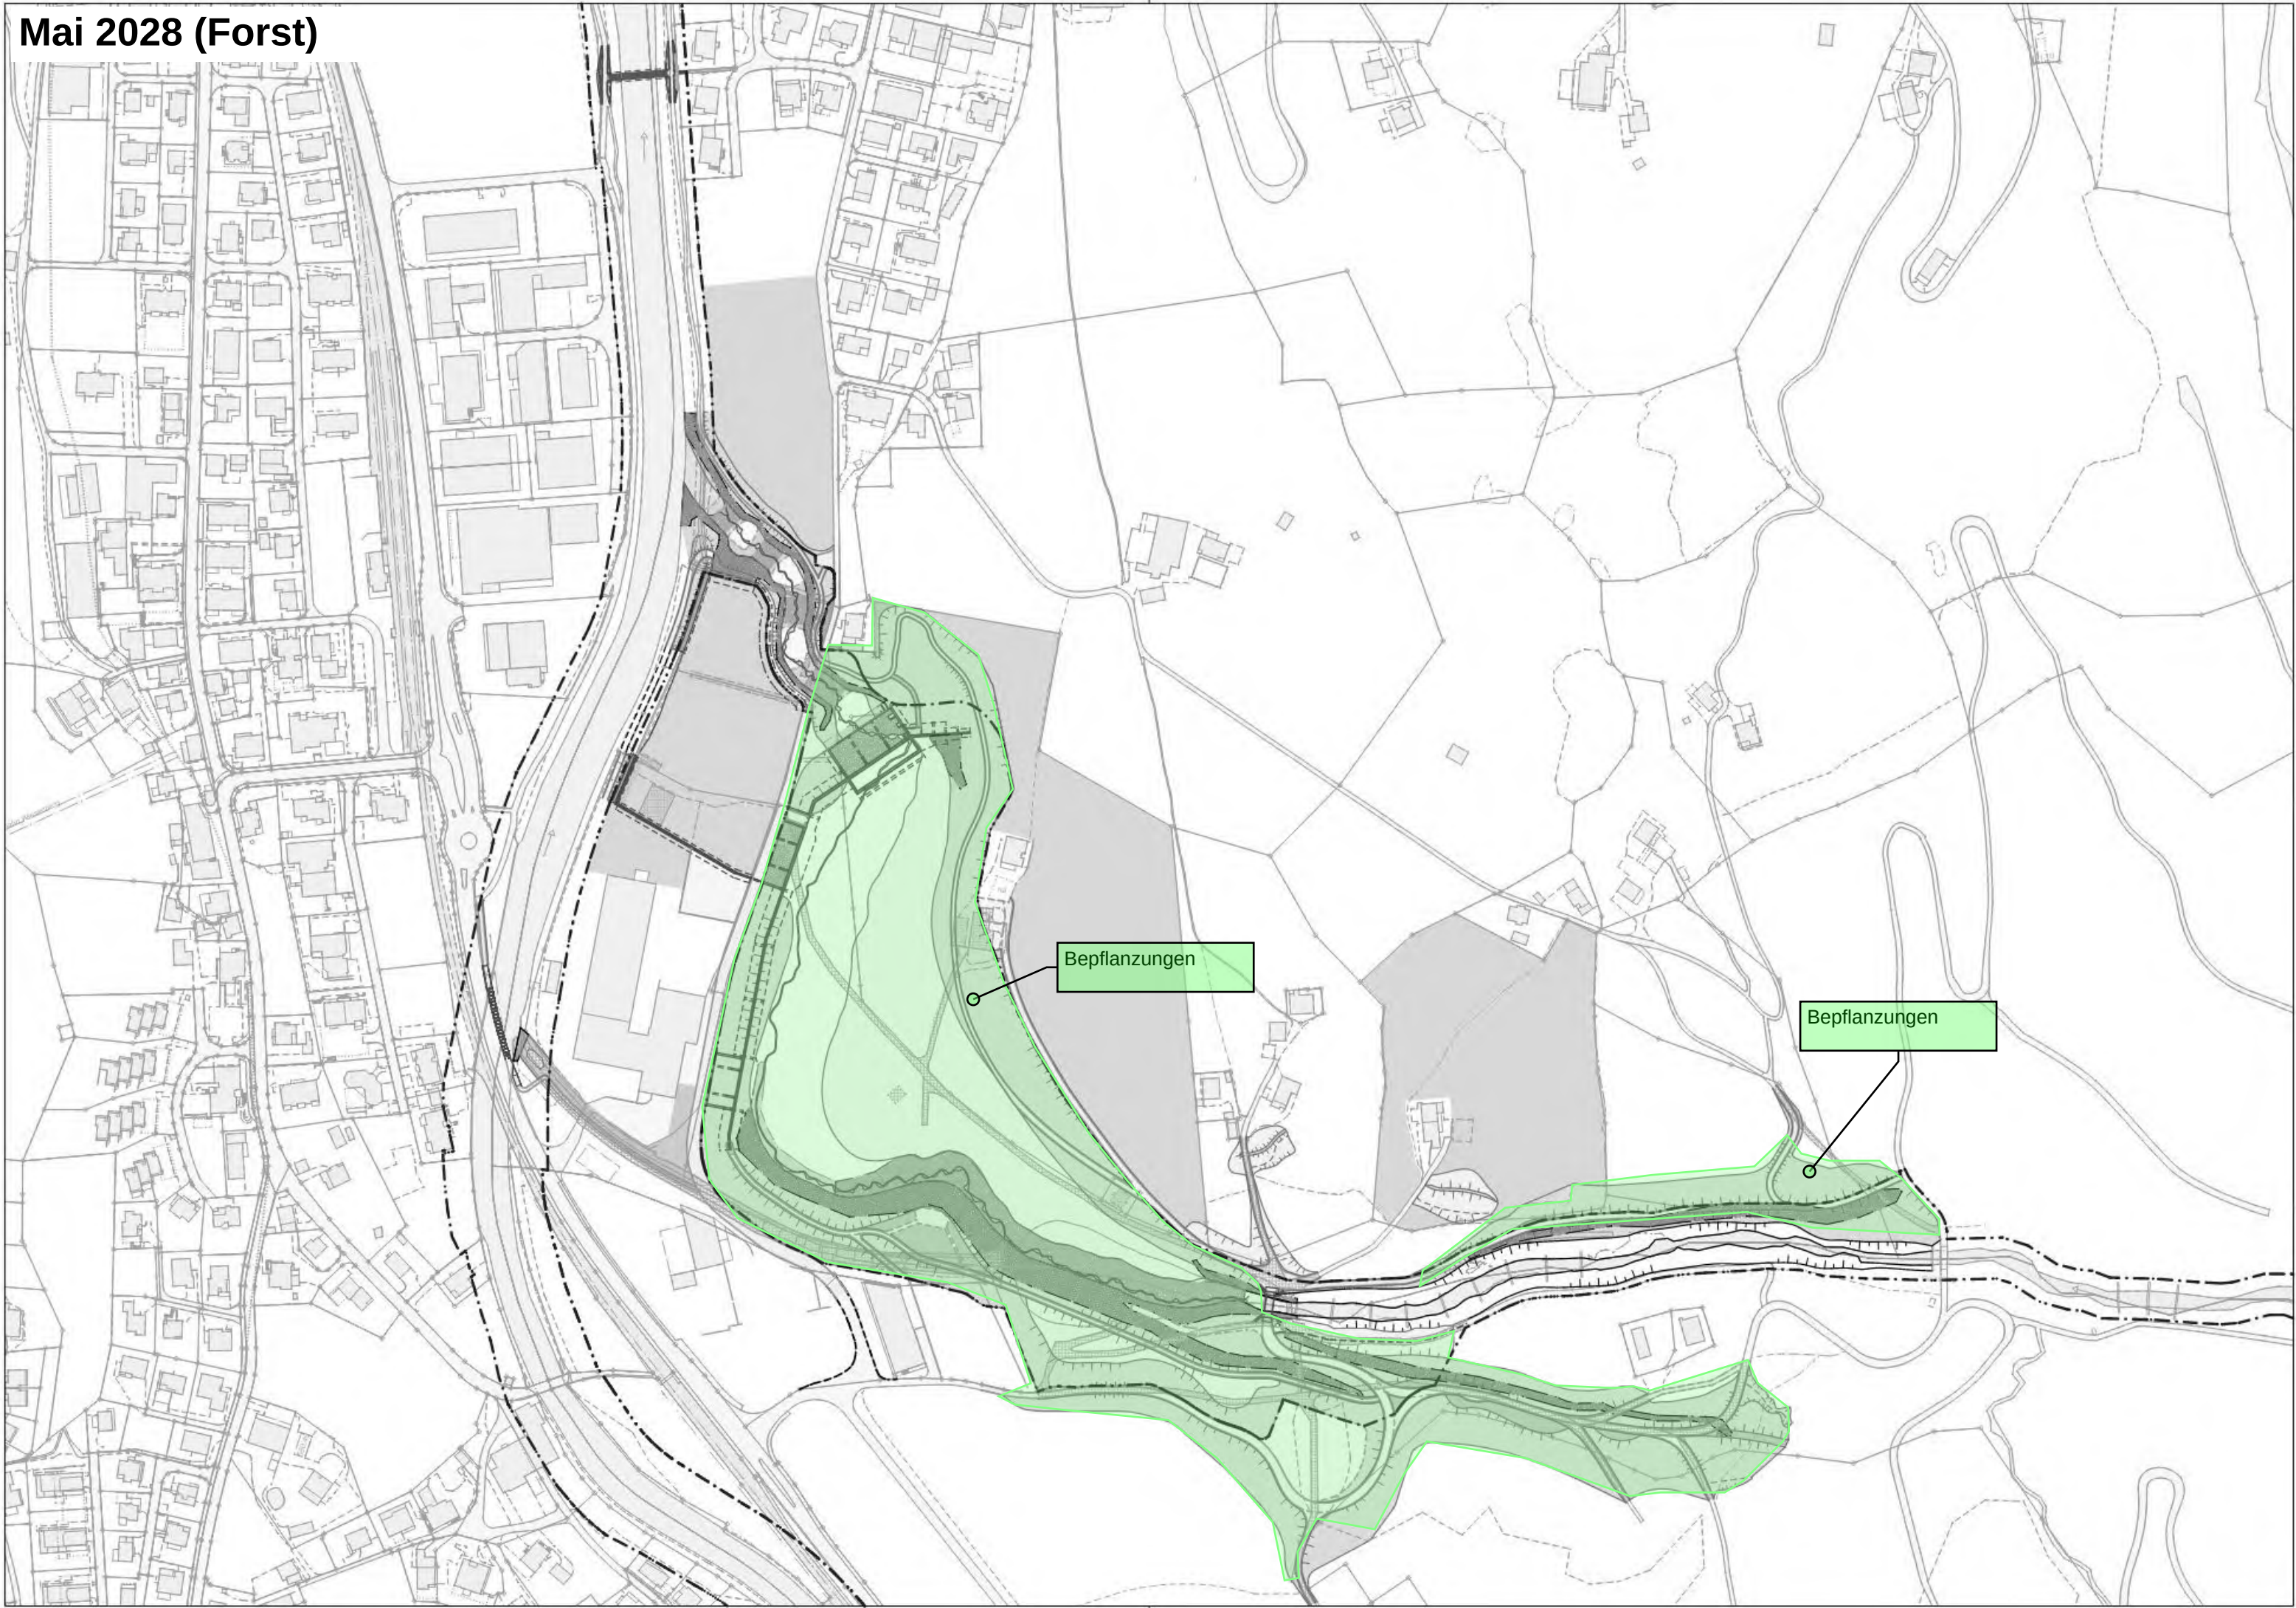

Juni 2028 (Belagsgruppe)

Deckbelagsarbeiten

